

第9回 那覇空港滑走路増設事業環境監視委員会

平成29～30年度の工事内容

平成30年2月15日
内閣府沖縄総合事務局
国土交通省大阪航空局

目次

1. 各工事進捗状況と平成29～30年度の工事内容	1
2. 各工事の実施状況	2
2.1 汚濁防止膜の設置位置	2
2.2 護岸工事等	3
2.3 埋立工事	4
2.4 その他空港施設工事	5

1. 各工事進捗状況と平成29～30年度の工事内容

平成29年12月時点

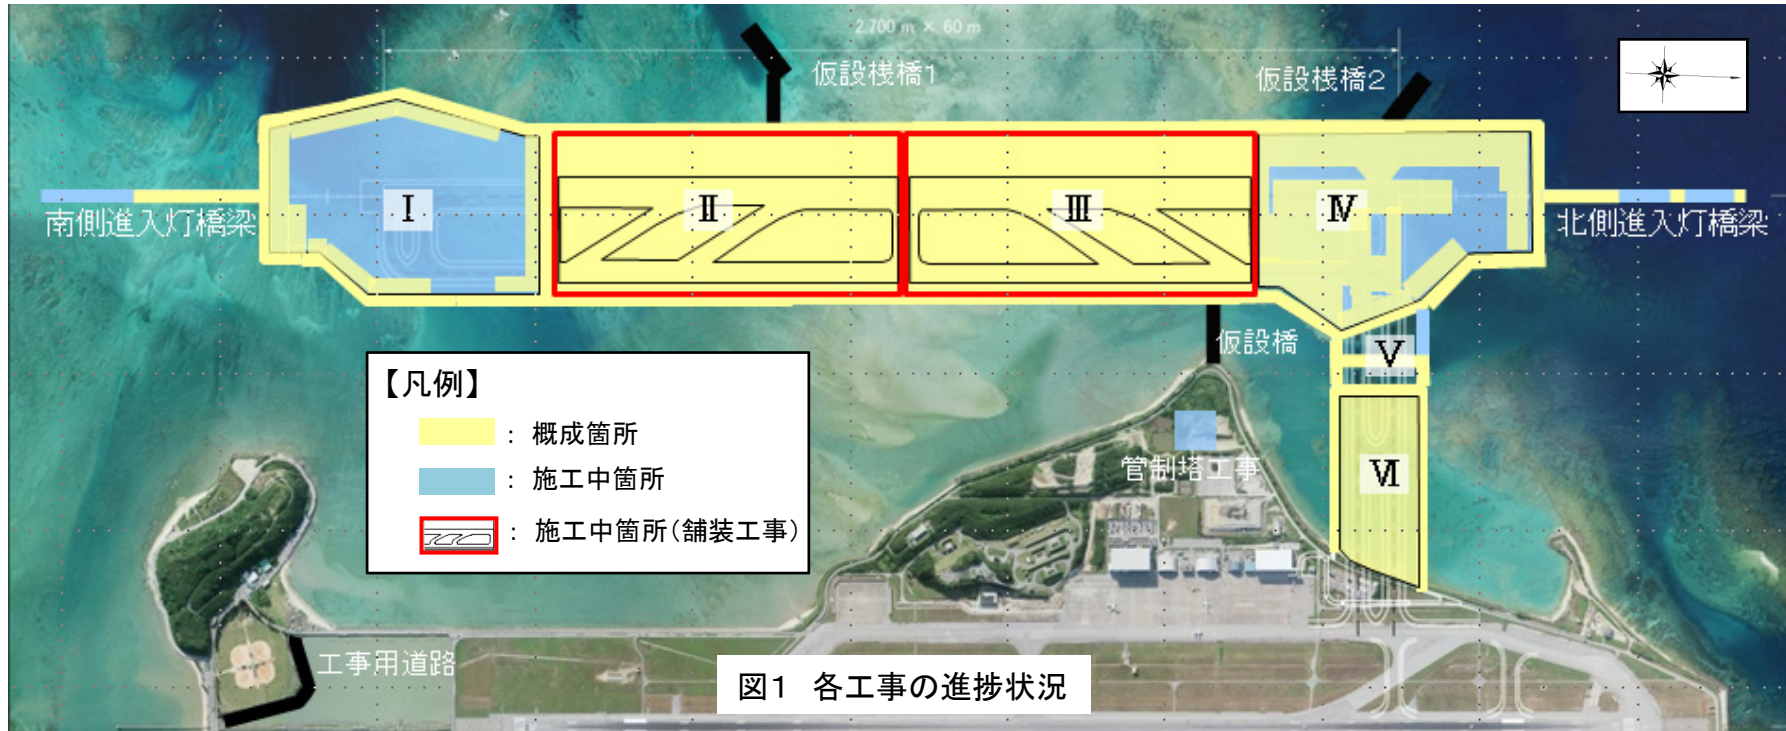


表1 平成29～30年度の工事予定

	主な工事範囲	平成29年度						平成30年度											
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
護岸工事	V工区(通水路部)	■	■	■	■	■													
埋立工事	I、IV～VI工区	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
舗装工事	I～VI工区	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
その他空港施設工事	進入灯(杭打設等) 管制塔	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

2. 各工事の実施状況

2.1 汚濁防止膜の設置位置




図2 汚濁防止膜の設置位置



① 【北側進入灯】平成29年8月撮影



② 【V工区】平成29年11月撮影

2.2 護岸工事等




図3 護岸工事等の実施位置



① 【V工区】通水カルバート据付状況
(平成29年8月撮影)



② 【V工区】捨石投入状況
(平成29年9月撮影)



③ 【V工区】捨石投入状況
(平成29年11月撮影)

2.3 埋立工事



図4 埋立工事の実施位置



① 【I工区】海砂投入状況
(平成29年10月撮影)



② 【II工区】改質土敷均し状況
(平成29年11月撮影)



③ 【IV工区】海砂揚土状況
(平成29年11月撮影)

2.4 その他空港施設工事



図5 その他空港施設工事の実施位置



① 南側進入灯工事 杭打設状況
(平成29年8月撮影)



② 北側進入灯工事 現場全景
(平成29年10月撮影)



③ 管制塔工事 施工状況
(平成29年12月撮影)
