

## 第8回 那覇空港滑走路増設事業環境監視委員会

# 平成29年度の工事内容

平成29年6月28日  
内閣府沖縄総合事務局  
国土交通省大阪航空局

## 目次

1. 各工事進捗状況と平成29年度の工事内容	1
2. 各工事の実施状況	2
2.1 汚濁防止膜の設置位置	2
2.2 護岸工事等	3
2.3 埋立工事	4
2.4 その他空港施設工事	5

# 1. 各工事進捗状況と平成29年度の工事内容

平成29年6月時点

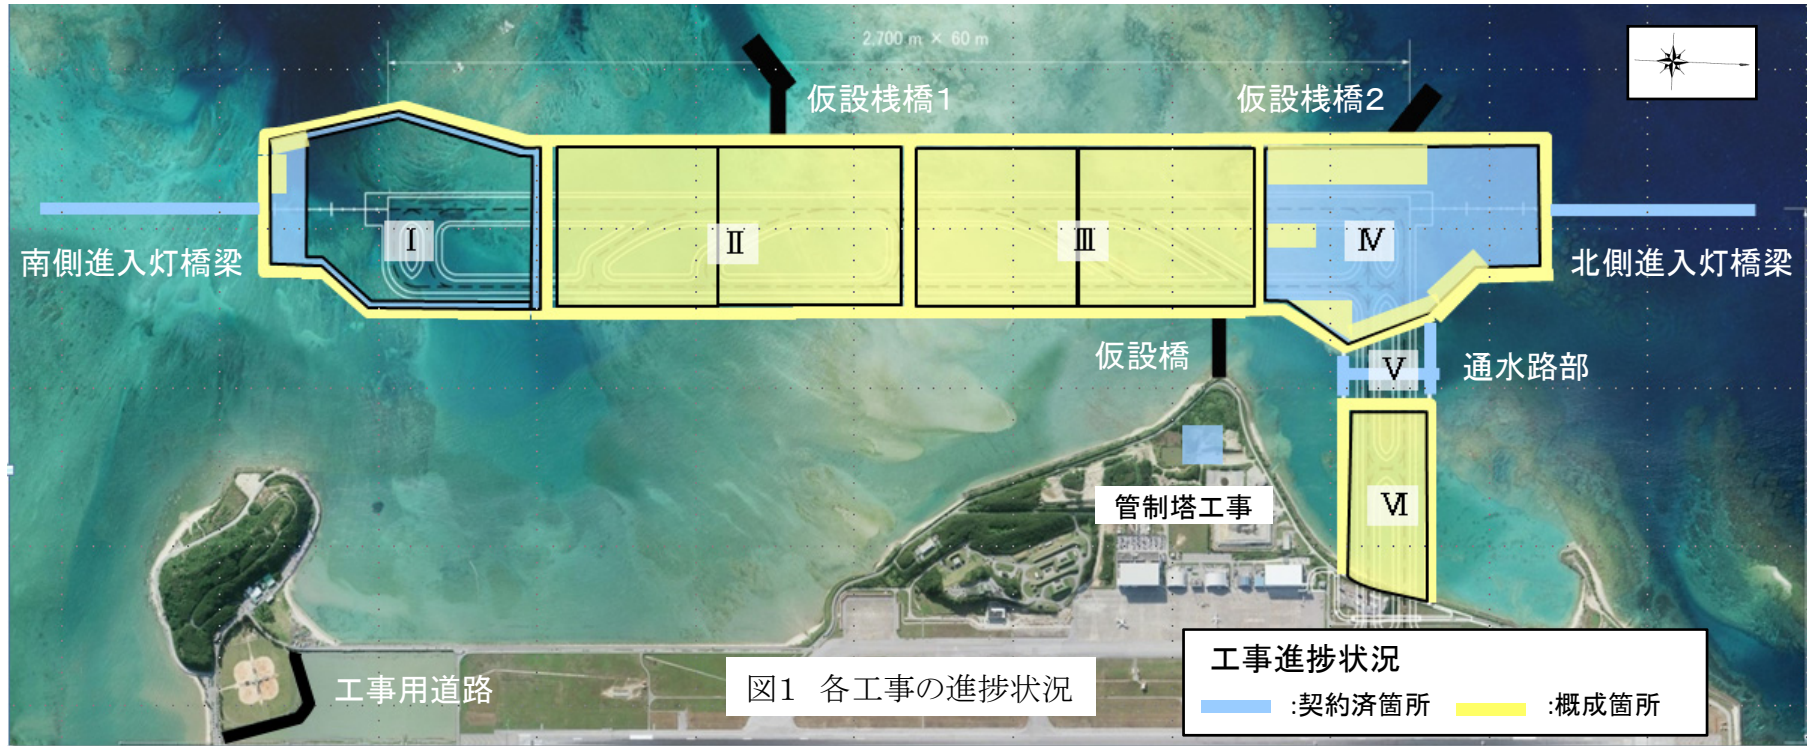


表1 平成29年度の工事予定

	主な工事範囲	平成29年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
護岸工事	V工区(通水路部)	平成30年度も継続											
埋立工事	I~IV、VI工区	平成30年度も継続											
舗装工事	II、III工区	平成30年度も継続											
その他空港施設工事	進入灯(杭打設等) 管制塔	平成30年度も継続											

## 2. 各工事の実施状況

### 2.1 汚濁防止膜の設置位置

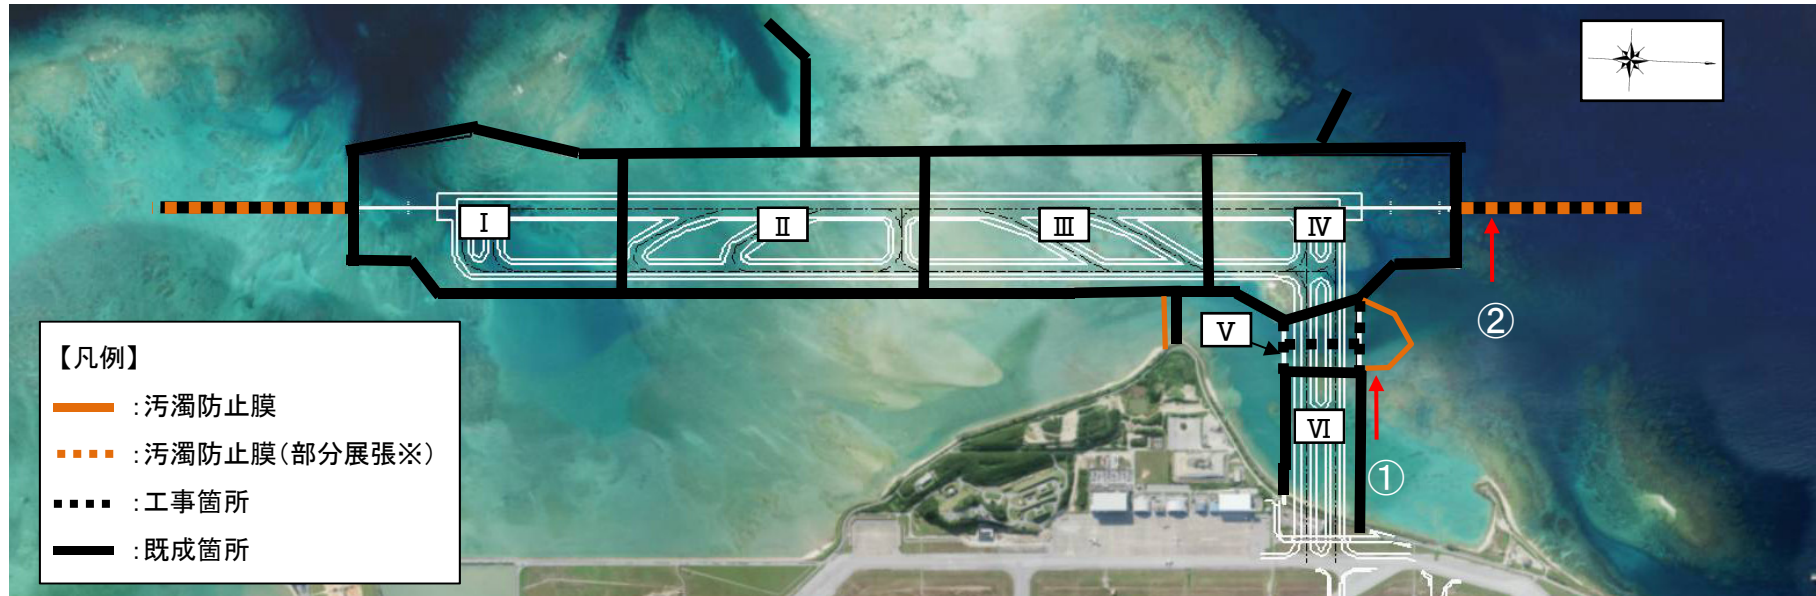


図2 汚濁防止膜の設置位置



① 【V工区】平成29年5月撮影



② 【北側進入灯】平成29年5月撮影



## 2.2 護岸工事等

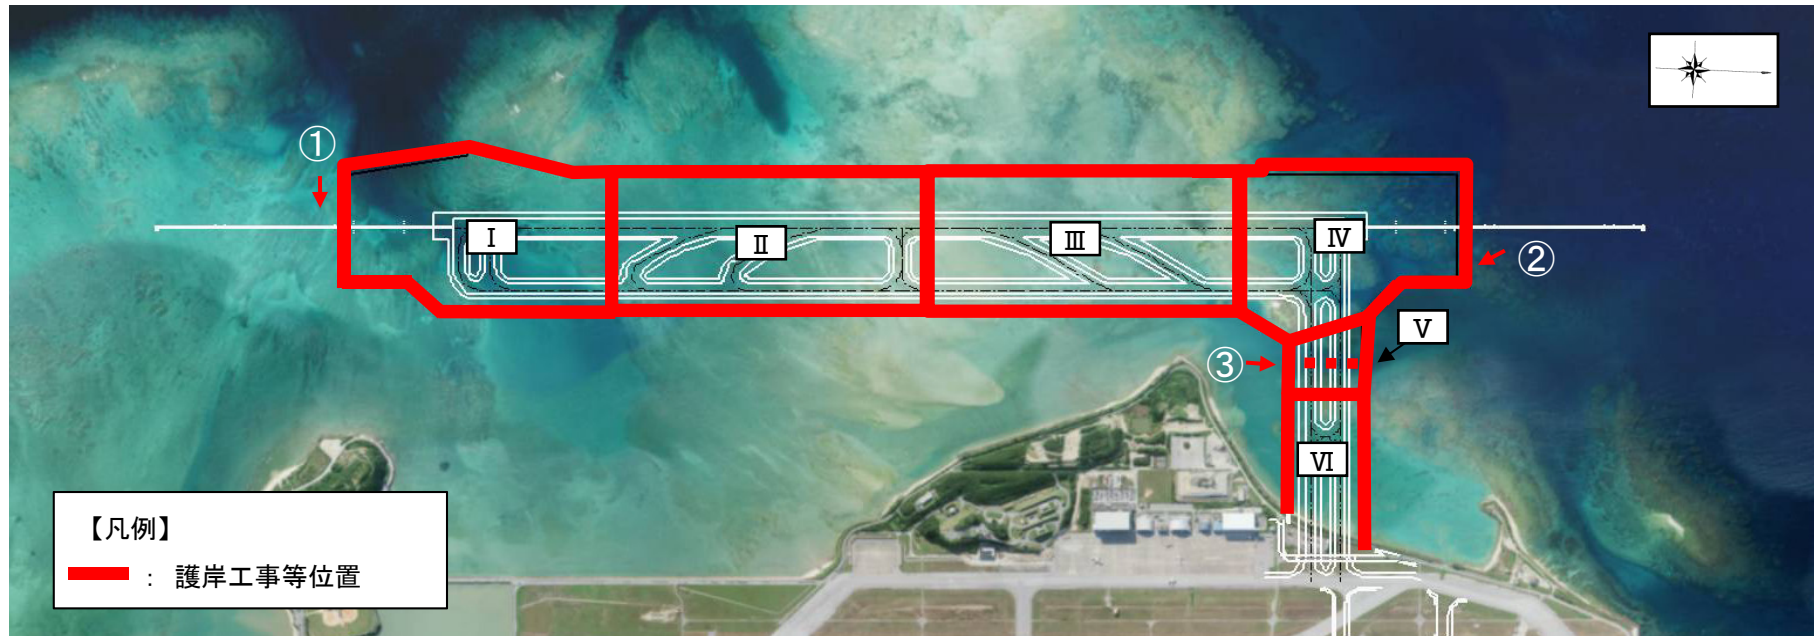


図3 護岸工事等の実施位置



① 【I工区】被覆ブロック据付状況  
(平成29年3月撮影)



② 【IV工区】被覆ブロック据付状況  
(平成29年6月撮影)



③ 【V工区】通水路部基礎捨石投入状況  
(平成29年5月撮影)



## 2.3 埋立工事

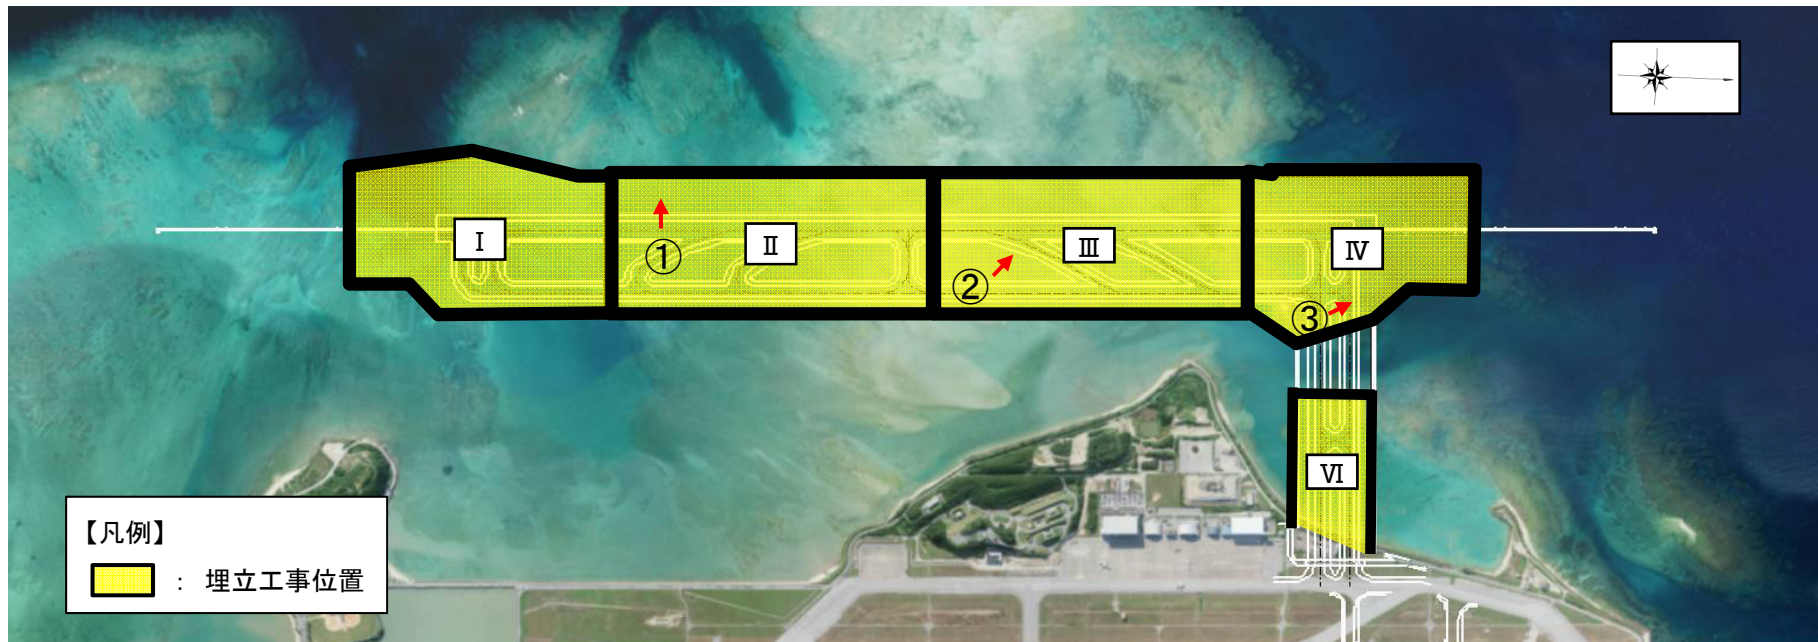


図4 埋立工事の実施位置



① 【Ⅱ工区】岩ズリ投入状況  
(平成29年4月撮影)



② 【Ⅲ工区】全景  
(平成29年1月撮影)



③ 【Ⅳ工区】岩ズリ投入状況  
(平成29年6月撮影)



## 2.4 その他空港施設工事



図5 その他空港施設工事の実施位置



① 南側進入灯工事 作業構台施工状況  
(平成29年5月撮影)



② 北側進入灯工事 杭打設状況  
(平成29年5月撮影)



③ 管制塔工事 杭工事施工状況  
(平成29年4月撮影)
