

## 第7回 那覇空港滑走路増設事業環境監視委員会

# 平成28～29年度の工事内容

平成29年1月16日  
内閣府沖縄総合事務局  
国土交通省大阪航空局

## 目 次

1. 平成28～29年度の工事内容	1
2. 各工事の実施状況	2
2. 1 汚濁防止膜の設置位置	2
2. 2 護岸工事(本体)	3
2. 3 護岸工事(ケーソン据付)	4
2. 4 埋立工事	5

## 1. 平成28～29年度の工事内容

表1 平成28～29年度の工事予定

	主な工事範囲	平成28年度						平成29年度											
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
護岸工事	護岸(ケーソン・ブロック据付等)																		平成30年度も継続
埋立工事	I～IV、VI工区																		平成30年度も継続
その他空港施設工事	進入灯(杭打設等) 管制塔																		平成30年度も継続

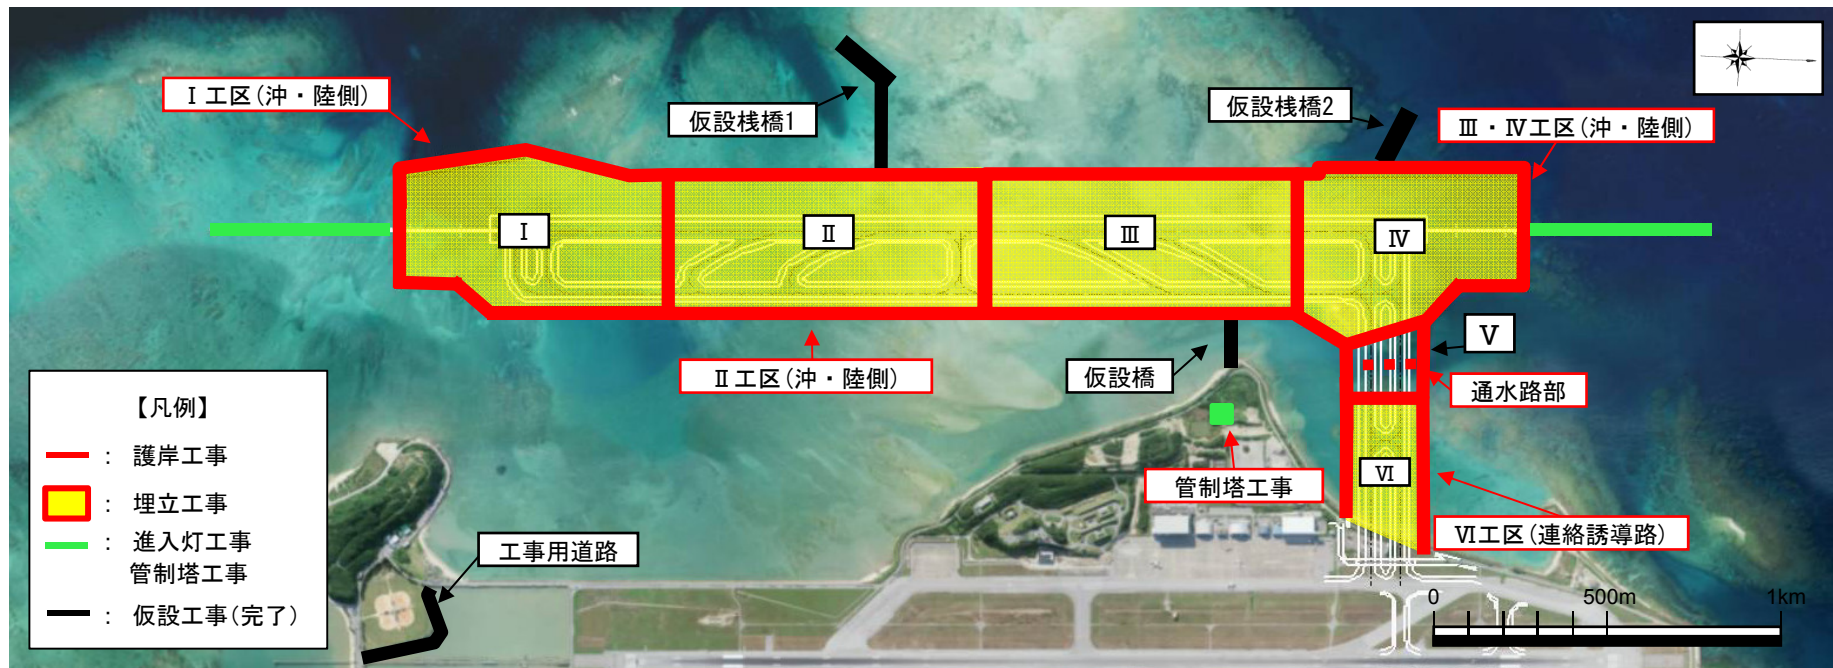


図1 平成28～29年度の工事箇所

## 2. 各工事の実施状況

### 2. 1 汚濁防止膜の設置位置

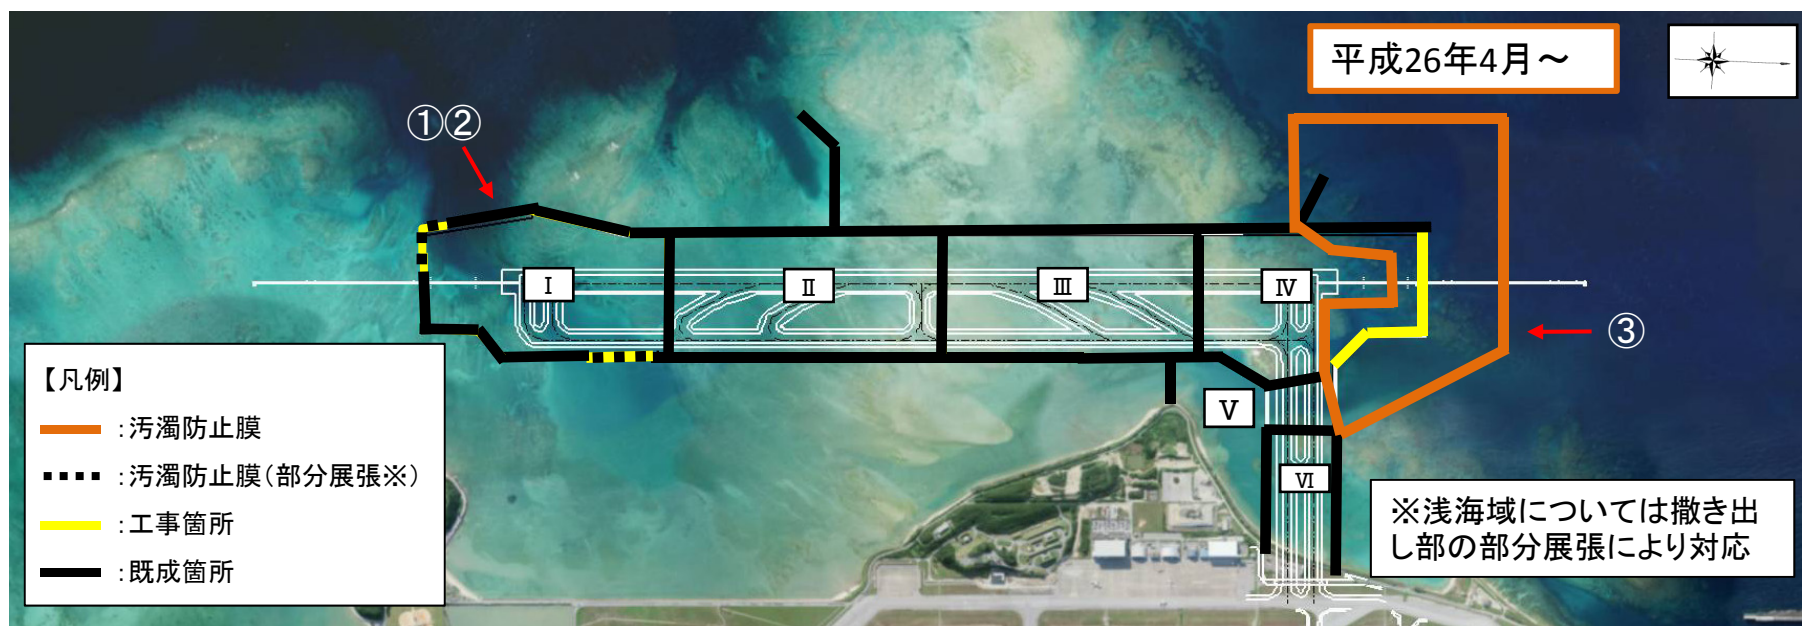


図2 汚濁防止膜の設置位置



① 平成28年6月撮影



② 平成28年6月撮影



③ 平成28年10月撮影

図3 汚濁防止膜設置状況



## 2. 2 護岸工事(本体)

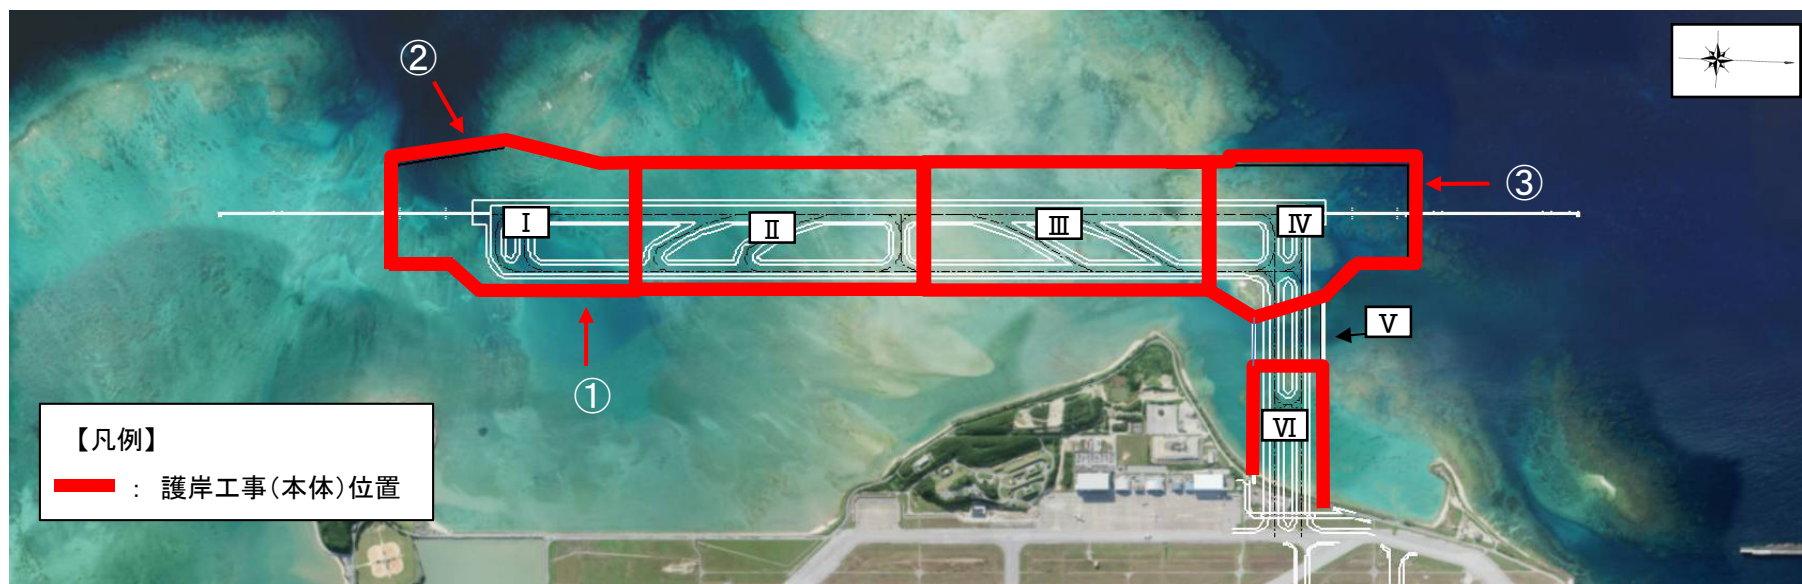


図4 護岸工事の実施位置



① 捨石均し状況(平成28年6月撮影)



② 裏込材投入状況(平成28年10月撮影)



③ 消波ブロック据付状況(平成28年10月撮影)

図5 護岸工事状況

## 2. 3 護岸工事(ケーソン据付)



図6 護岸工事(ケーソン据付)の実施位置



① ケーソン据付状況(平成28年6月撮影)



② ケーソン中詰砂投入状況  
(平成28年8月撮影)



③ 蓋ブロック据付状況(平成28年6月撮影)

図7 護岸工事(ケーソン据付)の状況



## 2. 4 埋立工事



図8 埋立工事の実施位置



【Ⅲ工区】(平成28年6月撮影)



【Ⅲ工区】(平成28年7月撮影)



【Ⅲ工区】(平成28年7月撮影)

図9 埋立工事状況
