

# 第11回 那覇空港滑走路増設事業環境監視委員会

## 平成30～31年度の工事内容

平成31年2月1日  
内閣府沖縄総合事務局  
国土交通省大阪航空局

## 目次

1. 各工事進捗状況と平成30～31年度の工事内容	1
2. 各工事の実施状況	2
2.1 汚濁防止膜の設置位置	2
2.2 埋立工事	3
2.3 舗装工事	4
2.4 その他空港施設工事等	5

# 1. 各工事進捗状況と平成30～31年度の工事内容

平成31年1月時点

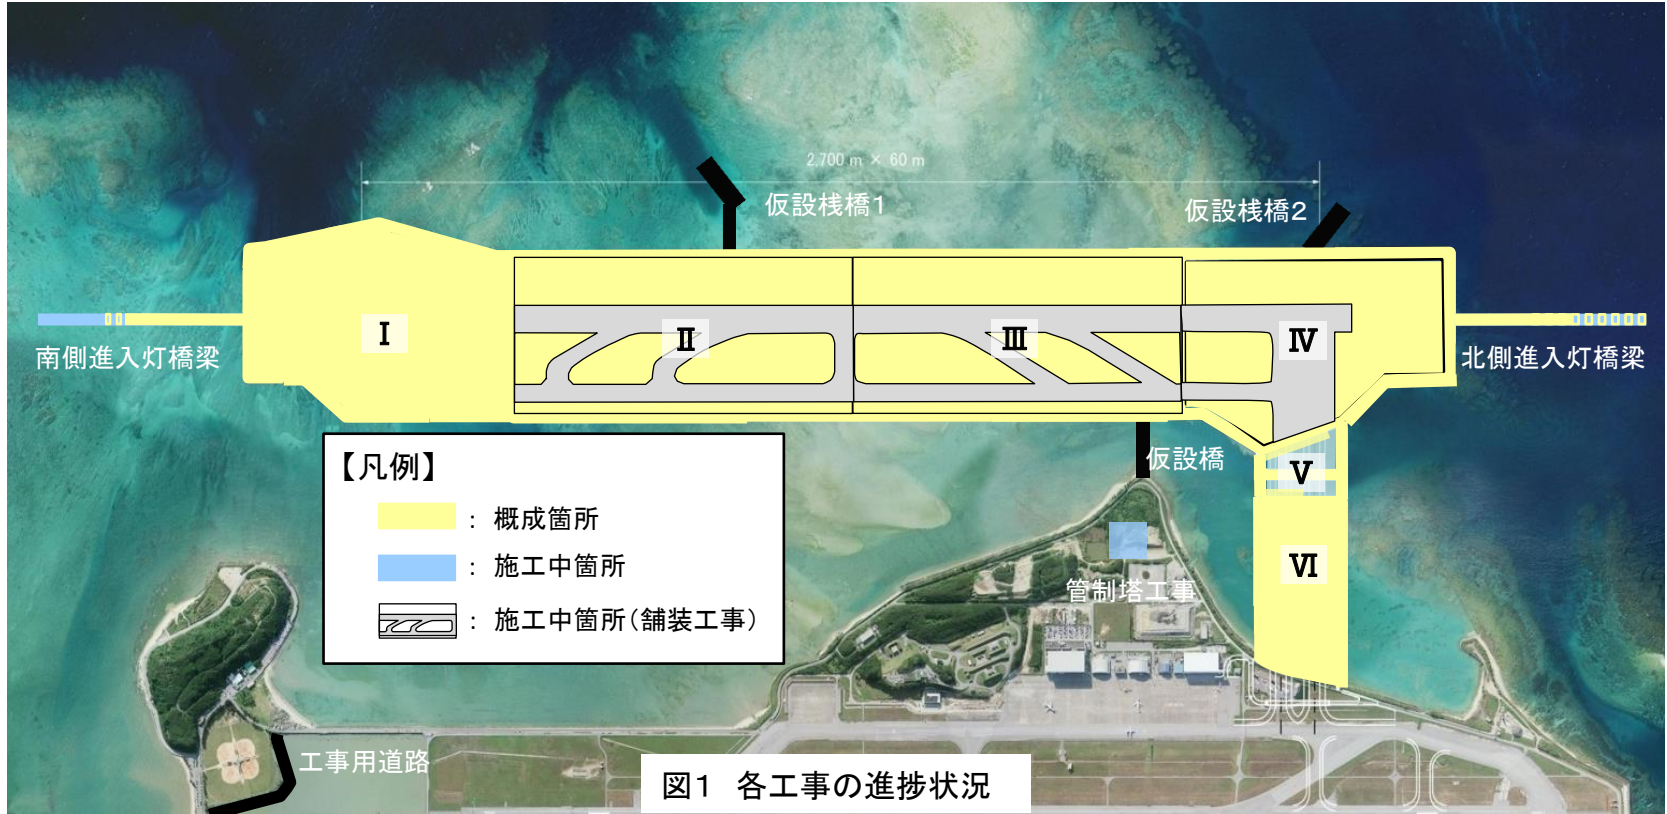


図1 各工事の進捗状況

	主な工事範囲	平成30年度						平成31年度											
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
埋立工事	I、V、VI工区	■	■	■	■	■	■												
舗装工事	I～VI工区	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
その他空港施設 工事等	進入灯(杭打設等) 管制塔	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## 2. 各工事の実施状況

### 2.1 汚濁防止膜の設置位置


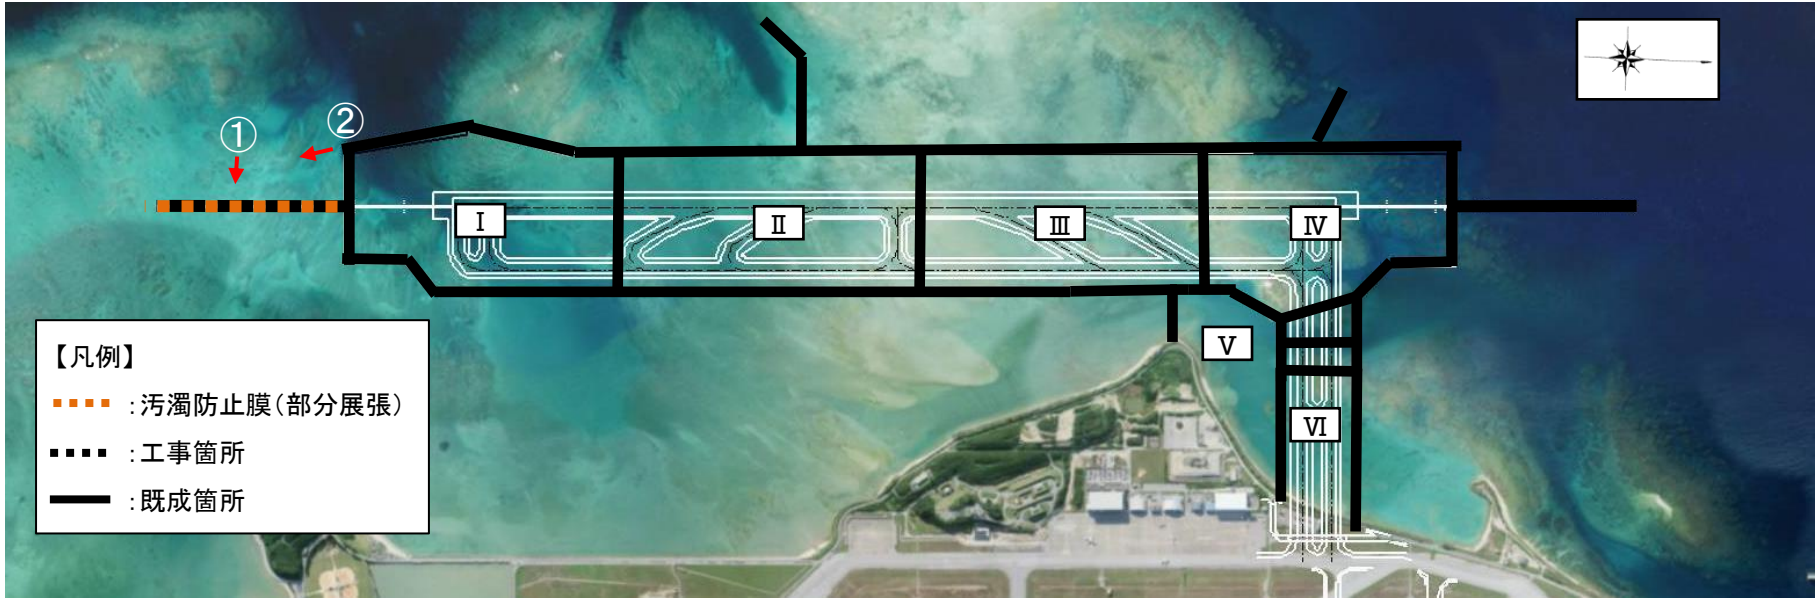


図2 汚濁防止膜の設置位置



① 【南側進入灯】仮設構台設定状況(平成30年10月撮影)



②【南側進入灯】杭打設状況(平成30年12月撮影)

## 2.2 埋立工事



図3 埋立工事の実施位置



① 【I工区】海砂投入状況  
(平成30年11月撮影)



② 【I工区】転圧状況  
(平成30年12月撮影)

## 2.3 舗装工事

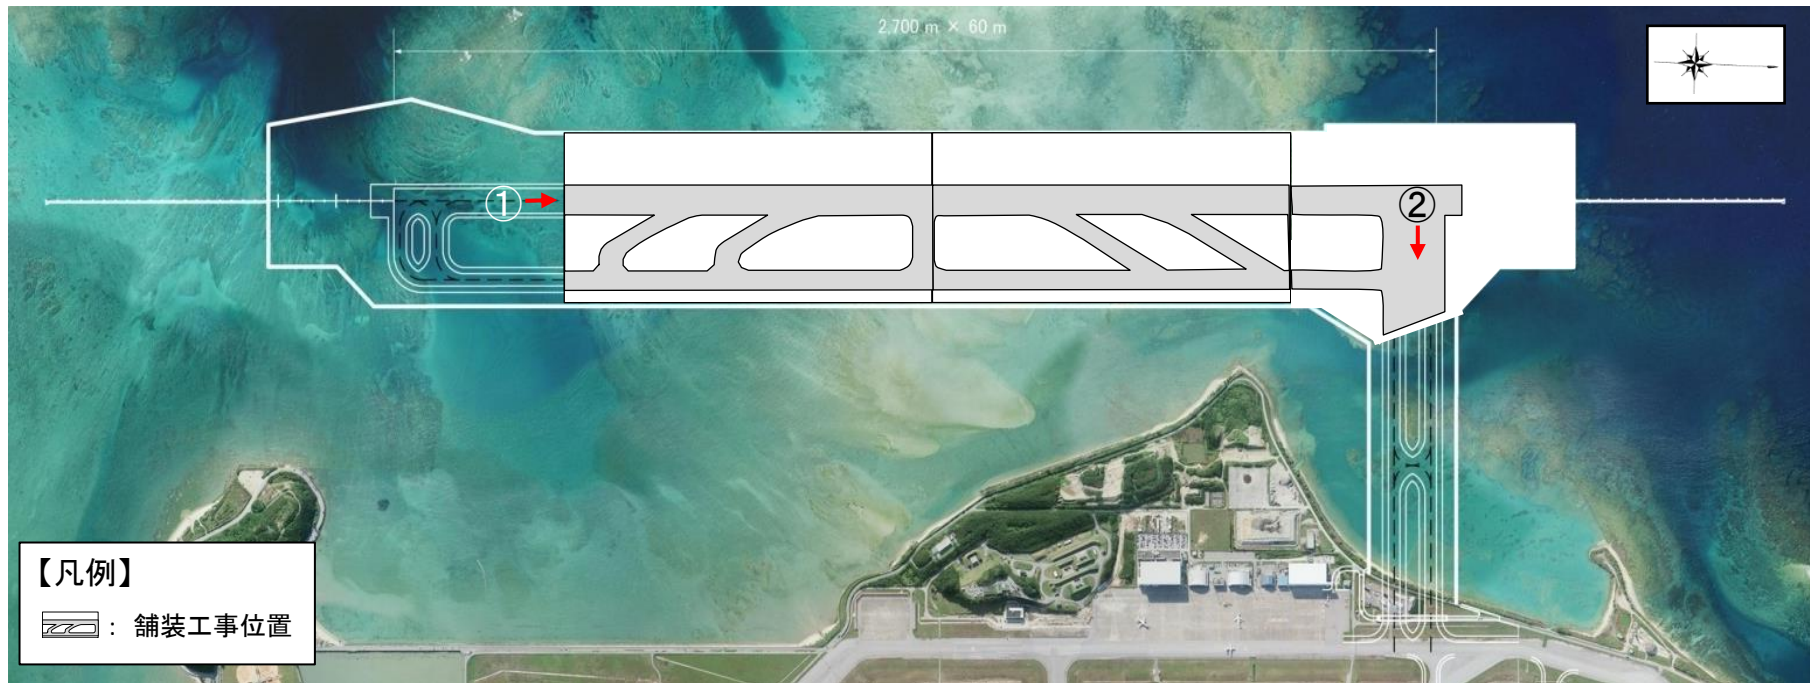


図4 舗装工事の実施位置



① 【Ⅱ工区(南側から撮影)】滑走路現況  
(平成30年12月撮影)



② 【Ⅳ工区】誘導路下層路盤転圧状況  
(平成30年12月撮影)

## 2.4 その他空港施設工事等

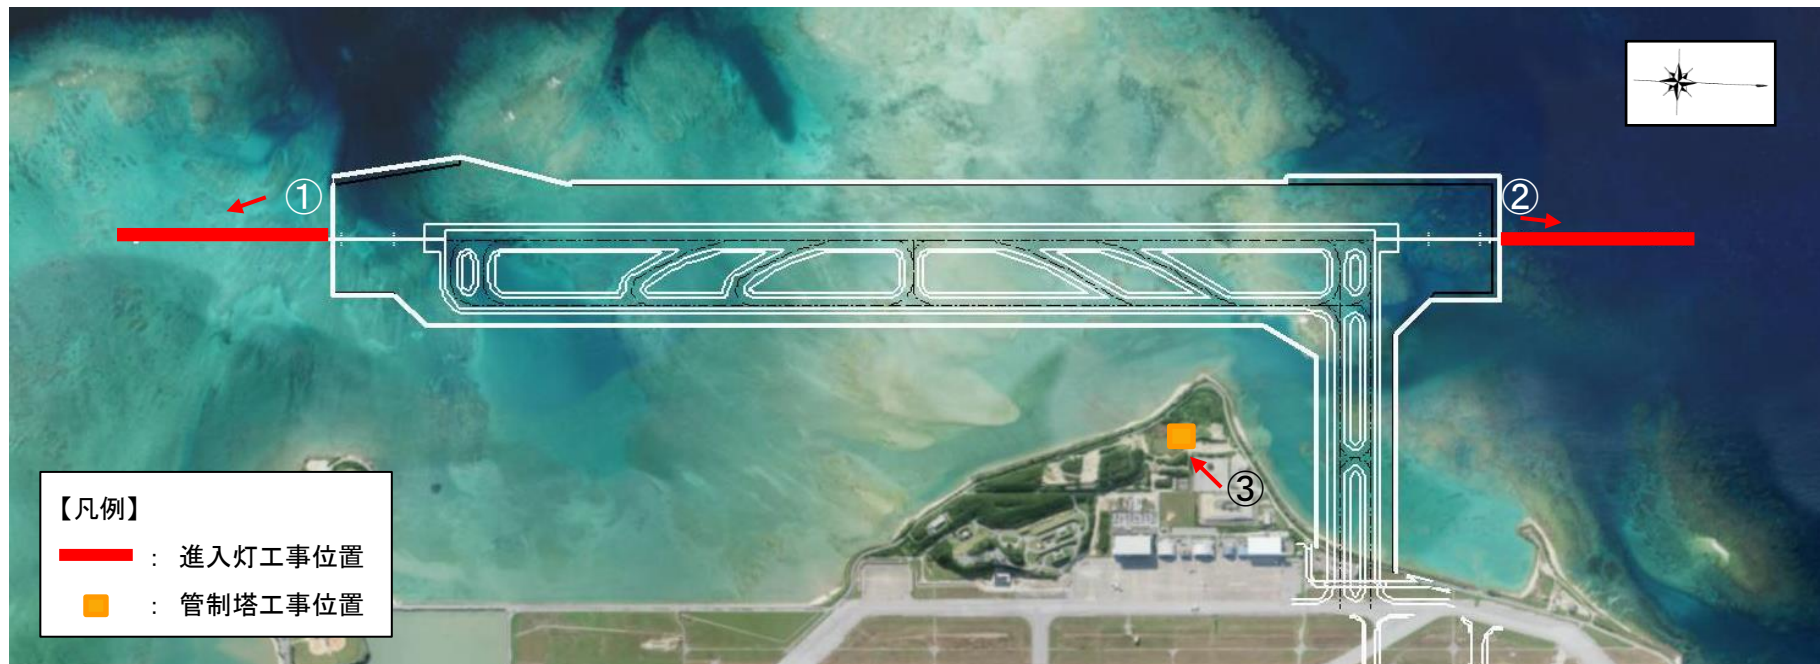


図5 その他空港施設工事等の実施位置



① 南側進入灯工事 仮設構台設置状況  
(平成30年12月撮影)



② 北側進入灯工事 橋梁上部工状況  
(平成30年11月撮影)



③ 管制塔工事 施工状況  
(平成30年12月撮影)
