
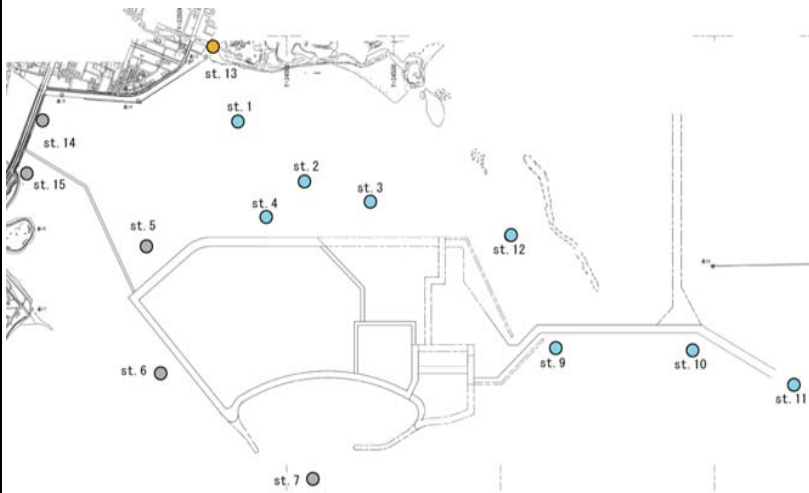



		異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討	
目視 観察 結果	全ての地点において監視基準値の超過はみられなかった(測定回数:25回)。 クビレミドロ監視地点での最大値は1月13日のst.3で2.1mg/Lであった。 工事の濁り監視地点での最大値は1月25日のst.4およびst.9で1.8mg/Lであった。		今月の県施工事は、橋梁/仮橋脚工事で、鋼管引抜き、鋼管杭撤去、閉塞工、杭橋脚撤去、汚濁防止膜移設等、養浜整備工事で、養浜砂(投入・均し)、汚濁防止膜撤去等、護岸/防波堤工事で、裏込材(投入・均し)、袋型根固工用袋材設置、上部コンクリート打設等が行われていたが、施工箇所からの濁りの拡散は確認されなかった。		
	水質 調査 結果	クビレミドロ監視地点 基準値 【st.1～3: SS=7mg/L】	全ての地点で基準値(7mg/L)を満足していた。 平均値は0.6mg/L、0.2～2.1mg/Lの範囲で推移していた。		
		工事の濁り監視地点 基準値【st.4～ 12:SS=11mg/L】	全ての地点で、監視基準(SS=11mg/L)を満足していた。 平均値は0.4mg/L、0.2～1.8mg/Lの範囲で推移していた。		
		流入部負荷量の調査地点	SS=11mg/Lを超えた回数: st.13=11回(25計測中) SS=50mg/Lを超えた回数: st.13=0回(25計測中) 平均値は11.9mg/L、1.5～38.8mg/Lの範囲で推移していた。		
		流入水路部調査地点(st.13)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。	1/6の38.8mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日0.0mm、前日2.0mm、当日7.0mmであった。		
基準 超過 時の 気象 概況	・全ての地点で、監視基準を満足していた。		【調査位置図】 		
	基準 超過 時の 工事 状況	・全ての地点で、監視基準を満足していた。			

中城湾港環境監視調査

【調査位置図】



流入部負荷量の調査地点

【流入水路部調査地点(st.13は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。】

※観測値は、1日1回、上層(水面より50cm)、中層(上下層の中間)、下層(底上20cm)の各層の平均値とした。

※天気・風向・風力は観測時における現地確認とした。

※降水量はアメダス(沖縄市胡屋)のデータを用い、24時間(1日)の合計を示した。

※潮は調査時間帯における「上げ潮」、「下げ潮」の状況を示した。また、潮位は中城検潮所における定時観測値を使用した。


※参考として流入水路部調査結果で値が11mg/Lを超えた場合と、50mg/Lを超えた場合に着色した。

※荒天もしくは干潮時等により観測が出来ない場合、工事未実施の場合は欠測とし、表中では「-」で示した。

※「濁り監視調査」は8/9から開始した。

SS(mg/L)観測結果及び降水量(mm)

観測日	1/1(土)	1/2(日)	1/3(月)	1/4(火)	1/5(水)	1/6(木)	1/7(金)	1/8(土)	1/9(日)	1/10(月)	1/11(火)	1/12(水)	1/13(木)	1/14(金)	1/15(土)	1/16(日)	1/17(月)	1/18(火)	1/19(水)	1/20(木)	1/21(金)	1/22(土)	1/23(日)	1/24(月)	1/25(火)	1/26(水)	1/27(木)	1/28(金)	1/29(土)	1/30(日)	1/31(月)
潮名	中潮	大潮	大潮	大潮	大潮	中潮	中潮	中潮	小潮	小潮	小潮	長潮	若潮	中潮	中潮	中潮	大潮	大潮	大潮	大潮	中潮	中潮	中潮	小潮	小潮	小潮	長潮	若潮	中潮	中潮	中潮
満潮時刻	17:05	17:53	7:40	8:26	9:09	9:51	10:31	11:12	11:54	12:40	13:33	14:31	15:27	16:17	17:00	17:39	7:12	7:42	8:11	8:41	9:11	9:42	10:16	10:52	11:33	12:23	13:27	14:41	15:53	16:56	17:51
干潮時刻	11:21	12:13	13:01	13:48	14:34	15:21	16:11	17:06	18:09	5:52	6:48	8:04	9:28	10:34	11:22	12:01	12:34	13:06	13:38	14:11	14:47	15:26	16:10	17:02	18:05	6:01	7:15	8:50	10:16	11:20	12:12
天気	-	-	-	晴	晴	曇	晴	晴	-	晴	曇	曇	雨	晴	晴	-	雨	曇	雨	晴	晴	曇	-	晴	晴	曇	曇	曇	雨	雨	曇
風向	-	-	-	NE	E	N	NE	N	-	NE	N	N	N	N	NNW	-	N	NNE	NE	NE	NE	E	-	NW	NNE	NE	S	NNE	NE	N	N
風力	-	-	-	2	3	3	3	2	-	2	4	3	3	3	1	-	3	3	2	2	2	2	-	1	3	2	3	3	3	3	3
降水量(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	4.5	0.5	1.0	0.0	0.0	2.5	70.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	16.0	4.0	0.0
潮						下げ潮	下げ潮	上げ潮		下げ潮	下げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	下げ潮		下げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	上げ潮		上げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	下げ潮	下げ潮
潮位(cm)	160	138	112	90	77	75	83	98	116	132	145	153	155	151	144	132	118	103	88	76	68	67	72	85	104	126	148	163	166	156	133
st.13	-	-	-	5.9	6.1	38.8	1.5	4.0	-	20.5	24.3	13.0	17.4	11.8	1.8	-	15.8	8.1	10.1	4.5	2.1	8.9	-	10.8	4.9	9.1	12.1	12.4	27.6	14.8	3.6

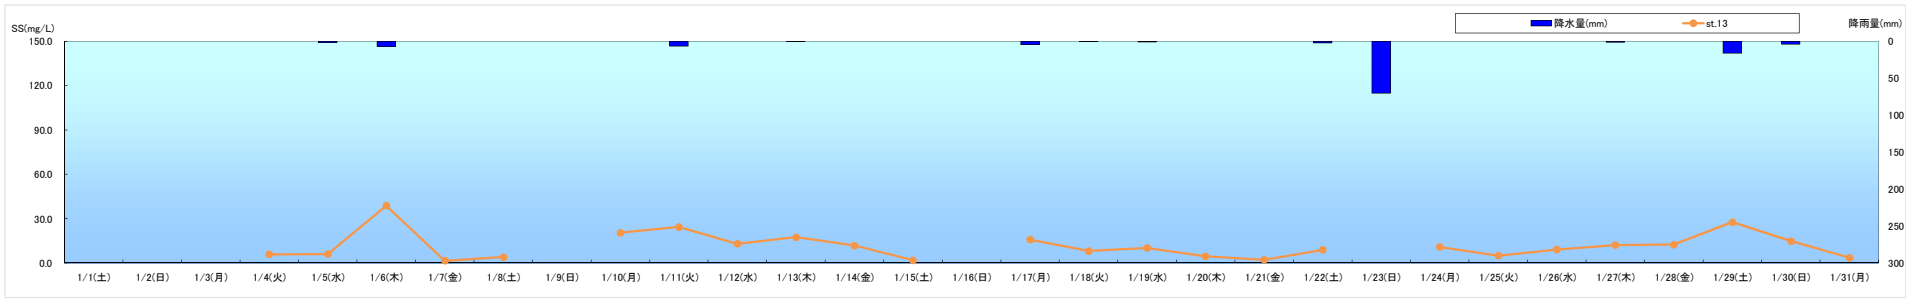

国	経路沿地 (-11.0m) 浚渫工事	浚渫															浚渫																													
		1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31														
国	護岸工事・橋梁撤去工事	橋梁上部補強、橋梁杭橋脚補強、鋼製覆工板設置 仮設高欄撤去、PC覆工板撤去、鋼製覆工板、橋梁上部撤去 橋梁杭橋脚補強 H鋼杭引抜き 鋼製覆工板設置 砕石管均し															橋梁上部補強、橋梁杭橋脚補強、鋼製覆工板設置 仮設高欄撤去、PC覆工板撤去、鋼製覆工板、橋梁上部撤去 橋梁杭橋脚補強 H鋼杭引抜き 鋼製覆工板設置															橋梁上部補強 PC覆工板撤去 鋼製覆工板設置 鋼製覆工板設置 H鋼杭引抜き H鋼杭引抜き H鋼杭引抜き 袋型掘削機工機付														
		杭橋脚撤去 鋼管杭引抜き 閉塞工															杭橋脚撤去 鋼管杭引抜き 鋼管杭撤去 閉塞工 汚濁防止欄移設															杭橋脚撤去 鋼管杭引抜き 袋型掘削機工機付 袋型掘削機工機付 袋型掘削機工機付														
県	護岸工事	養浜砂均し 養浜砂投入・均し															汚濁防止欄撤去																													
		型枠脱型・組立 裏込材投入・均し 裏込材均し 袋型掘削機工機付設置															型枠脱型 型枠組立 裏込材均し 袋型掘削機工機付設置															型枠脱型 型枠組立 上部コンクリート打設 型枠脱型 型枠組立 上部コンクリート打設 袋型掘削機工機付設置														

第10回(1月期モニタリング／フィードバック 月例会議)

対象期間: 令和4年1月1日～令和4年1月31日 沖縄県調査分

		異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討	
目視 観察 結果	<p>調査地点の最高値は1月6日(PM)のst.5で観測された4.6mg/Lであった。 期間中は、全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p>				
	水質 調査 結果	<p>工事の濁り監視地点基準値 【st.5～8: SS=11mg/L】</p>	<p>期間中は、全地点で工事監視基準値を満足した。 平均値は1.5mg/L、<1.0～4.6mg/Lの範囲で推移していた。</p>	<p>特になし</p>	
		<p>流入部負荷量の調査地点</p>	<p>SS=11mg/Lを超えた回数: st.14=25計測中6回 st.15=25計測中10回 ----- SS=50mg/Lを超えた回数: st.14=25計測中0回 st.15=25計測中0回</p>	<p>特になし</p>	
		<p>流入水路部調査地点(st.14、st.15)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。</p>	<p>st.14: 1/26 (PM 下げ潮時)19mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日が0.0mm、前日が0.0mm、当日が0.0mmであった。濁りの滞留が見られた。 st.15: 1/29 (PM 上げ潮時)19mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日が1.5mm、前日が0.0mm、当日が16.0mmであった。濁りの滞留が見られた。</p>		
基準超過時の気象概況	<p>基準超過時の気象概況は以下の通りであった。</p> <p>全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p>				
基準超過時の工事状況	<p>基準超過時の工事内容は以下の通りであった。</p> <p>全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p>				
		<p>【調査位置図】</p>			

