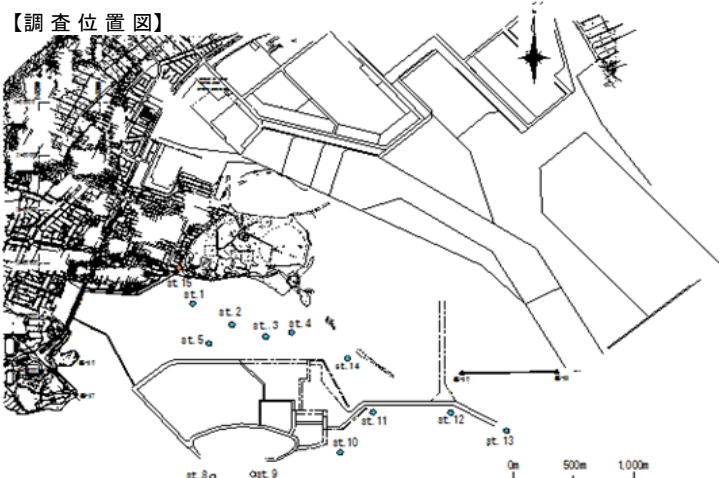



第12回(3月期)モニタリング／フィードバック 月例会議

対象期間:平成28年3月1日～3月31日 那覇港湾・空港整備事務所

		異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討
目視観察結果	<p>調査期間中は、クビレミドロ監視及び工事濁り監視の全地点において基準値を満足した。 クビレミドロ監視地点の最大値は、3月14日(AM)のst.1で4.2mg/Lであった。 工事の濁り監視地点の最大値は、3月14日(AM)のst.4で3.4mg/Lであった。</p> <p>3月14日(AM)は監視地点全てでやや高いであった。前日21時台～当日の8時台までに約85mmの降雨があり(胡屋観測所)、降雨による陸域からの濁水の流入により、海域が全面的に濁ったものと考えられた。</p>			特になし
	クビレミドロ監視地点基準値 【st.1～3: SS=7mg/l】	<p>調査期間中は、全地点で工事監視基準値を満足した。</p> <p>平均値は1.3mg/l、<1.0～4.2mg/lの範囲で推移していた。</p>		・特になし
	工事の濁り監視地点基準値 【st.4、5、11～14: SS=11mg/l】	<p>調査期間中は、全地点で工事監視基準値を満足した。</p> <p>平均値は1.2mg/l、<1.0～3.4mg/lの範囲で推移していた。</p>		・特になし
	流入部負荷量の調査地点	<p>SS=11mg/lを超えた回数: st.15=54計測中27回(観測範囲:4mg/l～36mg/l)</p> <hr/> <p>SS=50mg/lを超えた回数: st.15=54計測中0回</p>		
	流入水路部調査地点(st.15)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。	<p>st.15: 3月10日(AM) 36mg/lが最大値であった。前日の午前から当日の午前にかけて約20mmの降雨があり(胡屋観測所)、降雨による河川の増水や小排水路からの濁水の流入が確認された。</p>	<p>【調査位置図】</p> 	
基準超過時の気象概況				
基準超過時の工事状況				

備考)st.8及びst.9は沖縄県により調査が実施されている。

中城湾港環境監視調査



流入部負荷量の調査地点

【流入水路部調査地点(st.15)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。】

※観測値は、定時観測(10時、15時)の1日2回、上層(水面より50cm)、中層(上下層の中間)、下層(底上20cm)の各値の平均値とした。

※天気・風向・風力は定時観測時における現地確認とした。

※降水量はアメダス(沖縄市胡屋)のデータを用い、12時間(1時～12時、13時～24時)の合計を示した。

※潮は調査時間帯における「上げ潮」、「下げ潮」の状況を示した。また、潮位は中城検潮所における定時観測値を使用した。


※参考として流入水路部調査結果で値が11mg/lを超えた場合と、50mg/Lを超えた場合に着色した。

※荒天もしくは干潮時等に定時観測が出来ない場合は欠測とし、表中では「-」で示した。

※「人工島周辺監視調査」は灯浮標設置が行われる9/15から開始した。

SS(mg/l)観測結果及び降水量(mm)

観測日	3/1(火)		3/2(水)		3/3(木)		3/4(金)		3/5(土)		3/6(日)		3/7(月)		3/8(火)		3/9(水)		3/10(木)		3/11(金)		3/12(土)		3/13(日)		3/14(月)		3/15(火)		3/16(水)		3/17(木)		3/18(金)		3/19(土)		3/20(日)		3/21(月)		3/22(火)		3/23(水)		3/24(木)		3/25(金)		3/26(土)		3/27(日)		3/28(月)		3/29(火)		3/30(水)		3/31(木)																	
	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00																								
天気	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	雨	雨	晴	晴	晴	晴	雨	曇	雨	曇	雨	曇	晴	晴	晴	晴	雨	曇	晴	晴	雨	雨	雨	雨	晴	晴	晴	晴	雨	曇	晴	晴	曇	曇	雨	曇	雨	雨	曇	晴	-	-	晴	晴	-	-	晴	晴	-	-	-	-	-	-														
風向	NE	NE	NE	E	E	E	E	E	SE	S	S	S	NNE	NE	E	E	sw	NW	NE	NE	N	N	NE	NE	SE	NE	N	N	NE	NE	SE	E	NE	ESE	E	SSW	S	NW	N	N	NE	E	E	E	E	E	ESE	N	N	N	N	N	N	N	N	N	-	-	N	N	-	-	-	-	-	-												
風力	2	3	2	2	2	1	3	4	4	2	2	2	1	2	3	2	2	3	3	2	2	2	1	2	4	4	4	3	3	3	3	3	1	3	3	4	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-												
降水量(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	11.0	2.0	6.0	24.0	0.5	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	6.5	10.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	-	-	下げ潮	上げ潮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
潮位(cm)	151	86	136	107	118	128	101	144	87	153	79	150	80	133	92	103	114	66	142	32	169	11	185	7	180	22	178	51	159	84	135	115	112	137	93	147	82	145	78	133	82	115	92	93	106	71	121	52	137	37	151	27	162	26	168	32	167	45	160	65	147	89	-	-	-	-	-	-	-	-								
st.15	5.4	8.5	6.9	12	9.6	5.1	4.4	11	4.0	31	27	34	19	22	28	22	11	30	36	14	13	9.9	6.9	10	6.0	16	20	4.9	4.0	13	6.0	10	4.8	15	6.2	18	7.7	15	17	19	9.4	14	15	12	10	22	11	16	8.2	21	6.6	11	-	-	5.9	10	-	-	-	-	-	-																

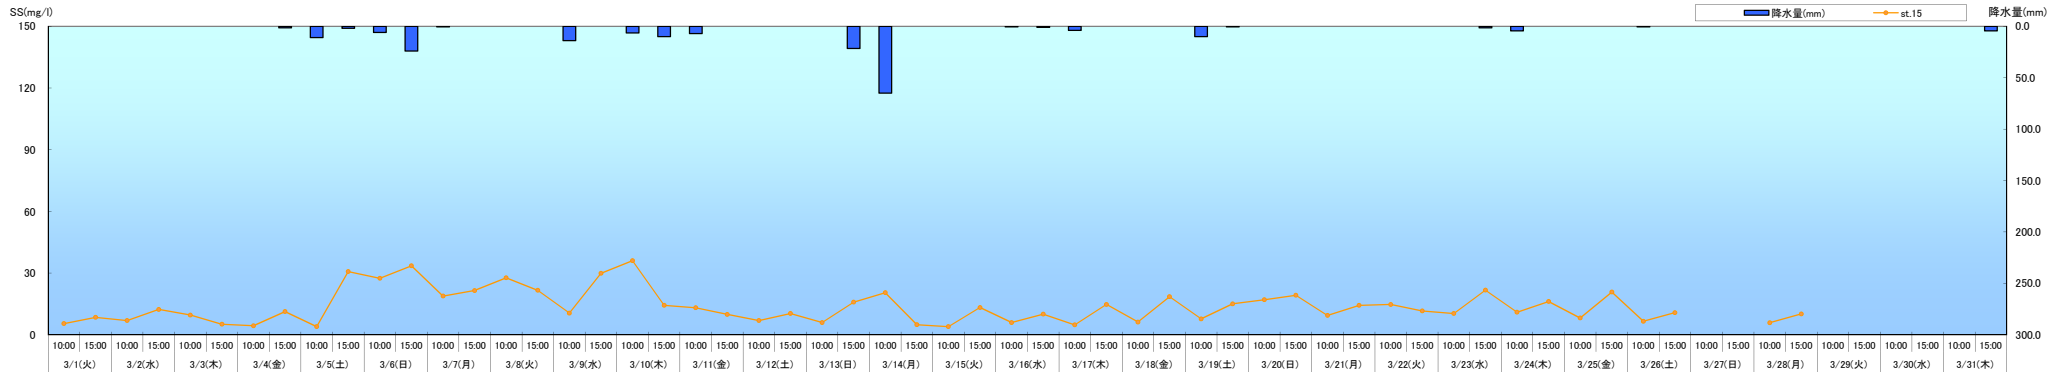

国	3/1(火)	3/2(水)	3/3(木)	3/4(金)	3/5(土)	3/6(日)	3/7(月)	3/8(火)	3/9(水)	3/10(木)	3/11(金)	3/12(土)	3/13(日)	3/14(月)	3/15(火)	3/16(水)	3/17(木)	3/18(金)	3/19(土)	3/20(日)	3/21(月)	3/22(火)	3/23(水)	3/24(木)	3/25(金)	3/26(土)	3/27(日)	3/28(月)	3/29(火)	3/30(水)	3/31(木)
護岸工事	汚濁防止幕設置・管理・撤去				汚濁防止幕設置・管理・撤去							汚濁防止幕設置・管理・撤去							汚濁防止幕設置・管理・撤去												
	基礎捨て石投入・荒均し・基礎均し・被覆石投入・被覆均し																														
	灯浮標・標準灯・汚濁防止幕設置・管理・移設・撤去				灯浮標・標準灯・汚濁防止幕設置・管理・移設・撤去							灯浮標・標準灯・汚濁防止幕設置・管理・移設・撤去							灯浮標・標準灯・汚濁防止幕設置・管理・移設・撤去												
浚渫工事	海上排砂管設備設置・管理・撤去											海上排砂管設備設置・管理・撤去																			
	土運搬工・空気圧送機工											土運搬工																			
限	汚濁防止膜撤去											汚濁防止膜撤去																			
	ガラス清掃											バックホウ揚土																			
	バックホウ揚土											汚濁防止膜撤去																			
仮航路浚渫工事	汚濁防止膜管理											汚濁防止膜撤去																			
	汚濁防止膜撤去																														
地盤改良工事	サンドコンパクションパイル																														

第12回(3月期モニタリング／フィードバック 月例会議)

対象期間:平成28年3月1日～平成28年3月31日 沖縄県調査分

		異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討
目視 観察 結果	<p>調査地点の最高値は3月14日(AM)のst.6で観測された13.0 mg/Lであり、工事監視基準を超過した。 その他の地点については、全て工事監視基準を満足していた。</p>		<p>st.6の直近では仮棧橋整備工事が行われており、鋼管杭打設や高欄設置が行われていた。鋼管打設箇所では、SS濃度は汚濁防止膜内が汚濁防止膜外より低い値を示しており、高欄設置箇所は、濁りの発生する工種ではない。 これらのことから、工事との関連性は認められない。</p>	・特になし
	<p>工事の濁り監視地点基準値 【st.6～10: SS=11mg/L】</p>	<p>3/14 st.6(AM 上げ潮-満潮-下げ潮時)で工事監視基準値を超過した。 平均値は1.6 mg/L、<1.0～13 mg/Lの範囲で推移していた。</p>	特になし	
	<p>流入部負荷量の調査地点</p>	<p>SS=11mg/Lを超えた回数: st.16=54計測中33回 st.17=54計測中27回 ----- SS=50mg/Lを超えた回数: st.16=54計測中3回 st.17=54計測中0回</p>	特になし	
	<p>流入水路部調査地点(st.16、st.17)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。</p>	<p>st.16:3/19 (AM 下げ潮時)95mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日4.0mm、前日0.0mm、当日10.5mmであり、降雨による濁水流入がみられた。 st.17:3/5 (PM 上げ潮時)30mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日0.0mm、前日1.5mm、当日13.0mmであり、降雨による濁水流入がみられた。</p>		
基準超過時の 気象概況	<p>降水量は、前日22時から当日7時までに総雨量86mmであった。 st.6における塩分濃度は、21.52%であった。 これらのことから、降雨により増水した河川水の影響が考えられる。</p> <p>風向・風速は、前日は東南東～南の風が平均風速6.9m/s、当日は南～北の風が平均風速7.1m/sであった。(アメダス宮城島)</p>		<p>【調査位置図】</p> 	
基準超過時の 工事状況	<p>st.6の直近では仮棧橋整備工事が行われており、鋼管杭打設や高欄設置が行われていた。</p>			

