


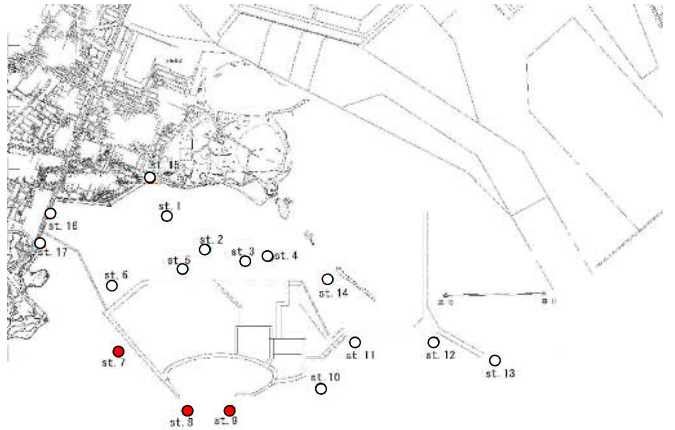
第12回(3月期モニタリング/フィードバック 月例会議)

対象期間: 平成26年3月1日～平成26年3月31日 那覇港湾・空港整備事務所

		異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討
目視観察結果	<p>流入部調査地点の最高値は、3月8日PMのst.16で107mg/Lであった。 クビレミドロ監視地点の最高値は、3月13日AMのst.3で7.0mg/Lであった。 工事の濁り監視地点の最高値は、3月13日AMのst.6で8.6mg/Lであった。 3月に基準値を超過した地点はなかった。全地点で工事監視基準値を満足していた。</p>		<p>3月の工事内容は、い・う・え護岸では3月1日から4日までサンドコンパクションパイプ打設作業、その後、チェックボーリングが3月11まで行われた。また、汚濁防止膜の撤去作業は3月3日から22日まで行われた。 新港地区では3月1日から10日まで泊地(-11m)での浚渫・土運搬作業が行われていた。また、仮設棧橋では新港地区の浚渫土の揚土作業が3月1日から14日まで行われ、その後、3月24まで汚濁防止膜の撤去作業が行われていた。</p>	・特になし
	クビレミドロ監視地点基準値 【st.1～3: SS=7mg/L】	<p>期間中は、全地点で工事監視基準値を満足した。 平均値は2.4mg/L、<1～7.0mg/Lの範囲で推移していた。</p>	特になし	
	工事の濁り監視地点基準値 【st.4～6、10～14: SS=11mg/L】	<p>期間中は、全地点で工事監視基準値を満足した。 平均値は2.0mg/L、<1.0～8.6mg/Lの範囲で推移していた。</p>	特になし	
	流入部負荷量の調査地点	<p>SS=11mg/Lを超えた回数: st.15=55計測中37回(4.8～46mg/L) st.16=55計測中25回(3.9～107mg/L) st.17=55計測中19回(4.1～22mg/L) ----- SS=50mg/Lを超えた回数: st.15=55計測中0回 st.16=55計測中1回 st.17=55計測中0回</p>		
水質調査結果	<p>流入水路部調査地点(st.15、st.16、st.17)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。 st.15: 3/20 (PM 上げ潮時)46mg/Lが最大値であった。前日3.5mm、当日3.5mmの降雨が確認され、降雨による濁水流入がみられた。 st.16: 3/8 (PM 下げ潮時)107mg/Lが最大値であった。前日0mm、当日61.5mmの降雨が確認され、降雨による濁水流入がみられた。 st.17: 3/28 (PM 上げ潮時)22mg/Lが最大値であった。前日、当日とも降雨は確認されず、濁水流入もみられなかった。</p>	<p>【調査位置図】</p> 		
基準超過時の気象概況	3月は基準超過地点が見られなかった。			
基準超過時の工事状況				

第12回(3月期モニタリング/フィードバック 月例会議)

対象期間:平成26年3月1日～平成26年3月31日 沖縄県調査分

		異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討
目視 観察 結果	<p>調査地点の最高値は3月13日(AM)のst.8で観測された4.6mg/Lであった。 全ての地点において工事監視基準を満足していた。</p>			<p>・特になし</p>
	水質 調査 結果	<p>工事の濁り 監視地点 基準値 【st.7～9: SS=11mg/l】</p> <p>全ての地点において工事監視基準値を満足していた。 <1.0～4.6mg/Lの範囲で推移しており、平均値は1.3mg/Lであった。</p>		
基準 超過 時の 気象 概況	<p>全ての地点において工事監視基準値を満足していた。</p>		<p>【調査位置図】</p> 	
基準 超過 時の 工事 状況				

