

平成20年4月3日

《問い合わせ先》

那覇港湾・空港整備事務所 中城湾港出張所
崎間・与那嶺

TEL : 098-938-9640 FAX : 098-982-1314

※中城湾港出張所HP

<http://www.dc.ogb.go.jp/nakagusukuwankou/>

中城湾港泡瀬地区公有水面埋立事業

平成20年度工事の実施について

中城湾港泡瀬地区の当該事業は、各種の環境保全策に取り組みながら実施してきております。


平成20年度においては、関連事業費約40億円をもって進めて参ります。

当該事業については、環境アセスメントの規定に従い、4月～7月の間はトカゲハゼ生活圏への配慮のため、海上における工事を一時中断しておりましたが、昨年度に埋立地の外周護岸が囲まれたことから、今年度は閉鎖した水域内の護岸を内側から裏埋めを行う等の、トカゲハゼの浮遊期に影響のない工事について、4月下旬から別添資料のとおり実施することと致しましたのでお知らせします。


なお、工事の実施に当たっては、これまでと同様に最大限慎重を期することとしております。具体的には、日々のモニタリング結果を工事実施体制や監視体制にフィードバックさせる体制を構築しており、環境への影響について十分監視しながら実施致します。

区分	工種	工事概要	平成20年度												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
国	護岸工事(4月以降)	護岸延長 約1,086m 砂投入 61,000m ³	[Blue bar from month 4 to 12]												
	護岸工事(8月以降)	護岸延長 約2,258m 石材投入 約31,000m ³ 土のう 約7,800個	[Blue bar with dashed ends from month 8 to 3]												
	仮設航路浚渫工事	浚渫 約109,000m ³	[Blue bar with dashed ends from month 8 to 1]												
	泊地(-11.0m)浚渫工事	浚渫 約125,000m ³	[Blue bar with dashed ends from month 12 to 3]												

■■■ 汚濁防止膜設置・撤去

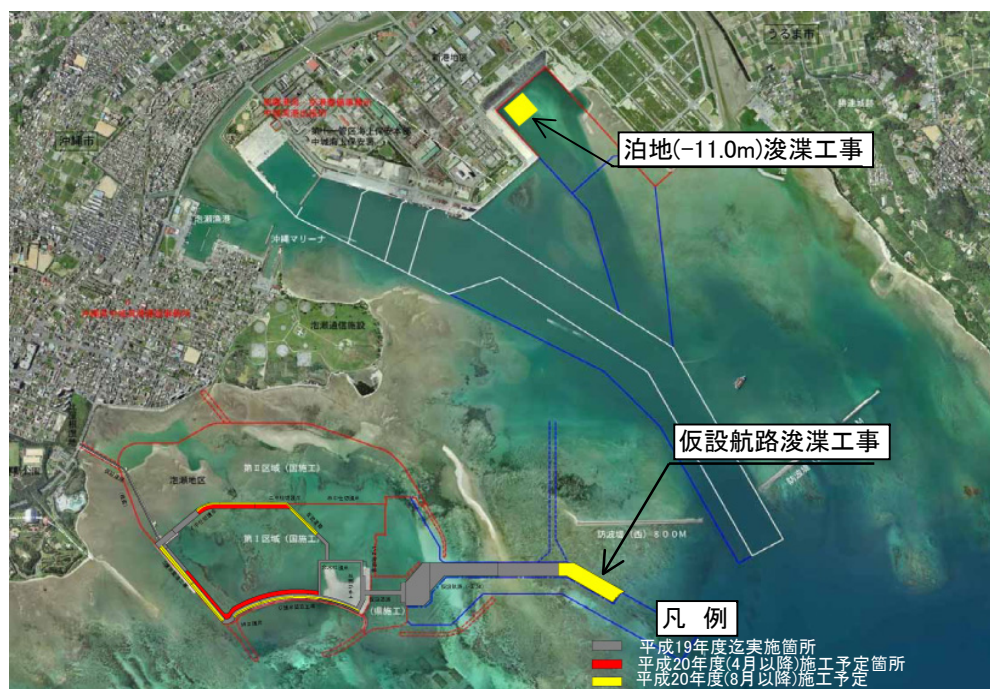

土砂処分場詳細図

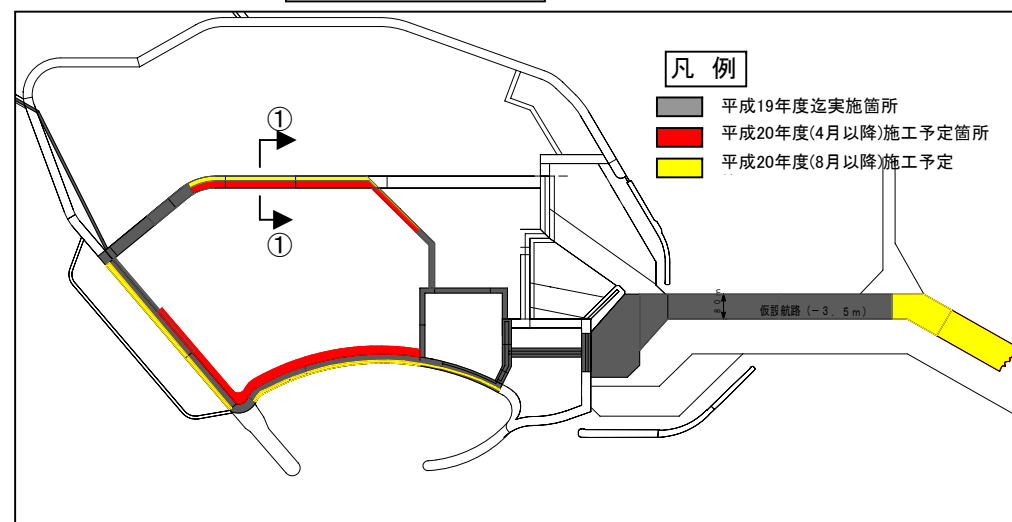

①-①断面図

