

事後評価結果（平成22年度）（案）

担当課：

担当課長名：

事業名	一般国道329号 <small>いしかわ</small> 石川バイパス	事業区分	一般国道	事業主体	沖縄総合事務局
起終点	自： <small>きんちょうあざやか</small> 沖縄県金武町字屋嘉 至： <small>おきなわしくしはる</small> 沖縄県沖縄市後原	延長	8.2km		

事業概要
一般国道329号は名護市を起点とし本島東側を南下し那覇市に至る延長約76kmの主要幹線道路である。
石川バイパスが縦貫する沖縄本島のほぼ中心に位置するうるま市石川地区は、近年急激に宅地開発が進み、交通量は増加の一途をたどり、特に中心市街地を通る現国道区間では、交差点間隔が100m程度と短いこともあり、朝夕の通勤・通学及び、夏季観光シーズン、休日・祝祭日等には慢性的な交通渋滞が発生していた。そのような背景のもと、石川バイパスは交通渋滞の緩和を図るため、昭和63年度に事業化され、平成17年度に全線4車線供用された路線である。

事業の目的・必要性
石川バイパスは、うるま市石川地区及び周辺地域における、慢性的な交通渋滞の緩和、沿道環境の改善、交通安全の確保、地域産業の活性化などを目的として計画されたバイパス事業である。



事業効果等	事業期間	事業化年度	S 6 3 年度	用地着手	H 1 年度	供用年(当初)	H 1 年度 / H 1 年度	変動	— 倍
		都市計画決定	—	工事着手	H 2 年度	(暫定/完成)	(実績) H 1 4 年度 / H 1 7 年度		
	事業費	計画時(暫定/完成)	(名目値) — / 475 億円 (実質値) — / 475 億円	実績(暫定/完成)	(名目値) — / 475 億円 (実質値) — / 475 億円			変動	1.00 倍
	交通量(当該路線)	計画時(暫定/完成)	— / — 台/日	実績(暫定/完成)	12,400/16,400台/日			変動	— %
	旅行速度向上 (供用前現道→当該路線)	20.8 → 25.4 km/h (供用直前年次) H 6 年度 (供用後年次) H 1 7 年度		交通事故減少 (整備中→供用後)	87 → 80 件 (事業中年次) H 9 ~ H 1 2 年 (整備後年次) H 1 7 ~ H 2 0 年				
費用対効果分析結果(再評価)	B/C	3.5	総費用 641億円 (事業費: 306億円 維持管理費: 47億円)	総便益 2,268億円 (走行時間短縮便益: 2,249億円 走行経費減少便益: -15億円 交通事故減少便益: 34億円)	基準年 H 1 5 年				
	B/C	1.9	総費用 749億円 (事業費: 704億円 維持管理費: 45億円)	総便益 1,443億円 (走行時間短縮便益: 1,346億円 走行経費減少便益: 90億円 交通事故減少便益: 7.2億円)	基準年 H 2 2 年				
	事業遅延によるコスト増	費用増加額	— 億円	便益減少額	— 億円				

事業による環境変化	事業遅延の理由 特になし
	客観的評価指標に対応する事後評価項目 ・円滑なモビリティの確保（交通混雑の緩和に寄与：渋滞損失時間約6割削減） ・個性ある地域の形成（観光地へのアクセス向上：赤崎交差点から主要観光地「ビオスの丘」までの所要時間14分短縮） <div style="text-align: right;">他15項目に該当</div>
	その他評価すべきと判断した項目 ・交通混雑の緩和（国道329号赤崎1丁目交差点の渋滞長緩和：3000m→40m） ・地域活性化を支援（バイパス周辺地域の人口増加：207百人→221百人）
	環境影響評価に対応する項目 環境影響評価、対象外事業である。
事業を巡る社会経済情勢等の変化	その他評価すべきと判断した項目 特になし
	事業を巡る社会経済情勢等の変化 【社会情勢の変化】 ・石川バイパス周辺地域において、人口・自動車保有台数・従業者数は増加傾向 ・交通量が増加傾向になり、ますます自動車依存型の社会環境が進展 【周辺道路網の整備状況】 ・恩納南バイパス（H20暫定2車線供用） 【市町村合併】 ・石川市、具志川市、勝連町、与那城町が合併し、うるま市が誕生（H17.4）
今後の事後評価の必要性及び改善措置の必要性	石川バイパスの整備により、沖縄本島東海岸側の南北ネットワークが強化され、うるま市石川市街地の渋滞が緩和するなど、整備に伴う効果が十分発現されており、効果は持続していくと思われることから、地域にとって重要な役割を果たしている。 このことから、事業目的を達成していると判断できるため、今後の事業評価及び改善措置の必要性はない。
計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性	特に、同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性はない。
特記事項	特になし

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国329号 石川バイパス
事業主体	沖縄総合事務局

●事業の効果や必要性の評価項目に対応する事後評価項目

政策目標		指 標（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間(人・時間)及び削減率	国道329号現道区間(赤崎交差点～後原交差点間)における渋滞損失時間削減量:約56%削減(45.7万人・時間/年削減) (整備前:81.2万人・時間/年⇒整備後:35.5万人・時間/年)
		● 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満であった区間の旅行速度の改善状況	国道329号現道区間 金武町字屋嘉(センサス区間番号1030)の混雑時旅行速度(平日):17.6km/h(H6)→25.3km/h(H17) うるま市石川(センサス区間番号1031)の混雑時旅行速度(平日):20.8km/h(H6)→25.4km/h(H17)へ改善
		□ 現道又は並行区間等における踏切道の除去もしくは交通改善の状況	
		■ 当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況	石川バイパス現道区間の混雑時旅行速度が向上(約18km/h→約25km/h(センサス区間番号1030)、約21km/h→約25km/h(センサス区間番号1031)したため、現道区間を運行するバス(5系統103便)のバスの利便性が向上
		□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上の状況	
		□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上の状況	
	物流効率化の支援	■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上の状況	うるま市石川地区(赤崎交差点)から重要港湾・中城湾港までの所要時間が短縮 整備前:38分→整備後37分(約1分短縮)
		□ 農林水産業を主体とする地域における農林水産品の流通の利便性向上の状況	
		□ 現道等における総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間が解消	
1. 活力	都市の再生	□ 都市再生プロジェクトの支援に関する効果	
		■ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路が形成(又は一部形成)されたことによる効果	・「ハシゴ道路」の構築(沖縄ブロック幹線道路協議会)
		□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携に関する効果	
		□ 中心市街地内で行われたことによる効果	
		□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	

	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が事業実施前に連絡道路がなかった住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となった	
		<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間が解消	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間が解消	
		■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上の状況	・うるま市石川地区(赤崎交差点)から中部地域の中心都市である沖縄市(沖縄市役所)までの所要時間が短縮 整備前:約29分→整備後:約27分(約2分短縮)
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されていた地区の一体的発展への寄与の状況	
		■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果	・石川バイパス沿線にうるま市の公園整備が予定されている
		■ 主要な観光地へのアクセス向上による効果	・うるま市石川地区(赤崎交差点)から主要観光地「ビオスの丘」までの所要時間が短縮 整備前:約23分→整備後:約9分(約14分短縮)
		■ 特別立法に基づく事業としての効果	・沖縄振興特別措置法
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設と直結されたことによる効果	
		<input type="checkbox"/> 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボリックな道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業としての効果	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車利用空間が整備されたことによる当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性向上の効果	
		<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化された	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)等の幹線道路において新たに無電柱化を達成	
	安全で安心できるくらしの確保	■ 三次医療施設へのアクセス向上の状況	・うるま市石川地区(赤崎交差点)から三次医療施設(県立中部病院)までの所要時間が短縮 整備前:約25分→整備後:約23分(約2分短縮)
	3. 安全	■ 現道等における交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等による安全性向上の状況	・現道区間(赤崎交差点～後原交差点)の交通事故件数が87件(H9～H12)→80件(H17～H20)に減少
		<input type="checkbox"/> 歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置されたことによる安全性向上の状況	

	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落が解消	
		■ 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線(以下「緊急輸送道路」という)として位置づけあり	・第2次緊急輸送路ネットワーク
		■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成	・第2次緊急輸送道路である「国道329号金武町屋嘉～沖縄市後原」の代替路線としての機能を確保
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能	
		<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消	
		<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間が解消	
		<input type="checkbox"/> 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加	
		<input type="checkbox"/> 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消	
		<input type="checkbox"/> 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯としての機能	
4. 環境	地球環境の保全	● 対象道路の整備により、削減される自動車からのCO2排出量	・CO2排出削減量:5,464t-CO2/年(約0.4%減) (H42時 整備前:1,498,189t-CO2/年⇒整備後:1,498,725t-CO2/年)
	生活環境の改善・保全	● 現道等における自動車からのNO2排出削減率	※自動車NOx・PM法対策地域指定外 排出削減量:38.0t-NO2/年、排出削減率:約5割削減 (H42時 整備前:74.8t-NO2/年⇒整備後:36.8t-NO2/年)
		● 現道等における自動車からのSPM排出削減率	※自動車NOx・PM法対策地域指定外 排出削減量:3.5t-SPM/年、排出削減率:約5割削減 (H42時 整備前:7.0t-SPM/年⇒整備後:3.5t-SPM/年)
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過していた区間の騒音レベルの改善の状況	現道区間における騒音レベル(H13年度)は、整備前の時点で要請限度(昼間75dB、夜間70dB)を下回っている→該当しない →うるま市石川赤崎:昼間64.0dB、夜間58.0dB →うるま市石川:昼間69.0dB、夜間64.0dB →うるま市石川東恩納:昼間74.0dB、夜間69.0dB
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	■ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	・道路の整備に関するプログラムに位置づけがあった
		<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業との一体的整備の必要性または一体的整備による効果	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに関する効果	
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道329号	石川バイパス	L=8.2km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
25,100	4	沖縄総合事務局

① 費 用

	事業費	維持管理費	合 計
基 準 年	平成22年度		
単純合計	464億円	65億円	529億円
基準年における 現在価値 (C)	704億円	45億円	749億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	平成22年度			
供 用 年	平成8年度			
単年便益 (初年便益)	1.0億円	0.07億円	0.03億円	1.1億円
基準年における 現在価値 (B)	1,346億円	90億円	7.2億円	1,443億円

③ 結 果

費用便益比(事業全体)	1.9
経済的純現在価値(事業全体)	694億円
経済的内部収益率(事業全体)	7.8%

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

交通状況の変化

様式－3①

事業名：石川バイパス(事業全体)

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [石川バイパス] :6.6km		交通量※ ¹	[台/日]	0	25,104
		走行時間※ ²	[分]	0.0	9.7
		走行時間費用※ ³	[億円/年]	0.00	44
②主な周辺道路※ ⁴	現道(国道329号) :6.1km	交通量	[台/日]	28,216	17,874
		走行時間	[分]	20.5	16.7
		走行時間費用	[億円/年]	106	55
	沖縄自動車道 :5.6km	交通量	[台/日]	14,942	10,598
		走行時間	[分]	8.6	8.5
		走行時間費用	[億円/年]	11	7.6
	国道58号 :2.6km	交通量	[台/日]	37,561	32,313
		走行時間	[分]	3.4	3.2
		走行時間費用	[億円/年]	23	19
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
③その他道路合計 :1476km		走行時間費用	[億円/年]	5,111	5,103

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A－B)
合計： 1497km	走行時間短縮便益	[億円/年]	5,252	5,228	24

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)

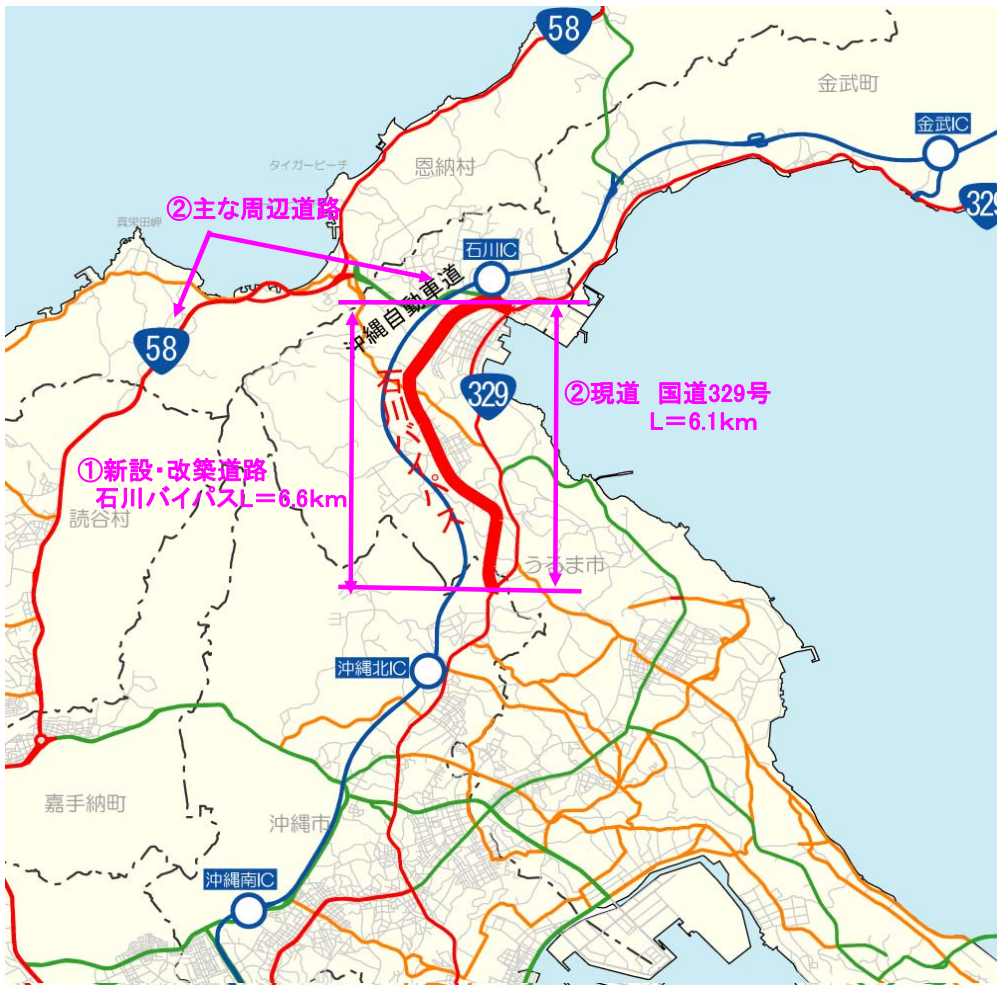

費用便益分析の条件

事業名：石川バイパス

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他	<input type="checkbox"/>		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間		
	社会的割引率	4%		
	基準年次	平成22年度		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input type="checkbox"/> ()	
		複数時点での推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (平成17センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
		その他()	<input type="checkbox"/>	
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
		有	<input type="checkbox"/>	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) () 台トリップ/日 考慮した理由を記載	
	配分交通量の推計手法	Q－V式を用いた配分		<input type="checkbox"/>
		転換率式を用いた配分		<input type="checkbox"/>
		Q－V式と転換率式の併用による配分		<input checked="" type="checkbox"/>
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		<input type="checkbox"/>
		簡易手法		<input type="checkbox"/>
		簡易手法の 採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
			山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
			その他()	
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
その他()		<input type="checkbox"/>		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定		<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax～Qmin)以上の路線、交通容量程度の路線等が混在 した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重 平均速度」を用いた。			
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>		
	採用理由を記載			
その他()		<input type="checkbox"/>		

(3)

	項目	チェック欄		
便 益 の 算 定	休日交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 <small>() % 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載</small>	<input type="text"/>
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 <small>() 日 採用した通行止め日数の考え方を記載</small>	<input type="text"/>
			とり止め交通を考慮する <small>とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載</small>	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
考慮する		<input type="checkbox"/>		
考慮する場合のみ		採用した冬期日数 <small>() 日 採用した冬期日数の考え方を記載</small>	<input type="text"/>	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 <small>設定の考え方を記載</small>	<input type="text"/>	
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 <small>()</small>	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

事業名：石川バイパス

(4)

[illegible]

費用の現在価値算定表

箇所名: 石川バイパス 基準年 H 22				維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)			
				単価(億円)		延長(km)	
				0.18		8.2	
年次	年度	割戻率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-8年目	S 63	2.3699	94.0	1.3	2.9	0.00	0.00
-7年目	H 1	2.2788	96.7	8.7	19	0.00	0.00
-6年目	H 2	2.1911	99.1	19	39	0.00	0.00
-5年目	H 3	2.1068	101.8	33	62	0.00	0.00
-4年目	H 4	2.0258	103.1	48	85	0.00	0.00
-3年目	H 5	1.9479	103.5	59	101	0.00	0.00
-2年目	H 6	1.8730	103.4	30	49	0.00	0.00
-1年目	H 7	1.8009	102.8	37	59	0.00	0.00
供用開始年次	H 8	1.7317	102.3	31	48	0.49	0.76
1年目	H 9	1.6651	103.3	28	41	0.48	0.71
2年目	H 10	1.6010	102.8	36	51	0.48	0.68
3年目	H 11	1.5395	101.3	25	35	0.65	0.90
4年目	H 12	1.4802	99.7	20	27	0.65	0.88
5年目	H 13	1.4233	98.4	40	52	0.65	0.86
6年目	H 14	1.3686	96.6	18	23	0.65	0.84
7年目	H 15	1.3159	95.4	11	14	1.4	1.8
8年目	H 16	1.2653	94.4	10	12	1.4	1.7
9年目	H 17	1.2167	93.2	1.4	1.7	1.4	1.7
10年目	H 18	1.1699	92.5	4.1	4.7	1.4	1.6
11年目	H 19	1.1249	91.7	1.5	1.6	1.4	1.6
12年目	H 20	1.0816	91.3	0.77	0.83	1.4	1.5
13年目	H 21	1.0400	91.3	1.9	2.0	1.4	1.5
14年目	H 22	1.0000	91.3	0.00	0.00	1.4	1.4
15年目	H 23	0.9615	91.3	0.00	0.00	1.4	1.4
16年目	H 24	0.9246	91.3	0.00	0.00	1.4	1.3
17年目	H 25	0.8890	91.3	0.00	0.00	1.4	1.3
18年目	H 26	0.8548	91.3	0.00	0.00	1.4	1.2
19年目	H 27	0.8219	91.3	0.00	0.00	1.4	1.2
20年目	H 28	0.7903	91.3	0.00	0.00	1.4	1.1
21年目	H 29	0.7599	91.3	0.00	0.00	1.4	1.1
22年目	H 30	0.7307	91.3	0.00	0.00	1.4	1.0
23年目	H 31	0.7026	91.3	0.00	0.00	1.4	0.99
24年目	H 32	0.6756	91.3	0.00	0.00	1.4	0.95
25年目	H 33	0.6496	91.3	0.00	0.00	1.4	0.92
26年目	H 34	0.6246	91.3	0.00	0.00	1.4	0.88
27年目	H 35	0.6006	91.3	0.00	0.00	1.4	0.85
28年目	H 36	0.5775	91.3	0.00	0.00	1.4	0.81
29年目	H 37	0.5553	91.3	0.00	0.00	1.4	0.78
30年目	H 38	0.5339	91.3	0.00	0.00	1.4	0.75
31年目	H 39	0.5134	91.3	0.00	0.00	1.4	0.72
32年目	H 40	0.4936	91.3	0.00	0.00	1.4	0.70
33年目	H 41	0.4746	91.3	0.00	0.00	1.4	0.67
34年目	H 42	0.4564	91.3	0.00	0.00	1.4	0.64
35年目	H 43	0.4388	91.3	0.00	0.00	1.4	0.62
36年目	H 44	0.4220	91.3	0.00	0.00	1.4	0.60
37年目	H 45	0.4057	91.3	0.00	0.00	1.4	0.57
38年目	H 46	0.3901	91.3	0.00	0.00	1.4	0.55
39年目	H 47	0.3751	91.3	0.00	0.00	1.4	0.53
40年目	H 48	0.3607	91.3	0.00	0.00	1.4	0.51
41年目	H 49	0.3468	91.3	0.00	0.00	1.4	0.49
42年目	H 50	0.3335	91.3	0.00	0.00	1.4	0.47
43年目	H 51	0.3207	91.3	0.00	0.00	1.4	0.45
44年目	H 52	0.3083	91.3	0.00	0.00	1.4	0.43
45年目	H 53	0.2965	91.3	0.00	0.00	1.4	0.42
46年目	H 54	0.2851	91.3	0.00	0.00	1.4	0.40
47年目	H 55	0.2741	91.3	0.00	0.00	1.4	0.39
48年目	H 56	0.2636	91.3	0.00	0.00	1.4	0.37
49年目	H 57	0.2534	91.3	-113	-29	1.4	0.36
合 計				351	704	65	45
単純事業費計				464		65	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：石川バイパス

年次	年度 (基準年) H 22	総走行台キロの年次別伸び率 (沖縄ブロック)			割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)			合 計 (億円)	
		乗用車類	貨物車類	全 車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値 割引率4%	
供用開始年次	H 8	1.04381	1.00122	1.02971	1.7317	102.3	0.47	0.31	0.17	0.95	1.5	0.05	0.01	0.01	0.07	0.11	0.03	0.05	1.1	1.6	
1年目	H 9	1.06855	0.94522	1.03155	1.6651	103.3	0.49	0.31	0.17	0.97	1.4	0.05	0.01	0.01	0.07	0.10	0.03	0.04	1.1	1.6	
2年目	H 10	1.06855	0.94522	1.03155	1.6010	102.8	0.52	0.29	0.16	0.97	1.4	0.05	0.01	0.01	0.07	0.10	0.03	0.04	1.1	1.5	
3年目	H 11	1.01751	0.99459	1.01174	1.5395	101.3	9.2	4.8	4.9	19	26	0.46	0.23	0.61	1.3	1.8	0.06	0.08	20	28	
4年目	H 12	1.01751	0.99459	1.01174	1.4802	99.7	9.4	4.8	4.9	19	26	0.47	0.23	0.60	1.3	1.8	0.06	0.08	20	28	
5年目	H 13	1.01751	0.99459	1.01174	1.4233	98.4	9.6	4.7	4.9	19	25	0.48	0.23	0.60	1.3	1.7	0.06	0.08	21	27	
6年目	H 14	1.01751	0.99459	1.01174	1.3686	96.6	9.7	4.7	4.8	19	25	0.49	0.23	0.60	1.3	1.7	0.06	0.08	21	27	
7年目	H 15	1.01751	0.99459	1.01174	1.3159	95.4	19.1	8.0	5.9	33	42	1.4	0.46	0.88	2.7	3.4	0.32	0.40	36	45	
8年目	H 16	1.01751	0.99459	1.01174	1.2653	94.4	20.8	8.8	6.8	36	45	1.2	0.42	0.98	2.6	3.2	0.30	0.37	39	48	
9年目	H 17	1.00590	0.99915	1.00440	1.2167	93.2	21.2	8.8	6.8	37	44	1.2	0.41	0.97	2.6	3.1	0.30	0.36	40	47	
10年目	H 18	1.00586	0.99915	1.00438	1.1699	92.5	30.0	12	8.9	51	59	1.7	0.56	1.3	3.6	4.2	0.53	0.61	55	64	
11年目	H 19	1.00583	0.99915	1.00436	1.1249	91.7	30.2	12	8.9	51	58	1.7	0.56	1.3	3.6	4.1	0.53	0.59	56	62	
12年目	H 20	1.00580	0.99915	1.00434	1.0816	91.3	30.4	12	8.9	52	56	1.8	0.56	1.3	3.7	4.0	0.53	0.57	56	60	
13年目	H 21	1.00576	0.99915	1.00432	1.0400	91.3	30.6	12	8.9	52	54	1.8	0.56	1.3	3.7	3.8	0.53	0.55	56	58	
14年目	H 22	1.00573	0.99915	1.00430	1.0000	91.3	30.7	12	8.9	52	52	1.8	0.56	1.3	3.7	3.7	0.53	0.53	56	56	
15年目	H 23	1.00570	0.99914	1.00429	0.9615	91.3	30.9	12	8.9	52	50	1.8	0.56	1.3	3.7	3.5	0.53	0.51	56	54	
16年目	H 24	1.00566	0.99914	1.00427	0.9246	91.3	31.1	12	8.9	52	48	1.8	0.56	1.3	3.7	3.4	0.53	0.49	57	52	
17年目	H 25	1.00563	0.99914	1.00425	0.8890	91.3	31.3	12	8.9	52	47	1.8	0.56	1.3	3.7	3.3	0.53	0.47	57	50	
18年目	H 26	1.00560	0.99914	1.00423	0.8548	91.3	31.5	12	8.9	53	45	1.8	0.56	1.3	3.7	3.2	0.53	0.45	57	49	
19年目	H 27	1.00557	0.99914	1.00421	0.8219	91.3	31.6	12	8.8	53	43	1.8	0.56	1.3	3.7	3.1	0.53	0.44	57	47	
20年目	H 28	1.00554	0.99914	1.00420	0.7903	91.3	31.8	12	8.8	53	42	1.8	0.56	1.3	3.7	3.0	0.53	0.42	57	45	
21年目	H 29	1.00551	0.99914	1.00418	0.7599	91.3	32.0	12	8.8	53	40	1.8	0.56	1.3	3.7	2.8	0.53	0.40	57	44	
22年目	H 30	1.00548	0.99914	1.00416	0.7307	91.3	32.2	12	8.8	53	39	1.9	0.56	1.3	3.8	2.7	0.53	0.39	58	42	
23年目	H 31	1.00545	0.99914	1.00414	0.7026	91.3	32.4	12	8.8	53	38	1.9	0.56	1.3	3.8	2.6	0.53	0.37	58	41	
24年目	H 32	1.00551	1.00114	1.00461	0.6756	91.3	32.5	12	8.8	54	36	1.9	0.56	1.3	3.8	2.6	0.53	0.36	58	39	
25年目	H 33	1.00548	1.00114	1.00459	0.6496	91.3	32.7	12	8.8	54	35	1.9	0.56	1.3	3.8	2.5	0.53	0.34	58	38	
26年目	H 34	1.00545	1.00114	1.00457	0.6246	91.3	32.9	12	8.8	54	34	1.9	0.56	1.3	3.8	2.4	0.53	0.33	58	36	
27年目	H 35	1.00542	1.00114	1.00455	0.6006	91.3	33.1	12	8.8	54	33	1.9	0.56	1.3	3.8	2.3	0.53	0.32	58	35	
28年目	H 36	1.00539	1.00114	1.00453	0.5775	91.3	33.3	12	8.8	54	31	1.9	0.56	1.3	3.8	2.2	0.53	0.31	59	34	
29年目	H 37	1.00537	1.00113	1.00451	0.5553	91.3	33.4	12	8.8	55	30	1.9	0.56	1.3	3.8	2.1	0.53	0.29	59	33	
30年目	H 38	1.00534	1.00113	1.00449	0.5339	91.3	33.6	12	8.9	55	29	1.9	0.56	1.3	3.8	2.0	0.53	0.28	59	32	
31年目	H 39	1.00531	1.00113	1.00447	0.5134	91.3	33.8	12	8.9	55	28	1.9	0.56	1.3	3.8	2.0	0.53	0.27	59	30	
32年目	H 40	1.00528	1.00113	1.00445	0.4936	91.3	34.0	12	8.9	55	27	2.0	0.56	1.3	3.9	1.9	0.53	0.26	60	29	
33年目	H 41	1.00525	1.00113	1.00443	0.4746	91.3	34.2	12.3	8.9	55	26	2.0	0.56	1.3	3.9	1.8	0.53	0.25	60	28	
34年目	H 42	0.99121	0.99661	0.99229	0.4564	91.3	10.6	5.0	8.7	24	11	-0.75	0.12	1.3	0.68	0.31	-0.83	-0.38	24	11	
35年目	H 43	0.99114	0.99660	0.99223	0.4388	91.3	10.5	5.0	8.7	24	11	-0.74	0.12	1.3	0.68	0.30	-0.82	-0.36	24	11	
36年目	H 44	0.99106	0.99659	0.99217	0.4220	91.3	10.4	4.9	8.6	24	10	-0.73	0.12	1.3	0.69	0.29	-0.81	-0.34	24	10	
37年目	H 45	0.99098	0.99658	0.99211	0.4057	91.3	10.3	4.9	8.6	24	9.7	-0.72	0.12	1.3	0.70	0.28	-0.80	-0.32	24	10	
38年目	H 46	0.99089	0.99656	0.99204	0.3901	91.3	10.2	4.9	8.6	24	9.2	-0.71	0.12	1.3	0.71	0.28	-0.79	-0.31	24	9	
39年目	H 47	0.99081	0.99655	0.99198	0.3751	91.3	10.1	4.9	8.5	24	8.8	-0.70	0.12	1.3	0.72	0.27	-0.78	-0.29	23	9	
40年目	H 48	0.99073	0.99654	0.99191	0.3607	91.3	10.0	4.9	8.5	23	8.4	-0.69	0.12	1.3	0.73	0.26	-0.77	-0.28	23	8	
41年目	H 49	0.99064	0.99653	0.99185	0.3468	91.3	9.9	4.8	8.5	23	8.1	-0.68	0.12	1.3	0.74	0.26	-0.76	-0.26	23	8	
42年目	H 50	0.99055	0.99652	0.99178	0.3335	91.3	9.9	4.8	8.4	23	7.7	-0.67	0.12	1.3	0.75	0.25	-0.75	-0.25	23	8	
43年目	H 51	0.99046	0.99650	0.99171	0.3207	91.3	9.8	4.8	8.4	23	7.4	-0.66	0.12	1.3	0.76	0.24	-0.74	-0.24	23	7	
44年目	H 52	0.99037	0.99649	0.99164	0.3083	91.3	9.7	4.8	8.4	23	7.0	-0.65	0.12	1.3	0.77	0.24	-0.73	-0.23	23	7	
45年目	H 53	0.99027	0.99648	0.99157	0.2965	91.3	9.6	4.8	8.4	23	6.7	-0.64	0.12	1.3	0.78	0.23	-0.72	-0.21	23	7	
46年目	H 54	0.99018	0.99647	0.99150	0.2851	91.3	9.5	4.7	8.3	23	6.4	-0.63	0.12	1.3	0.79	0.23	-0.71	-0.20	23	6	
47年目	H 55	0.99008	0.99645	0.99143	0.2741	91.3	9.4	4.7	8.3	22	6.1	-0.62	0.12	1.3	0.80	0.22	-0.70	-0.19	23	6	
48年目	H 56	0.98998	0.99644	0.99135	0.2636	91.3	9.3	4.7	8.3	22	5.9	-0.61	0.12	1.3	0.81	0.21	-0.69	-0.18	22	6	
49年目	H 57	0.98988	0.99643	0.99128	0.2534	91.3	9.2	4.7	8.2	22	5.6	-0.60	0.12	1.3	0.82	0.21	-0.68	-0.17	22	6	
合 計							1,029	418	387	1,834	1,346	39	18	58	115	90	1.9	7.2	1,951	1,443	
