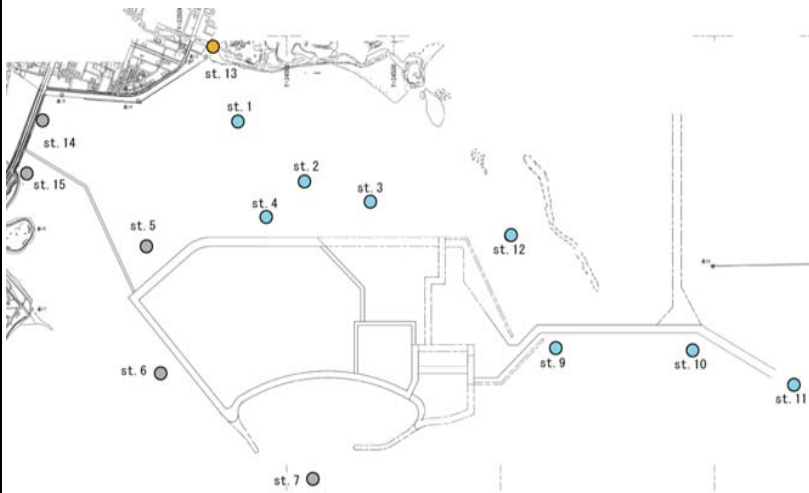


第8回(11月期モニタリング／フィードバック 月例会議)

対象期間: 令和1年11月1日～令和1年11月30日 那覇港湾・空港整備事務所

異常確認の有無		工事との関連性	対策の検討	
目視観察結果	クビレミドロ監視地点及び、工事の濁り監視地点の全てで、監視基準を満足していた。 クビレミドロ監視地点での最大値は11月3日のst.2で5.1mg/Lであった。 工事の濁り監視地点での最大値は11月5日のst.4で4.1mg/Lであった。		今月の県施工事は、県道20号線(泡瀬工区)で、床掘り、コンクリート打設、鋼管杭打設、土留支保工撤去、試験掘削、被覆石撤去、捨石投入、捨石荒投入・均し、グラブ浚渫、揚土、汚濁防止膜設置、被覆ブロック・袋型根固材撤去(陸上・水中)等が行われていたが、施工箇所からの濁りの拡散は確認されなかった。	
	水質調査結果	クビレミドロ監視地点 基準値【st.1～3: SS=7mg/L】	全ての地点で、監視基準(SS=7mg/L)を満足していた。 平均値は2.1mg/L、0.4～5.1mg/Lの範囲で推移していた。	今月の国施工事は、護岸工事及び鉄塔撤去工事で、陸上基礎工(本均し、荒均し)、被覆・根固工(投入、均し)、アスファルト被覆(路盤材、不陸整形、不陸整正)、上部工(止壁、水叩、注入目地)、裏埋材投入・均し、石材撤去、横継材設置、PC撤去、PL溶接、覆工板設置・撤去撤出、PC覆工板撤去、鋼製覆工板撤去、鋼管杭引抜き、支持杭打設、汚濁防止膜橋梁部移設、仮設高欄撤去(ガードレール)、杭穴処理、塊取壊し、運搬処理、鉄塔部撤去、橋梁上部撤去、橋梁杭橋脚撤去、H鋼杭引抜、鋼材運搬が行われていたが、施工箇所からの濁りの拡散は確認されなかった。
		工事の濁り監視地点 基準値【st.4～12: SS=11mg/L】	全ての地点で、監視基準(SS=11mg/L)を満足していた。 平均値は1.1mg/L、0.3～4.1mg/Lの範囲で推移していた。	
		流入部負荷量の調査地点	SS=11mg/Lを超えた回数: st.13=7回(29計測中) SS=50mg/Lを超えた回数: st.13=0回(29計測中) 平均値は8.8mg/L、2.8～21.4mg/Lの範囲で推移していた。	
		流入水路部調査地点(st.13)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。	11/10の21.4mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日0.0mm、前日0.0mm、当日0.0mmであり、降雨による濁り流入もみられなかった。	
基準超過時の気象概況	全ての地点で、監視基準を満足していた。	【調査位置図】 		
基準超過時の工事状況	全ての地点で、監視基準を満足していた。			

第8回(11月期モニタリング／フィードバック 月例会議)

対象期間: 令和元年11月1日～令和元年11月30日 沖縄県調査分

		異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討
目視 観 察 結 果	<p>調査地点の最高値は11月7日(PM)のst.5で観測された6.8mg/Lであった。 期間中は、全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p>			
	水質 調 査 結 果	<p>工事の濁り監視地点基準値【st.5～8: SS=11mg/L】</p> <p>期間中は、全地点で工事監視基準値を満足した。 平均値は2.5mg/L、<1.0～6.8mg/Lの範囲で推移していた。</p>	特になし	
		<p>流入部負荷量の調査地点</p> <p>SS=11mg/Lを超えた回数: st.14=29計測中21回 st.15=29計測中21回</p> <p>SS=50mg/Lを超えた回数: st.14=29計測中0回 st.15=29計測中1回</p>	特になし	
		<p>流入水路部調査地点(st.14、st.15)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。</p> <p>st.14: 11/18 (AM 上げ潮時)41mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日が0.0mm、前日が0.0mm、当日が27.0mmであった。降雨による濁水流入が見られた。 st.15: 11/21 (PM 上げ潮-満潮-下げ潮時)74mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日が0.5mm、前日が0.5mm、当日が3.5mmであった。降雨による濁水流入が見られた。</p>		
基準超過時の気象概況	<p>基準超過時の気象概況は以下の通りであった。</p> <p>全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p>	<p>【調査位置図】</p>		
基準超過時の工事状況	<p>基準超過時の工事内容は以下の通りであった。</p> <p>全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p>			

