
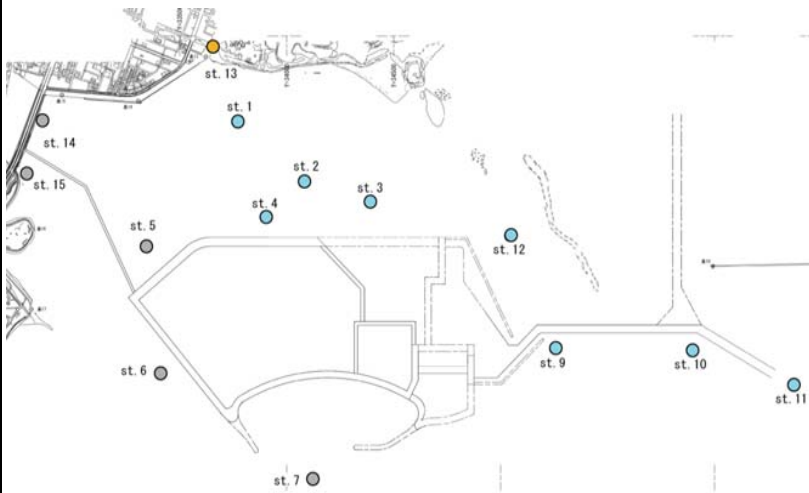



		異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討	
目視観察結果	全ての地点において監視基準値の超過はみられなかった(測定回数27回)。 クビレミドロ監視地点での最大値は10月5日のst.1で4.0mg/Lであった。 工事の濁り監視地点での最大値は10月11日のst.12で6.5mg/Lであった。		今月の県施工事は、養浜整備工事で、汚濁防止膜設置、養浜砂(投入・均し)等が行われていたが、施工箇所からの濁りの拡散は確認されなかった。  今月の国施工事は、泊地浚渫工事で、汚濁防止膜設置等、護岸工事及び橋梁撤去工事で、ブロック据付、基礎捨石(投入・積込)、捨石荒均し、雑石・表面均し、被覆石(積込・投入・均し)、橋梁上部・橋梁杭橋脚補強、仮設高欄・PC覆工板・鋼製覆工版・橋梁上部・橋梁杭橋脚撤去、H鋼杭引抜等が行われていたが、施工箇所からの濁りの拡散は確認されなかった。		
	水質調査結果	クビレミドロ監視地点基準値【st.1～3: SS=7mg/L】			全ての地点で基準値(7mg/L)を満足していた。 平均値は1.9mg/L、0.2～4.0mg/Lの範囲で推移していた。
		工事の濁り監視地点基準値【st.4～12: SS=11mg/L】			全ての地点で、監視基準(SS=11mg/L)を満足していた。 平均値は1.1mg/L、0.2～6.5mg/Lの範囲で推移していた。
		流入部負荷量の調査地点			SS=11mg/Lを超えた回数: st.13=0回(27計測中) SS=50mg/Lを超えた回数: st.13=0回(27計測中) 平均値は3.8mg/L、1.2～9.6mg/Lの範囲で推移していた。
		流入水路部調査地点(st.13)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。			10/13の9.6mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日2.5mm、前日26.5mm、当日4.0mmであった。
基準超過時の気象概況	・全ての地点で、監視基準を満足していた。		【調査位置図】 		
基準超過時の工事状況	・全ての地点で、監視基準を満足していた。				

# 中城湾港環境監視調査

【調査位置図】



## クビレミドロ監視地点

監視基準: st.1~st.3 = 7mg/L

※観測値は、1日1回、上層(水面より90cm)、中層(上下層の中間)、下層(底上20cm)の各値の平均値とした。

※天気・風向・風力は観測時における現地確認とした。

※降水量はアメダス(沖繩市胡里)のデータを用い、24時間(1日)の合計を示した。

※潮は調査時間帯における「上げ潮」、「下げ潮」の状況を示した。また、潮位は中城検潮所における定時観測値を使用した。


※表中の赤色で着色した値は基準値(st.1~3=7mg/L)を超えたことを示す。

※荒天もしくは干潮時等により観測が出来ない場合、工事未実施の場合は欠測とし、表中では「-」で示した。

※「湧り監視調査」は8/9から開始した。

SS(mg/L)観測結果及び降水量(mm)

観測日	10/1(金)	10/2(土)	10/3(日)	10/4(月)	10/5(火)	10/6(水)	10/7(木)	10/8(金)	10/9(土)	10/10(日)	10/11(月)	10/12(火)	10/13(水)	10/14(木)	10/15(金)	10/16(土)	10/17(日)	10/18(月)	10/19(火)	10/20(水)	10/21(木)	10/22(金)	10/23(土)	10/24(日)	10/25(月)	10/26(火)	10/27(水)	10/28(木)	10/29(金)	10/30(土)	10/31(日)	
潮名	長潮	若潮	中潮	中潮	中潮	大潮	大潮	大潮	大潮	中潮	若潮	中潮	中潮	小潮	小潮	小潮	長潮	若潮	中潮	中潮	大潮	大潮	大潮	大潮	中潮	中潮	小潮	小潮	小潮	長潮	若潮	
満潮時刻	16:15	16:50	17:19	17:47	18:15	6:21	7:03	7:47	8:32	9:22	10:18	11:31	13:14	14:58	16:01	16:42	17:16	17:45	5:52	6:29	7:03	7:37	8:10	8:45	9:21	10:03	10:57	12:17	14:01	15:12	15:55	
干潮時刻	8:53	9:57	10:43	11:22	11:59	12:34	13:09	13:45	14:22	15:00	15:42	16:36	18:09	7:21	8:55	10:02	10:50	11:28	12:02	12:31	12:59	13:23	13:52	14:19	14:47	15:19	16:00	17:12	6:20	7:53	9:05	
天気	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	-	曇	雨	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	-	晴	晴	晴	晴	-	-	-
風向	N	NNE	NE	E	E	E	S	E	ENE	-	E	SE	E	ESE	ESE	N	NNE	N	NNE	NE	S	N	N	-	NNW	N	N	N	N	-	-	
風力	4	3	4	4	3	4	3	4	5	-	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	2	4	4	-	2	3	3	3	2	-	-	
降水量(mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.0	22.0	0.0	0.5	1.0	2.5	26.5	4.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	-	上げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	-	下げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	下げ潮	-	-	
潮位(cm)	163	163	156	142	122	100	81	71	74	88	110	134	154	168	172	168	157	142	126	112	101	95	93	96	102	112	124	138	152	163	171	
st.1	3.1	2.7	3.5	2.4	4.0	3.8	1.0	1.0	0.9	-	2.5	2.8	1.6	2.3	2.6	2.6	2.3	2.9	3.0	3.1	1.7	1.3	0.8	-	1.6	0.3	0.4	1.8	2.3	-	-	
st.2	3.5	3.3	3.9	2.4	3.5	2.9	0.5	0.6	1.4	-	2.7	3.3	2.3	2.7	2.3	2.3	2.0	3.0	3.2	3.2	1.9	0.4	0.3	-	0.9	1.0	0.3	1.9	2.2	-	-	
st.3	3.0	1.7	2.3	1.4	2.1	0.9	0.3	1.1	1.1	-	3.0	3.1	2.3	2.0	1.1	1.5	1.8	3.0	1.6	1.2	1.2	0.7	0.3	-	0.2	0.3	0.3	1.5	1.5	-	-	

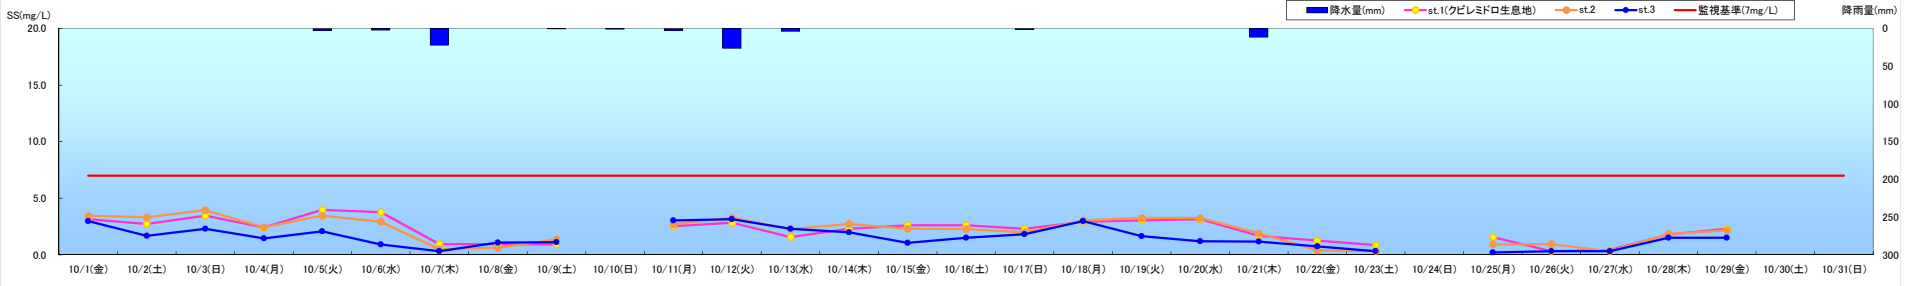

国	観測地点 (±1.0m) 波浪工事	基礎捨石投入・積込		ブロック据付		捨石荒均し		被覆石積込		被覆石投入・均し		汚濁防止膜設置		汚濁防止膜設置		汚濁防止膜設置			
		橋梁/仮橋工事	基礎捨石投入・積込	基礎捨石投入・積込	基礎捨石投入・積込	基礎捨石投入・積込	基礎捨石投入・積込	基礎捨石投入・積込	基礎捨石投入・積込	基礎捨石投入・積込	基礎捨石投入・積込	基礎捨石投入・積込	基礎捨石投入・積込	汚濁防止膜設置	汚濁防止膜設置	汚濁防止膜設置	汚濁防止膜設置	汚濁防止膜設置	汚濁防止膜設置
県	橋梁/仮橋工事	橋梁上部・橋梁杭橋脚補強	橋梁杭橋脚補強	橋梁杭橋脚補強	橋梁杭橋脚補強	橋梁杭橋脚補強	橋梁杭橋脚補強	橋梁杭橋脚補強	橋梁杭橋脚補強	橋梁杭橋脚補強	橋梁杭橋脚補強	橋梁杭橋脚補強	汚濁防止膜設置	汚濁防止膜設置	汚濁防止膜設置	汚濁防止膜設置	汚濁防止膜設置		
		橋梁杭橋脚撤去	PC覆工板・鋼製覆工板・橋梁上部・橋梁杭橋脚撤去	PC覆工板・鋼製覆工板・橋梁上部・橋梁杭橋脚撤去	PC覆工板・鋼製覆工板・橋梁上部・橋梁杭橋脚撤去	PC覆工板・鋼製覆工板・橋梁上部・橋梁杭橋脚撤去	PC覆工板・鋼製覆工板・橋梁上部・橋梁杭橋脚撤去	PC覆工板・鋼製覆工板・橋梁上部・橋梁杭橋脚撤去	PC覆工板・鋼製覆工板・橋梁上部・橋梁杭橋脚撤去	PC覆工板・鋼製覆工板・橋梁上部・橋梁杭橋脚撤去	PC覆工板・鋼製覆工板・橋梁上部・橋梁杭橋脚撤去	PC覆工板・鋼製覆工板・橋梁上部・橋梁杭橋脚撤去	汚濁防止膜設置	汚濁防止膜設置	汚濁防止膜設置	汚濁防止膜設置	汚濁防止膜設置		
県	養浜工事															汚濁防止膜設置	汚濁防止膜設置	養浜砂投入・均し	
																汚濁防止膜設置	汚濁防止膜設置	養浜砂投入・均し	
県	護岸/防波堤工事															汚濁防止膜設置	汚濁防止膜設置	消波ブロック据付	消波ブロック据付
																汚濁防止膜設置	汚濁防止膜設置	消波ブロック据付	消波ブロック据付






第7回(10月期モニタリング／フィードバック 月例会議)

対象期間: 令和3年10月1日～令和3年10月31日

沖縄県調査分

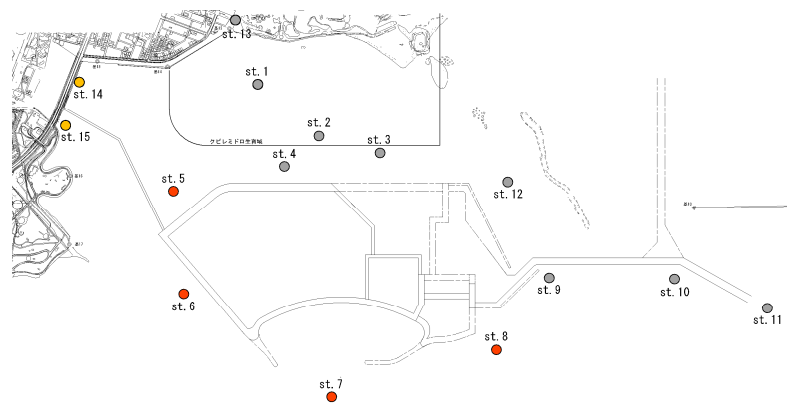		異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討
目視 観察 結果	<p>調査地点の最高値は10月13日(PM)のst.5で観測された10.6mg/Lであった。 期間中は、全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p>			
	水質 調査 結果	<p>工事の濁り監視地点基準値【st.5～8: SS=11mg/L】</p> <p>期間中は、全地点で工事監視基準値を満足した。 平均値は2.9mg/L、&lt;1.0～10.6mg/Lの範囲で推移していた。</p>	特になし	
		<p>流入部負荷量の調査地点</p> <p>SS=11mg/Lを超えた回数: st.14=27計測中23回 st.15=27計測中22回</p> <p>SS=50mg/Lを超えた回数: st.14=27計測中4回 st.15=27計測中0回</p>	特になし	
		<p>流入水路部調査地点(st.14、st.15)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。</p> <p>st.14: 10/3 (PM 上げ潮時)78mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日が0.0mm、前日が0.0mm、当日が0.0mmであった。濁りの滞留が見られた。 st.15: 10/4 (PM 上げ潮時)38mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日が0.0mm、前日が0.0mm、当日が0.0mmであった。濁りの滞留が見られた。</p>		
基準超過時の気象概況	<p>基準超過時の気象概況は以下の通りであった。</p> <p>全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p>	<p>【調査位置図】</p> 		
基準超過時の工事状況	<p>基準超過時の工事内容は以下の通りであった。</p> <p>全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p>			



