
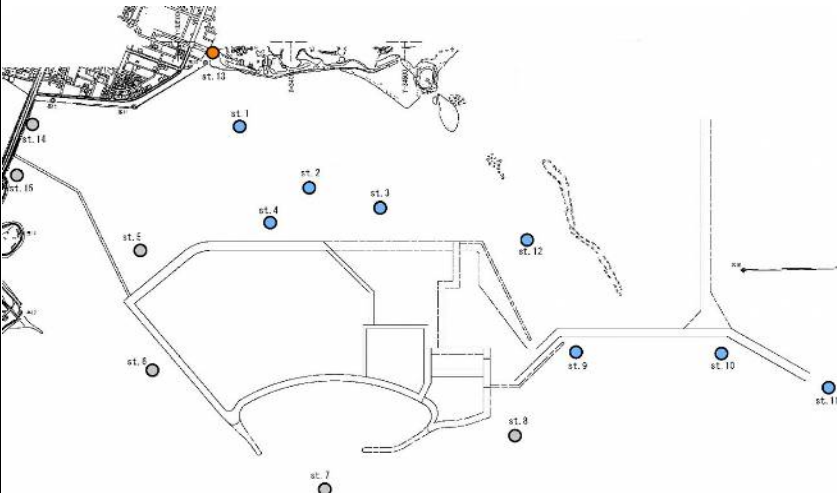


		異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討	
目視観察結果	<p>クビレミドロ監視地点及び、工事の濁り監視地点の全てで、監視基準を満足していた。 クビレミドロ監視地点での最大値は10月5日のst.2で5.4mg/Lであった。 工事の濁り監視地点での最大値は10月6日のst.4で5.3mg/Lであった。</p>		<p>今月の国施工工事は、浚渫工事及び護岸工事で、泊地浚渫、揚土、潜水探査、基礎工、被覆・根固め工、上部工、裏込・裏埋工、築堤工等が行われていたが、施工箇所からの濁りの拡散は確認されなかった。</p>		
	水質調査結果	<p>クビレミドロ監視地点基準値 【st.1～3: SS=7mg/L】</p>			<p>全ての地点で、監視基準(SS=7mg/L)を満足していた。 平均値は2.6mg/L、&lt;1.0～5.4mg/Lの範囲で推移していた。</p>
		<p>工事の濁り監視地点基準値【st.4～12: SS=11mg/L】</p>			<p>全ての地点で、監視基準(SS=11mg/L)を満足していた。 平均値は1.5mg/L、&lt;1.0～5.3mg/Lの範囲で推移していた。</p>
		<p>流入部負荷量の調査地点</p>			<p>SS=11mg/Lを超えた回数: st.13=8回(22計測中) SS=50mg/Lを超えた回数: st.13=0回(22計測中) 平均値は11.5mg/L、3.8～36.8mg/Lの範囲で推移していた。</p>
	<p>流入水路部調査地点(st.13)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。</p>	<p>10/4の36.8mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日0.0mm、前日0.0mm、当日5.5mmであり、降雨による濁水流入もみられなかった</p>			
基準超過時の気象概況	<p>・全ての地点で、監視基準を満足していた。</p>		<p>【調査位置図】</p> 		
	基準超過時の工事状況	<p>全ての地点で、監視基準を満足していた。</p>			

中城湾環境監視調査

【調査位置図】



クビレミドロ監視地点

監視基準: st.1~st.3 = 7mg/L

※観測値は、1日1回、上層(水面より50cm)、中層(上下層の間)、下層(底上20cm)の各層の平均値とした。

※天気・風向・風力は観測時における現地確認とした。

※降水量はアメダス(沖縄市胡座)のデータを用い、24時間(1日)の合計を示した。

※潮は調査時間等における「上げ潮」、「下げ潮」の状況を示した。また、潮位は中城検潮所における定時観測値を使用した。

※表中の赤色で着色した値は基準値(st.1~3=7mg/L)を超えたことを示す。


※荒天もしくは干潮時等により観測が出来ない場合、工事未実施の場合は欠測とし、表中では「-」で示した。

※「濁り監視調査」は8/1から開始した。

SS(mg/L)観測結果及び降水量(mm)

観測日	10/1(土)	10/2(日)	10/3(月)	10/4(火)	10/5(水)	10/6(木)	10/7(金)	10/8(土)	10/9(日)	10/10(月)	10/11(火)	10/12(水)	10/13(木)	10/14(金)	10/15(土)	10/16(日)	10/17(月)	10/18(火)	10/19(水)	10/20(木)	10/21(金)	10/22(土)	10/23(日)	10/24(月)	10/25(火)	10/26(水)	10/27(木)	10/28(金)	10/29(土)	10/30(日)	10/31(月)	
潮名	中潮	小潮	小潮	小潮	長潮	若潮	中潮	中潮	大潮	大潮	大潮	大潮	中潮	中潮	中潮	小潮	小潮	小潮	長潮	若潮	中潮	中潮	大潮	大潮	大潮	大潮	中潮	中潮	中潮	中潮	小潮	
満潮時刻	10:18	11:30	13:24	15:17	16:18	16:59	17:33	18:02	18:31	18:58	7:27	8:05	8:43	9:22	10:05	10:59	12:20	14:23	15:38	16:17	16:45	17:10	5:15	5:53	6:31	7:11	7:52	8:37	9:26	10:24	11:41	
干潮時刻	15:43	16:33	18:03	7:32	9:09	10:15	11:04	11:44	12:20	12:52	13:24	13:53	14:21	14:49	15:15	15:50	5:04	19:40	8:03	9:18	10:09	10:48	11:23	11:56	12:28	13:01	13:35	14:11	14:51	15:37	4:27	
天気	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	-	-	-	晴	曇	曇	曇	晴	-	-	曇	曇	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	-	-	-
風向	-	-	E	S	E	NE	N	-	-	-	NE	NE	NE	E	-	-	ESE	N	N	ENE	E	NW	N	N	E	E	ENE	E	-	-	-	
風力	-	-	3	1~2	3	3	3~4	-	-	-	4	4	4	4	-	-	3	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	-	-	-	
降水量(mm)	0.0	0.0	0.0	5.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.0	0.0	0.0	57.0	5.5	0.0	0.0	19.0	14.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	96.0	
潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	上げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	下げ潮	上げ潮	
潮位(cm)	183	158	155	169	173	166	151	168	97	129	157	176	185	183	172	156	135	151	159	164	163	158	70	87	112	141	168	185	188	176	151	
st.1	-	-	3.1	3.5	4.1	5.2	4.7	-	-	-	2.2	1.3	2.6	2.3	-	-	2.3	3.8	2.1	3.3	3.4	3.0	2.0	3.5	1.8	<1.1	1.9	1.5	-	-	-	
st.2	-	-	2.8	3.4	5.4	4.4	5.2	-	-	-	1.5	1.9	2.0	2.4	-	-	2.5	4.5	3.4	3.4	2.6	3.6	2.0	2.2	1.2	<1.0	1.6	1.4	-	-	-	
st.3	-	-	2.0	2.4	2.8	2.3	2.4	-	-	-	1.8	1.9	1.6	1.8	-	-	3.2	4.6	2.8	2.2	2.2	3.7	2.1	1.6	1.4	<1.0	1.5	1.1	-	-	-	


SS(mg/L)



項目	10/1(土) - 10/8(土)								10/9(日) - 10/16(日)								10/17(月) - 10/24(月)								10/25(火) - 10/31(月)							
	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	
国	航路治地 (+11.0m) 護岸工事			治地浚渫					治地浚渫							治地浚渫	汚濁防止工 管理	治地浚渫	土運船運搬 掘削	治地浚渫						汚濁防止工 カーン巻上げ						汚濁防止工 管理
				土運船運搬 揚土					土運船運搬 揚土							土運船運搬 揚土	海上工事 荒天中止	土運船運搬 揚土	荒天中止	土運船運搬 揚土						荒天中止						海上工事 荒天中止
				深浅測量	潜水探査				潜水探査							潜水探査		潜水探査		潜水探査												
県	護岸工事 橋脚改良工事			基礎工(1-3護岸)掃石投入均し					被覆・根固め工(1-3護岸)掃石投入均し								被覆・根固め工(1-3護岸)掃石投入均し		汚濁防止工撤去						築堤工(手護岸)掃石投入均し						築堤工(手護岸) 掃石投入均し	
				上部工(1-3護岸)舗装止					上部工(1-3護岸)舗装止め						上部工(1-3護岸)水印巻		上部工(1-3護岸)舗装止め								裏込・裏埋工(1-3護岸)裏埋材投入均し							
				裏込・裏埋工(1-3護岸)裏埋材投入均し					裏込・裏埋工(1-3護岸)裏埋材投入均し						裏込・裏埋工(1-3護岸)裏埋材投入均し		裏込・裏埋工(1-3護岸)裏埋材投入均し								裏込・裏埋工(1-3護岸)裏埋材投入均し							
橋梁/仮橋 積工事																																
養浜 工事																																
護岸/防波 堤工事																																



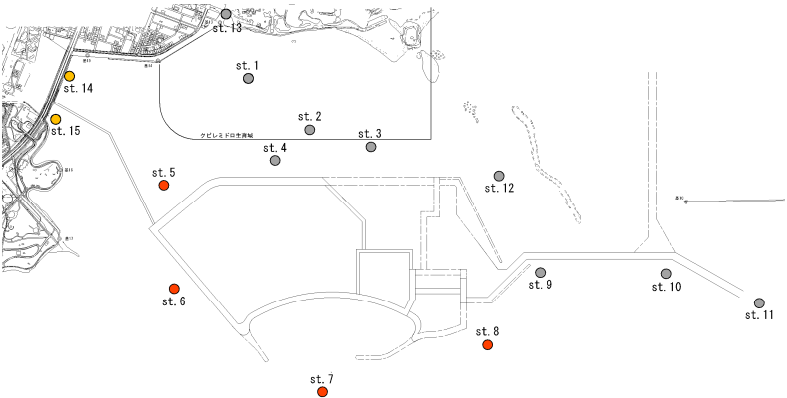

		異常確認の有無	工事との関連性	対策の検討
目視観察結果	<p>調査地点の最高値は10月13日(PM)のst.5で観測された9.6mg/Lであった。 期間中は、全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p>			
	水質調査結果	<p>工事の濁り監視地点基準値 【st.5～8: SS=11mg/L】</p> <p>期間中は、全地点で工事監視基準値を満足した。 平均値は3.0mg/L、&lt;1.0～9.6mg/Lの範囲で推移していた。</p>	特になし	
		<p>流入部負荷量の調査地点</p> <p>SS=11mg/Lを超えた回数: st.14=22計測中21回 st.15=22計測中20回</p> <p>SS=50mg/Lを超えた回数: st.14=22計測中4回 st.15=22計測中0回</p>	特になし	
		<p>流入水路部調査地点(st.14、st.15)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。</p> <p>st.14:10/6 (PM 上げ潮時)132mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日が5.5mm、前日が2.5mm、当日が0.0mmであった。潮流・風浪による底質の巻き上げが見られた。 st.15:10/22 (PM 上げ潮時)37mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日が0.0mm、前日が19.0mm、当日が14.5mmであった。降雨による濁水が見られた。</p>		
基準超過時の気象概況	<p>基準超過時の気象概況は以下の通りであった。</p> <p>全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p>		<p>【調査位置図】</p> 	
基準超過時の工事状況	<p>基準超過時の工事内容は以下の通りであった。</p> <p>全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p>			



