


| | | 異常確認の有無 | 工事との関連性 | 対策の検討 | | | | | |
|---|---|--|---|-------|---------------------------------|---|----------------------------------|--|-------------|
| 目視観察結果 | <p>クビレミドロ監視地点及び、工事の濁り監視地点の全てで、監視基準を満足していた。 クビレミドロ監視地点での最大値は1月22日のst.2、3で1.4mg/Lであった。 工事の濁り監視地点での最大値は1月18日のst.9で<1.0mg/Lであった。</p> | | <p>今月の国施工工事は、泊地浚渫、土運船運搬、揚土潜水探査等が行われていたが、施工箇所からの濁りの拡散は確認されなかった。</p> | | | | | | |
| | 水質調査結果 | <table border="1"> <tr> <td>クビレミドロ監視地点基準値【st.1～3: SS=7mg/L】</td> <td> <p>全ての地点で、監視基準(SS=7mg/L)を満足していた。 平均値は0.3mg/L、0.2～1.4mg/Lの範囲で推移していた。</p> </td> </tr> <tr> <td>工事の濁り監視地点基準値【st.4～12: SS=11mg/L】</td> <td> <p>全ての地点で、監視基準(SS=11mg/L)を満足していた。 平均値は0.2mg/L、0.2～1.0mg/Lの範囲で推移していた。</p> </td> </tr> <tr> <td>流入部負荷量の調査地点</td> <td> <p>SS=11mg/Lを超えた回数: st.13=1回(22計測中) SS=50mg/Lを超えた回数: st.13=0回(22計測中) 平均値は3.9mg/L、0.7～14.3mg/Lの範囲で推移していた。</p> </td> </tr> <tr> <td>流入水路部調査地点(st.13)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。</td> <td> <p>1/21の14.3mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日0.0mm、前日0.0mm、当日11.5mmであった。</p> </td> </tr> </table> | | | クビレミドロ監視地点基準値【st.1～3: SS=7mg/L】 | <p>全ての地点で、監視基準(SS=7mg/L)を満足していた。 平均値は0.3mg/L、0.2～1.4mg/Lの範囲で推移していた。</p> | 工事の濁り監視地点基準値【st.4～12: SS=11mg/L】 | <p>全ての地点で、監視基準(SS=11mg/L)を満足していた。 平均値は0.2mg/L、0.2～1.0mg/Lの範囲で推移していた。</p> | 流入部負荷量の調査地点 |
| クビレミドロ監視地点基準値【st.1～3: SS=7mg/L】 | <p>全ての地点で、監視基準(SS=7mg/L)を満足していた。 平均値は0.3mg/L、0.2～1.4mg/Lの範囲で推移していた。</p> | | | | | | | | |
| 工事の濁り監視地点基準値【st.4～12: SS=11mg/L】 | <p>全ての地点で、監視基準(SS=11mg/L)を満足していた。 平均値は0.2mg/L、0.2～1.0mg/Lの範囲で推移していた。</p> | | | | | | | | |
| 流入部負荷量の調査地点 | <p>SS=11mg/Lを超えた回数: st.13=1回(22計測中) SS=50mg/Lを超えた回数: st.13=0回(22計測中) 平均値は3.9mg/L、0.7～14.3mg/Lの範囲で推移していた。</p> | | | | | | | | |
| 流入水路部調査地点(st.13)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。 | <p>1/21の14.3mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は前々日0.0mm、前日0.0mm、当日11.5mmであった。</p> | | | | | | | | |
| 基準超過時の気象概況 | <p>全ての地点で、監視基準を満足していた。</p> | | <p>【調査位置図】</p>  | | | | | | |
| 基準超過時の工事状況 | <p>全ての地点で、監視基準を満足していた。</p> | | | | | | | | |

| | | 異常確認の有無 | 工事との関連性 | 対策の検討 |
|----------------|--|--|--------------------------|-------|
| 目視 観察 結果 | <p>調査地点の最高値は1月18日(PM)、22日(PM)のst.5で観測された2.6mg/Lであった。 期間中は、全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p> | | <p>工事に伴う濁りは確認されなかった。</p> | |
| | 水質 調査 結果 | <p>工事の濁り監視地点基準値 【st.5～8: SS=11mg/L】</p> <p>期間中は、全地点で工事監視基準値を満足した。 平均値は1.1 mg/L、<1.0～2.6 mg/Lの範囲で推移していた。</p> | <p>特になし</p> | |
| | | <p>流入部負荷量の調査地点</p> <p>SS=11 mg/Lを超えた回数: st.14 = 22計測中2回 st.15 = 22計測中0回</p> <p>SS=50 mg/Lを超えた回数: st.14 = 22計測中2回 st.15 = 22計測中0回</p> | <p>特になし</p> | |
| | | <p>流入水路部調査地点(st.14、st.15)は監視地点ではないため、基準値は設定されていない。</p> <p>st.14: 1/17 (AM 上げ潮時) 64 mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は調査前々日0.0mm、前日0.0mm、当日0.0mmであった。(気象庁・胡屋)</p> <p>st.15: 1/19 (PM 下げ潮時) 11 mg/Lが最大値であった。 なお、降水量は調査前々日0.0mm、前日0.0mm、当日0.0mmであった。(気象庁・胡屋)</p> | <p>—</p> | |
| 基準超過時の 気象概況 | <p>全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p> | | <p>【調査位置図】</p> | |
| 基準超過時の 工事状況 | <p>全ての調査地点において工事監視基準値を満足していた。</p> | | | |

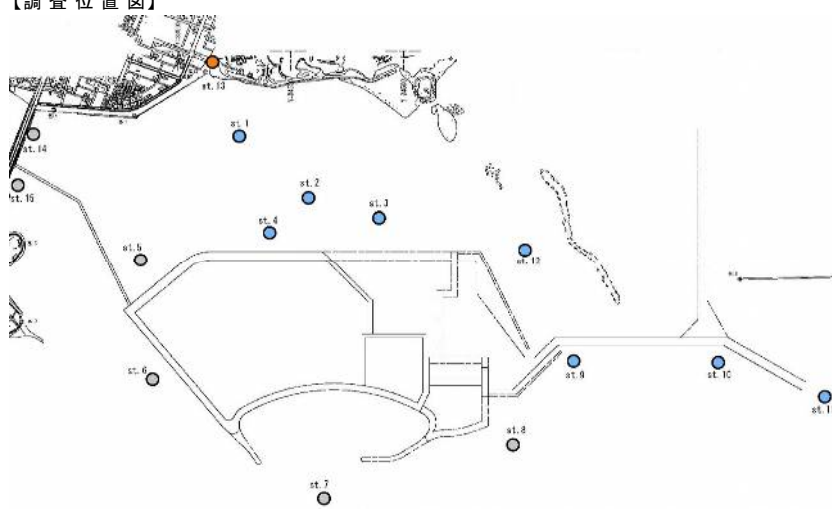
