


## 平成19年度事業の実施状況

平成19年度までに第 区域96haのうち、約70ha(余水吐含む)の護岸等を締め切る予定

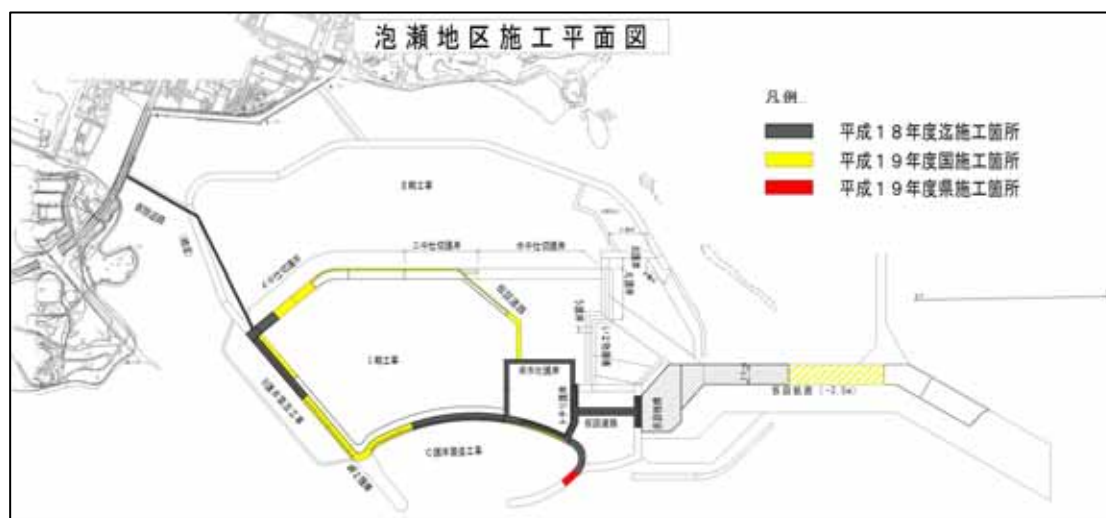

## 平成20年度工事の実施について

平成20年度工事計画については、平成20年度予算が確定するのにあわせて調整中です。これまで4～7月の期間は、「トカゲハゼ保全計画(平成7年、沖縄県)」を遵守し、トカゲハゼに影響のあるような海上工事を中止しておりましたが、工事の進捗に伴い、平成20年度よりトカゲハゼに影響のない工事が実施可能になってきました。よって、平成20年度は、トカゲハゼに影響のない工事については年度当初より実施する予定です。

なお、工事の実施に際しては、これまで同様、汚濁防止対策を施し工事から発生する周辺環境への影響を少なくするよう努めてまいります。
