


一般国道58号 沖縄県国頭村 与那 災害復旧工事の状況について

被災：令和6年11月9日



復旧工事
・伐採工 : $A = 196\text{m}^2$
・モルタル吹付工 : $A = 196\text{m}^2$
・大型土のう撤去 : $N = 20\text{袋}$

令和6年11月9日(土)～10日(日)の沖縄本島北部豪雨により、国道58号国頭村与那地区の道路法面において、土砂崩れが発生しました。応急対策工として、大型土のうによる土留めを行っています。現在、モルタル吹付工の準備として、樹木の伐採、堆積した土砂の撤去を行っております。

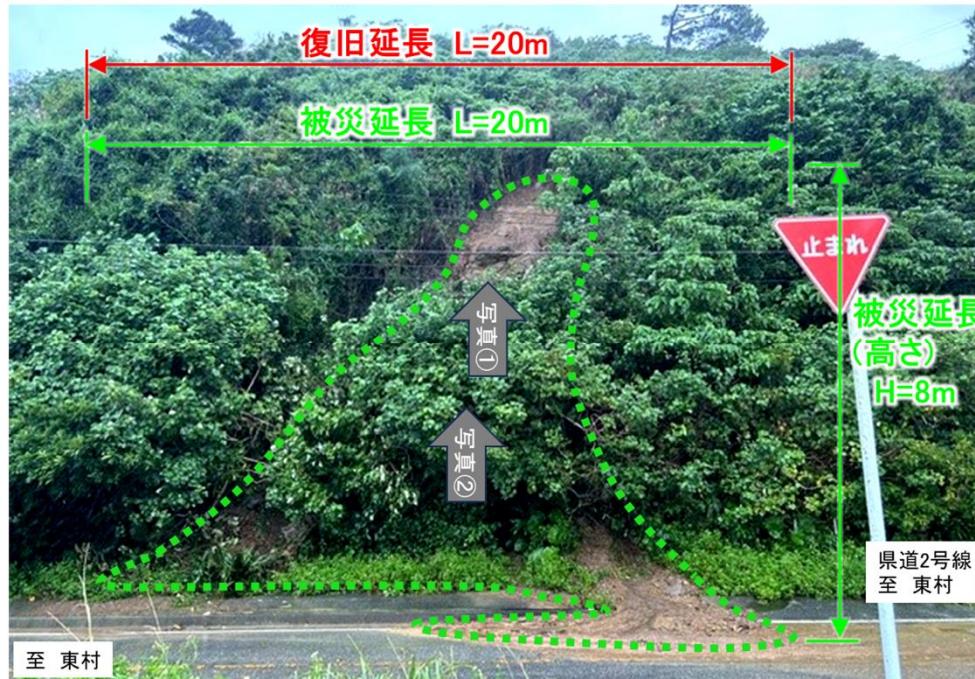

復旧工施工状況写真 令和8年1月13日 工事進捗率: 10% 主な作業: 応急対策工維持管理

