北部国道事務所管内図

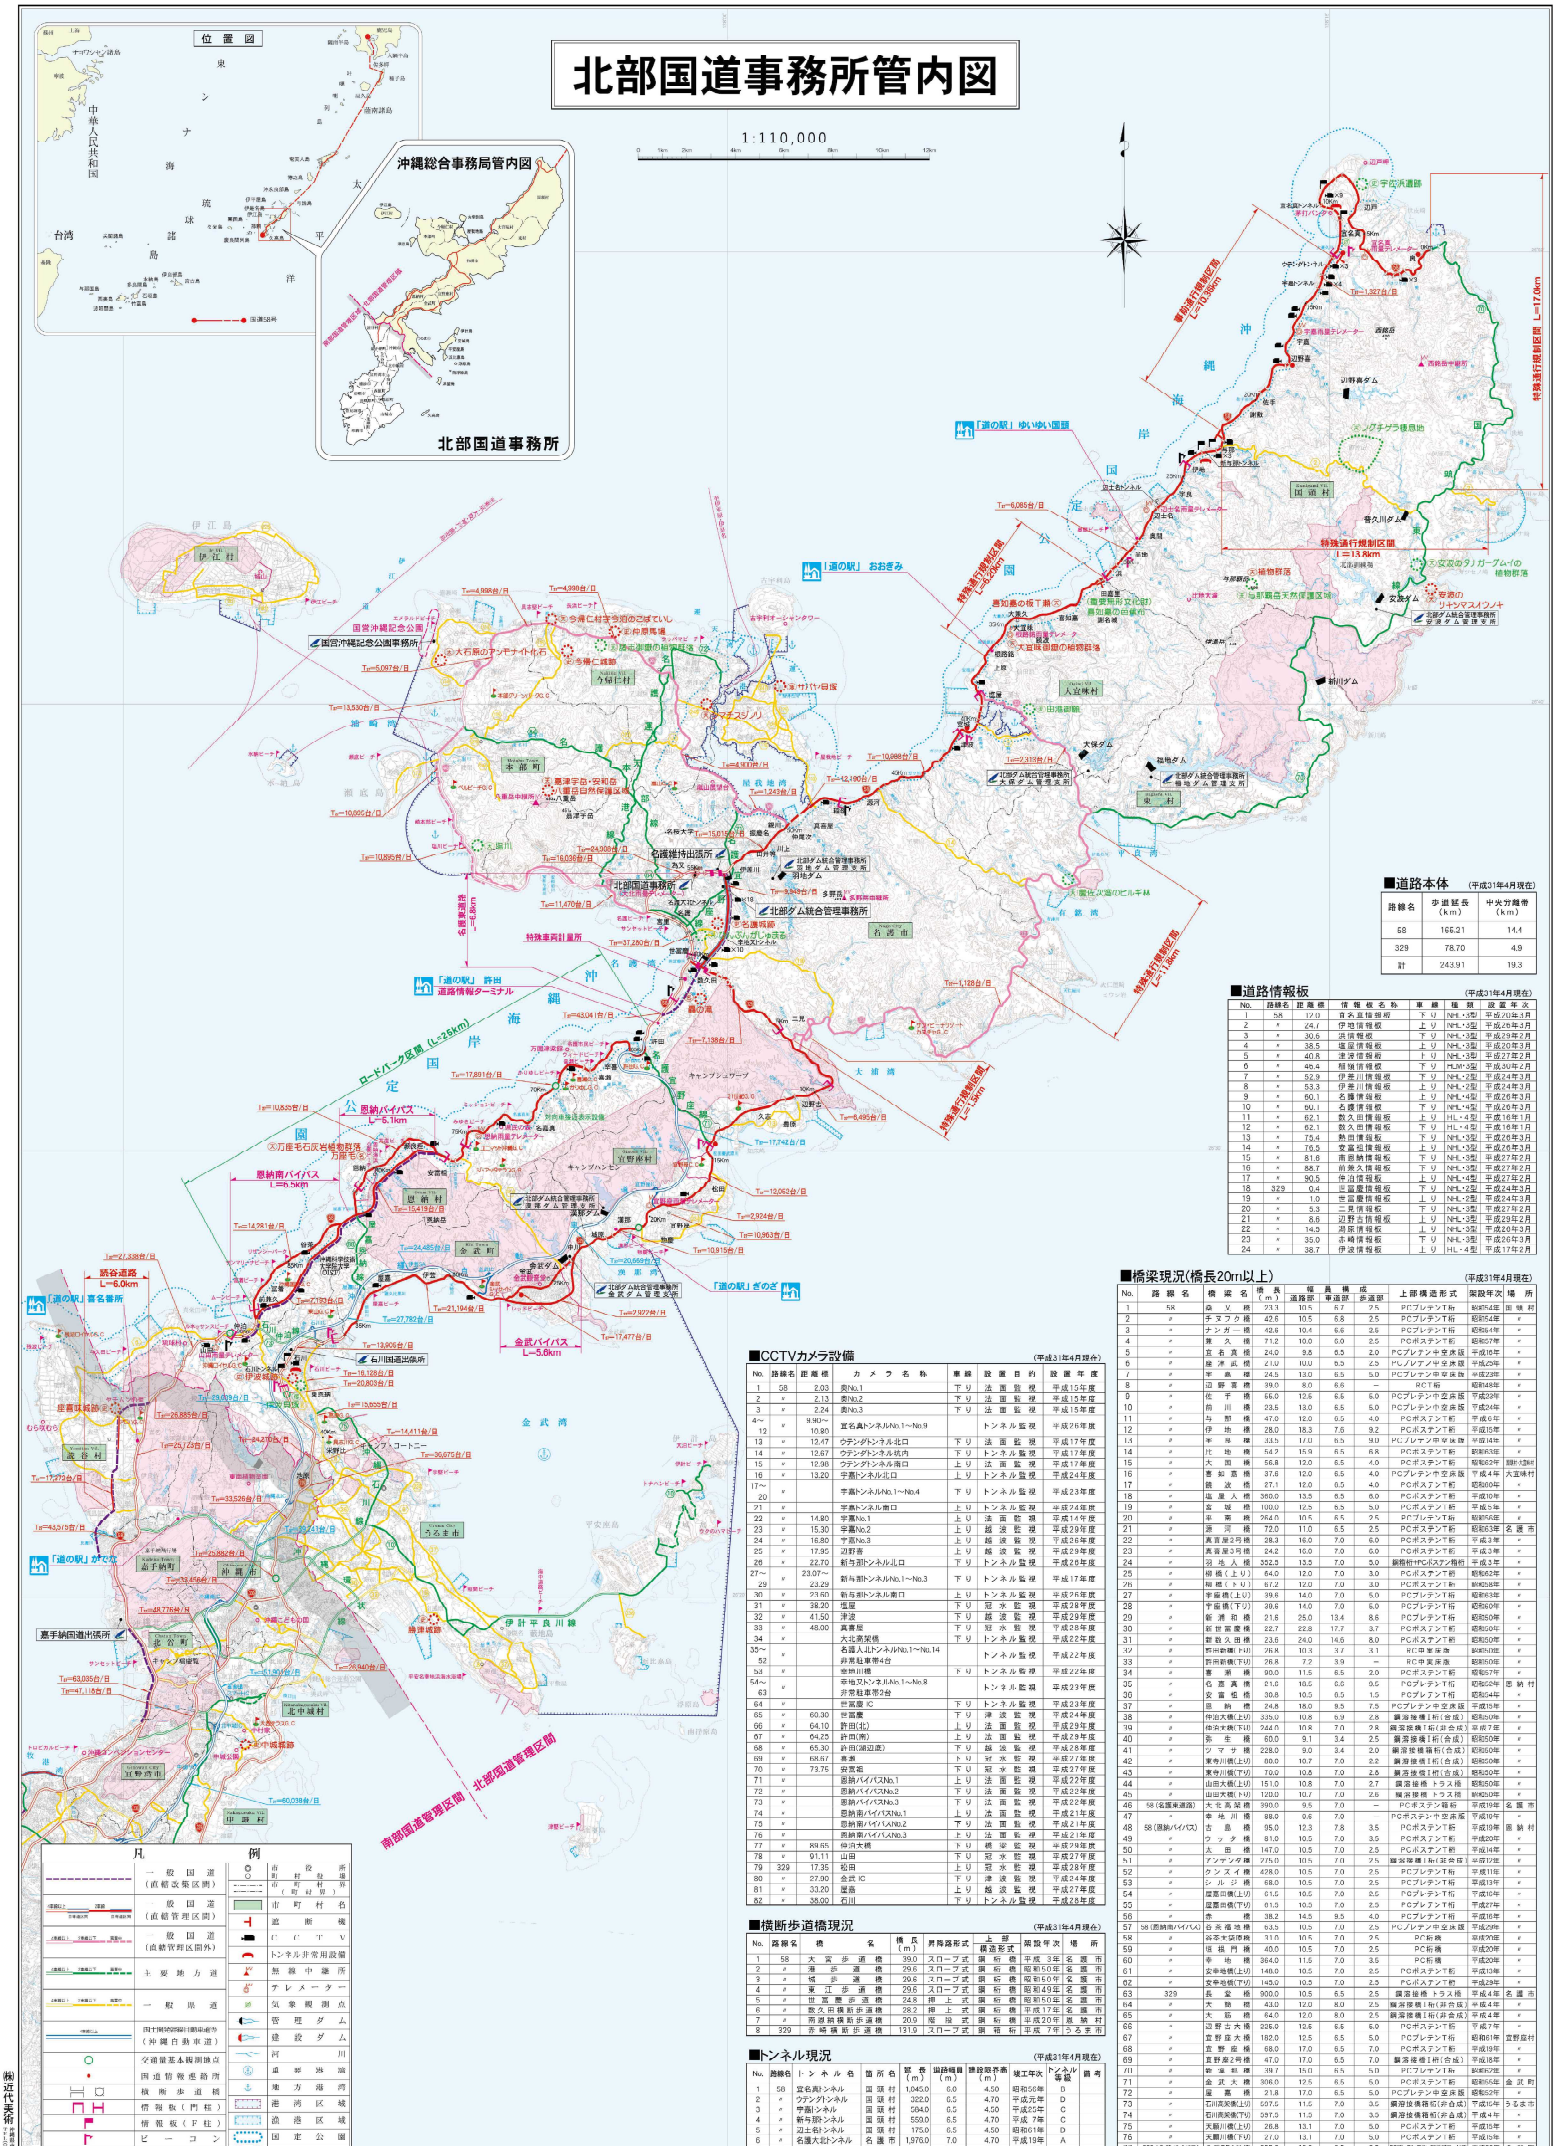

■道路本体 (平成31年4月現在)

路線名	歩道延長(km)	中央分離帯(km)
58	166.21	14.4
329	78.70	4.9
計	243.91	19.3

■道路情報板 (平成31年4月現在)

No.	路線名	距離標	情報板名称	車線	種類	設置年次
1	58	17.0	百名直接情報	下り	NHL-3型	平成20年3月
2	〃	26.1	伊地頃情報	上り	NHL-3型	平成26年3月
3	〃	30.6	浜情報	下り	NHL-3型	平成29年2月
4	〃	38.5	塩屋情報	上り	NHL-3型	平成20年3月
5	〃	40.8	津波情報	下り	NHL-3型	平成27年2月
6	〃	49.4	相場情報	下り	PLMV-3型	平成30年2月
7	〃	52.9	伊差川情報	下り	NHL-2型	平成24年3月
8	〃	53.3	伊差川情報	上り	NHL-2型	平成24年3月
9	〃	60.1	名護庁舎	上り	NHL-4型	平成26年3月
10	〃	60.1	名護庁舎	下り	NHL-4型	平成26年3月
11	〃	62.1	数久田情報	上り	HL-4型	平成16年1月
12	〃	62.1	数久田情報	下り	HL-4型	平成16年1月
13	〃	75.4	熱田情報	下り	NHL-3型	平成27年2月
14	〃	76.5	安富祖情報	上り	NHL-3型	平成26年3月
15	〃	81.6	南恩納情報	下り	NHL-3型	平成27年2月
16	〃	86.7	前兼久情報	下り	NHL-3型	平成27年2月
17	〃	90.5	伊江情報	上り	NHL-4型	平成27年2月
18	329	0.4	宜蘭情報	下り	NHL-2型	平成24年3月
19	〃	1.0	宜蘭情報	上り	NHL-2型	平成24年3月
20	〃	5.3	二見情報	下り	NHL-3型	平成27年2月
21	〃	8.6	辺野古情報	上り	NHL-3型	平成29年2月
22	〃	14.3	潟原情報	上り	NHL-3型	平成20年3月
23	〃	35.0	赤崎情報	下り	NHL-3型	平成26年3月
24	〃	38.7	伊波情報	上り	HL-4型	平成17年2月

■橋梁現況(橋長20m以上) (平成31年4月現在)

No.	路線名	橋梁名	橋長(m)	幅員構成 道路部	幅員構成 車道部	幅員構成 歩道部	上部構造形式	架設年次	場所
1	58	桑久川橋	213.1	10.5	6.7	2.5	PCプレテンT桁	昭和54年	国頭村
2	〃	チヌウラ橋	42.6	10.5	6.8	2.5	PCプレテンT桁	昭和54年	〃
3	〃	ナンガー橋	42.6	10.4	6.6	2.6	PCプレテンT桁	昭和54年	〃
4	〃	兼久橋	71.2	10.0	6.0	2.5	PC桁ポステンT桁	昭和57年	〃
5	〃	宜名真橋	24.0	9.5	6.5	2.0	PCプレテンT中空床版	平成18年	〃
6	〃	楚洲武橋	41.0	10.0	6.0	2.5	PCレゾルアンド中空床版	平成20年	〃
7	〃	平良橋	24.5	13.0	6.5	5.0	PCプレテンT中空床版	平成23年	〃
8	〃	辺野喜橋	39.0	8.0	6.6	—	RCT桁	昭和48年	〃
9	〃	佐手橋	66.0	12.6	6.6	6.0	PCプレテンT中空床版	平成33年	〃
10	〃	前川橋	73.5	13.0	6.5	6.0	PCプレテンT中空床版	平成34年	〃
11	〃	与那橋	47.0	12.0	6.5	4.0	PC桁ポステンT桁	平成45年	〃
12	〃	伊地橋	28.0	18.3	7.6	9.2	PC桁ポステンT桁	平成15年	〃
13	〃	米那橋	33.5	17.0	6.5	9.0	PCレゾルアンド中空床版	平成14年	〃
14	〃	比地橋	54.7	15.9	6.5	6.8	PC桁ポステンT桁	昭和63年	〃
15	〃	大国橋	56.8	12.0	6.5	4.0	PC桁ポステンT桁	昭和62年	期待工事中
16	〃	恩納高橋	37.6	12.0	6.5	4.0	PCプレテンT中空床版	平成4年	大宜味村
17	〃	鏡波橋	27.1	12.0	6.5	4.0	PC桁ポステンT桁	昭和60年	〃
18	〃	塩屋入橋	360.0	13.5	6.5	6.0	PC桁ポステンT桁	平成10年	〃
19	〃	宜味橋	100.0	12.5	6.5	5.0	PC桁ポステンT桁	平成5年	〃
20	〃	新里橋	264.0	10.5	6.5	2.5	PCプレテンT桁	昭和55年	〃
21	〃	源河橋	72.0	11.0	6.5	2.5	PC桁ポステンT桁	昭和63年	名護市
22	〃	真喜屋2号橋	38.3	16.0	7.0	6.0	PC桁ポステンT桁	平成3年	〃
23	〃	真喜屋3号橋	24.2	16.0	7.0	6.0	PC桁ポステンT桁	平成3年	〃
24	〃	羽地入橋	352.5	13.0	7.0	5.0	鋼箱桁+PC床スラ橋桁	平成3年	〃
25	〃	仲橋(上り)	64.0	12.0	7.0	3.0	PC桁ポステンT桁	昭和62年	〃
26	〃	仲橋(下り)	67.2	12.0	7.0	3.0	PC桁ポステンT桁	昭和58年	〃
27	〃	宇座橋(上り)	39.8	14.0	7.0	5.0	PCプレテンT桁	昭和63年	〃
28	〃	宇座橋(下り)	39.6	14.0	7.0	5.0	PCプレテンT桁	昭和60年	〃
29	〃	新酒和橋	21.6	25.0	13.4	8.6	PCプレテンT桁	昭和50年	〃
30	〃	新世富橋	22.7	22.8	17.7	3.7	PC桁ポステンT桁	昭和50年	〃
31	〃	野嘉久田橋	23.6	24.0	14.6	8.0	PC桁ポステンT桁	昭和50年	〃
32	〃	野川前橋(上り)	26.8	10.3	3.7	3.1	RC中空床版	昭和51年	〃
33	〃	野川前橋(下り)	26.8	7.2	3.9	—	RC中空床版	昭和50年	〃
34	〃	喜瀬橋	90.0	11.5	6.5	2.0	PC桁ポステンT桁	昭和57年	〃
35	〃	名護高橋	21.0	10.5	6.0	0.0	PC桁ポステンT桁	昭和54年	恩納村
36	〃	安富祖橋	30.8	10.5	6.5	1.5	PCプレテンT桁	昭和44年	〃
37	〃	恩納橋	24.8	18.0	9.5	7.5	PCプレテンT中空床版	平成15年	〃
38	〃	仲泊大橋(上り)	335.0	10.8	6.9	2.8	鋼箱桁橋+桁(合成)	昭和51年	〃
39	〃	仲泊大橋(下り)	344.0	10.8	7.0	2.8	鋼箱桁橋+桁(非合成)	昭和47年	〃
40	〃	弥生橋	60.0	9.1	3.4	2.5	鋼箱桁橋+桁(合成)	昭和50年	〃
41	〃	ツマサ橋	228.0	9.0	3.4	2.0	鋼箱桁橋+桁(合成)	昭和50年	〃
42	〃	東ゆり橋(上り)	60.0	10.7	7.0	2.2	鋼箱桁橋+桁(合成)	昭和50年	〃
43	〃	東ゆり橋(下り)	70.0	10.8	7.0	2.8	鋼箱桁橋+桁(合成)	昭和50年	〃
44	〃	山田大橋(上り)	151.0	10.8	7.0	2.7	鋼箱桁橋+トラス橋	昭和50年	〃
45	〃	山田大橋(下り)	120.0	10.7	7.0	2.6	鋼箱桁橋+トラス橋	昭和50年	〃
46	58(名護東道路)	大北高架橋	390.0	9.5	7.0	—	PC桁ポステン箱桁	平成19年	名護市
47	〃	幸地川橋	98.0	9.6	7.0	—	PC桁ポステン中空床版	平成19年	〃
48	58(恩納バイパス)	古島橋	95.0	12.3	7.8	3.5	PC桁ポステンT桁	平成18年	恩納村
49	〃	ウッタ橋	81.0	10.5	7.0	3.5	PC桁ポステンT桁	平成20年	〃
50	〃	太田橋	147.0	10.5	7.0	2.5	PC桁ポステンT桁	平成14年	〃
51	〃	アンマンク橋	275.0	10.5	7.0	2.5	鋼箱桁橋+桁(非合成)	平成17年	〃
52	〃	クンスイ橋	478.0	10.5	7.0	2.5	PCプレテンT桁	平成11年	〃
53	〃	シルジ橋	68.0	10.5	7.0	2.5	PCプレテンT桁	平成13年	〃
54	〃	屋慶名橋(上り)	61.5	10.5	7.0	2.5	PCプレテンT桁	平成16年	〃
55	〃	屋慶名橋(下り)	61.3	10.5	7.0	2.5	PCプレテンT桁	平成27年	〃
56	〃	赤橋	38.2	14.5	9.5	4.0	PCプレテンT桁	平成16年	〃
57	58(恩納南バイパス)	谷茶橋地橋	63.5	10.5	7.0	2.5	PCプレテンT中空床版	平成29年	〃
58	〃	谷茶中島橋	31.0	10.5	7.0	2.5	PC桁橋	平成20年	〃
59	〃	恩納門橋	40.0	10.5	7.0	2.5	PC桁橋	平成20年	〃
60	〃	幸地橋	364.0	11.5	7.0	3.5	PC桁橋	平成20年	〃
61	〃	安幸地橋(上り)	148.0	10.5	7.0	2.5	PC桁ポステンT桁	平成13年	〃
62	〃	安幸地橋(下り)	143.0	10.5	7.0	2.5	PC桁ポステンT桁	平成23年	〃
63	329	長堂橋	300.0	10.5	6.5	2.5	鋼箱桁橋+トラス橋	平成4年	名護市
64	〃	大熱橋	43.0	12.0	8.0	2.5	鋼箱桁橋+桁(非合成)	平成4年	〃
65	〃	大筋橋	64.0	12.0	8.0	2.5	鋼箱桁橋+桁(非合成)	平成4年	〃
66	〃	辺野古大橋	226.0	12.6	6.6	6.0	PC桁ポステンT桁	平成7年	〃
67	〃	宜野座大橋	162.0	12.5	6.5	5.0	PCプレテンT桁	昭和61年	宜野座村
68	〃	宜野座橋	68.0	17.0	6.5	7.0	PC桁ポステンT桁	平成19年	〃
69	〃	宜野座2号橋	47.0	17.0	6.5	7.0	鋼箱桁橋+桁(合成)	平成18年	〃
70	〃	新里橋	39.7	15.0	8.5	5.0	PCプレテンT桁	昭和57年	〃
71	〃	金武大橋	306.0	12.5	6.5	5.0	PC桁ポステンT桁	平成8年	金武町
72	〃	屋慶橋	21.8	17.0	6.5	5.0	PCプレテンT中空床版	昭和52年	〃
73	〃	石川高架橋(上り)	507.5	11.5	7.0	3.0	鋼箱桁橋+桁(非合成)	平成14年	うるま市
74	〃	石川高架橋(下り)	597.3	11.5	7.0	3.0	鋼箱桁橋+桁(非合成)	平成14年	〃
75	〃	天願川橋(上り)	26.8	13.1	7.0	5.0	PC桁ポステンT桁	平成15年	〃
76	〃	天願川橋(下り)	27.0	13.1	7.0	5.0	PC桁ポステンT桁	平成15年	〃
77	329(金武バイパス)	金武BP2号橋	255.0	10.0	6.5	2.5	PCプレテン箱桁橋+PC床版	平成30年	金武町
78	〃	金武BP2号橋	431.0	10.0	6.5	2.5	PC桁ポステンT桁	平成30年	〃
79	〃	金武BP3号橋	42.0	18.0	6.4	8.0	PCプレテンT桁	平成11年	〃

■CCTVカメラ設備 (平成31年4月現在)

No.	路線名	距離標	カメラ名称	車線	設置目的	設置年度
1	58	2.03	奥No.1	下り	法面監視	平成15年度
2	〃	2.13	奥No.2	下り	法面監視	平成15年度
3	〃	2.25	奥No.3	下り	法面監視	平成15年度
4～12	〃	8.180～10.980	宜名真トンネルNo.1～No.9	トンネル監視		平成26年度
13	〃	12.47	ウテンダトンネル北口	下り	法面監視	平成17年度
14	〃	12.67	ウテンダトンネル坑内	下り	トンネル監視	平成17年度
15	〃	12.96	ウテンダトンネル南口	上り	法面監視	平成17年度
16	〃	13.20	宇嘉トンネル北口	上り	トンネル監視	平成24年度
17～20	〃	〃	宇嘉トンネルNo.1～No.4	下り	トンネル監視	平成23年度
21	〃	〃	宇嘉トンネル南口	上り	トンネル監視	平成24年度
22	〃	14.90	宇嘉No.1	上り	法面監視	平成14年度
23	〃	15.30	宇嘉No.2	上り	越波監視	平成29年度
24	〃	16.80	宇嘉No.3	上り	越波監視	平成26年度
25	〃	17.95	辺野喜	上り	越波監視	平成29年度
26	〃	22.70	新与那トンネル北口	下り	トンネル監視	平成26年度
27～29	〃	23.07～23.29	新与那トンネルNo.1～No.3	下り	トンネル監視	平成17年度
30	〃	23.60	新与那トンネル南口	上り	トンネル監視	平成26年度
31	〃	39.20	恒屋	下り	冠水監視	平成28年度
32	〃	41.50	津波	下り	越波監視	平成29年度
33	〃	48.00	真喜屋	下り	冠水監視	平成28年度
34	〃		大北高架橋	下り	トンネル監視	平成22年度
35～52	〃		名護入北トンネルNo.1～No.14 非常駐車帯4台		トンネル監視	平成22年度
53	〃		幸地川橋	下り	トンネル監視	平成22年度
54～63	〃		幸地北トンネルNo.1～No.8 非常駐車帯2台		トンネル監視	平成23年度
64	〃		世冨慶IC	下り	トンネル監視	平成23年度
65	〃	60.30	世冨慶	下り	冠水監視	平成24年度
66	〃	64.10	許田(北)	上り	法面監視	平成29年度
67	〃	64.25	許田(南)	上り	法面監視	平成29年度
68	〃	65.30	許田(浦近底)	下り	越波監視	平成28年度
69	〃	68.67	喜瀬	下り	冠水監視	平成27年度
70	〃	73.75	安富祖	下り	冠水監視	平成27年度
71	〃		恩納バイパスNo.1	上り	法面監視	平成22年度
72	〃		恩納バイパスNo.2	下り	法面監視	平成22年度
73	〃		恩納バイパスNo.3	下り	法面監視	平成22年度
74	〃		恩納南バイパスNo.1	上り	法面監視	平成21年度
75	〃		恩納南バイパスNo.2	下り	法面監視	平成21年度
76	〃		恩納南バイパスNo.3	上り	法面監視	平成21年度
77	〃	R8.65	仲泊大橋	上り	橋梁監視	平成29年度
78	〃	91.11	山田	下り	冠水監視	平成27年度
79	329	17.35	松田	上り	冠水監視	平成28年度
80	〃	27.90	金武IC	下り	津波監視	平成24年度
81	〃	33.20	屋嘉	上り	越波監視	平成27年度
82	〃	38.00	石川	下り	トンネル監視	平成28年度

■横断歩道橋現況 (平成31年4月現在)

No.	路線名	橋名	橋長(m)	昇降路形式 上部構造形式	下部構造形式	架設年次	場所
1	58	大宜歩道橋	39.0	スロープ式	鋼板橋	平成3年	名護市
2	〃	港歩道橋	29.6	スロープ式	鋼板橋	昭和60年	名護市
3	〃	城歩道橋	29.6	スロープ式	鋼板橋	昭和60年	名護市
4	〃	東江歩道橋	29.6	スロープ式	鋼板橋	昭和49年	名護市
5	〃	世冨慶歩道橋	24.8	押上式	鋼板橋	昭和50年	名護市
6	〃	数久田横断歩道橋	28.2	押上式	鋼板橋	平成17年	名護市
7	〃	南恩納横断歩道橋	20.0	階段式	鋼板橋	平成20年	恩納村
8	329	赤崎横断歩道橋	131.9	スロープ式	鋼箱桁	平成7年	うるま市

■トンネル現況 (平成31年4月現在)

No.	路線名	トンネル名	所在地	延長(m)	幅員(m)	建設断面(m)	竣工年次	トンネル等級	備考
1	58	宜名真トンネル	国頭村	1,045.0	6.0	4.50	昭和56年	D	
2	〃	ウテンダトンネル	国頭村	322.0	6.5	4.70	平成元年	D	
3	〃	宇嘉トンネル	国頭村	594.0	6.5	4.50	平成23年	C	
4	〃	新与那トンネル	国頭村	553.0	6.5	4.70	平成7年	C	
5	〃	辺土名トンネル	国頭村	175.0	6.5	4.50	昭和61年	D	
6	〃	名護大北トンネル	名護市	1,976.0	7.0	4.70	平成19年	A	
7	〃	幸地川トンネル	名護市	1,170.0	7.0	4.70	平成22年	A	
8	329	石川トンネル(下り)	うるま市	165.0	7.0	4.70	平成6年	C	
9	〃	石川トンネル(上り)	うるま市	165.0	7.0	4.70	平成6年	C	

(株)近代美術 〒102-0073 東京都千代田区九段南1-5-6 ☎03-3511-2731

(この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行のカシミール3を使用して作成したものである。(承認番号 平元情整、第181号))

令和元年5月印刷
