北部国道事務所管内図

令和3年5月印刷

1:110,000

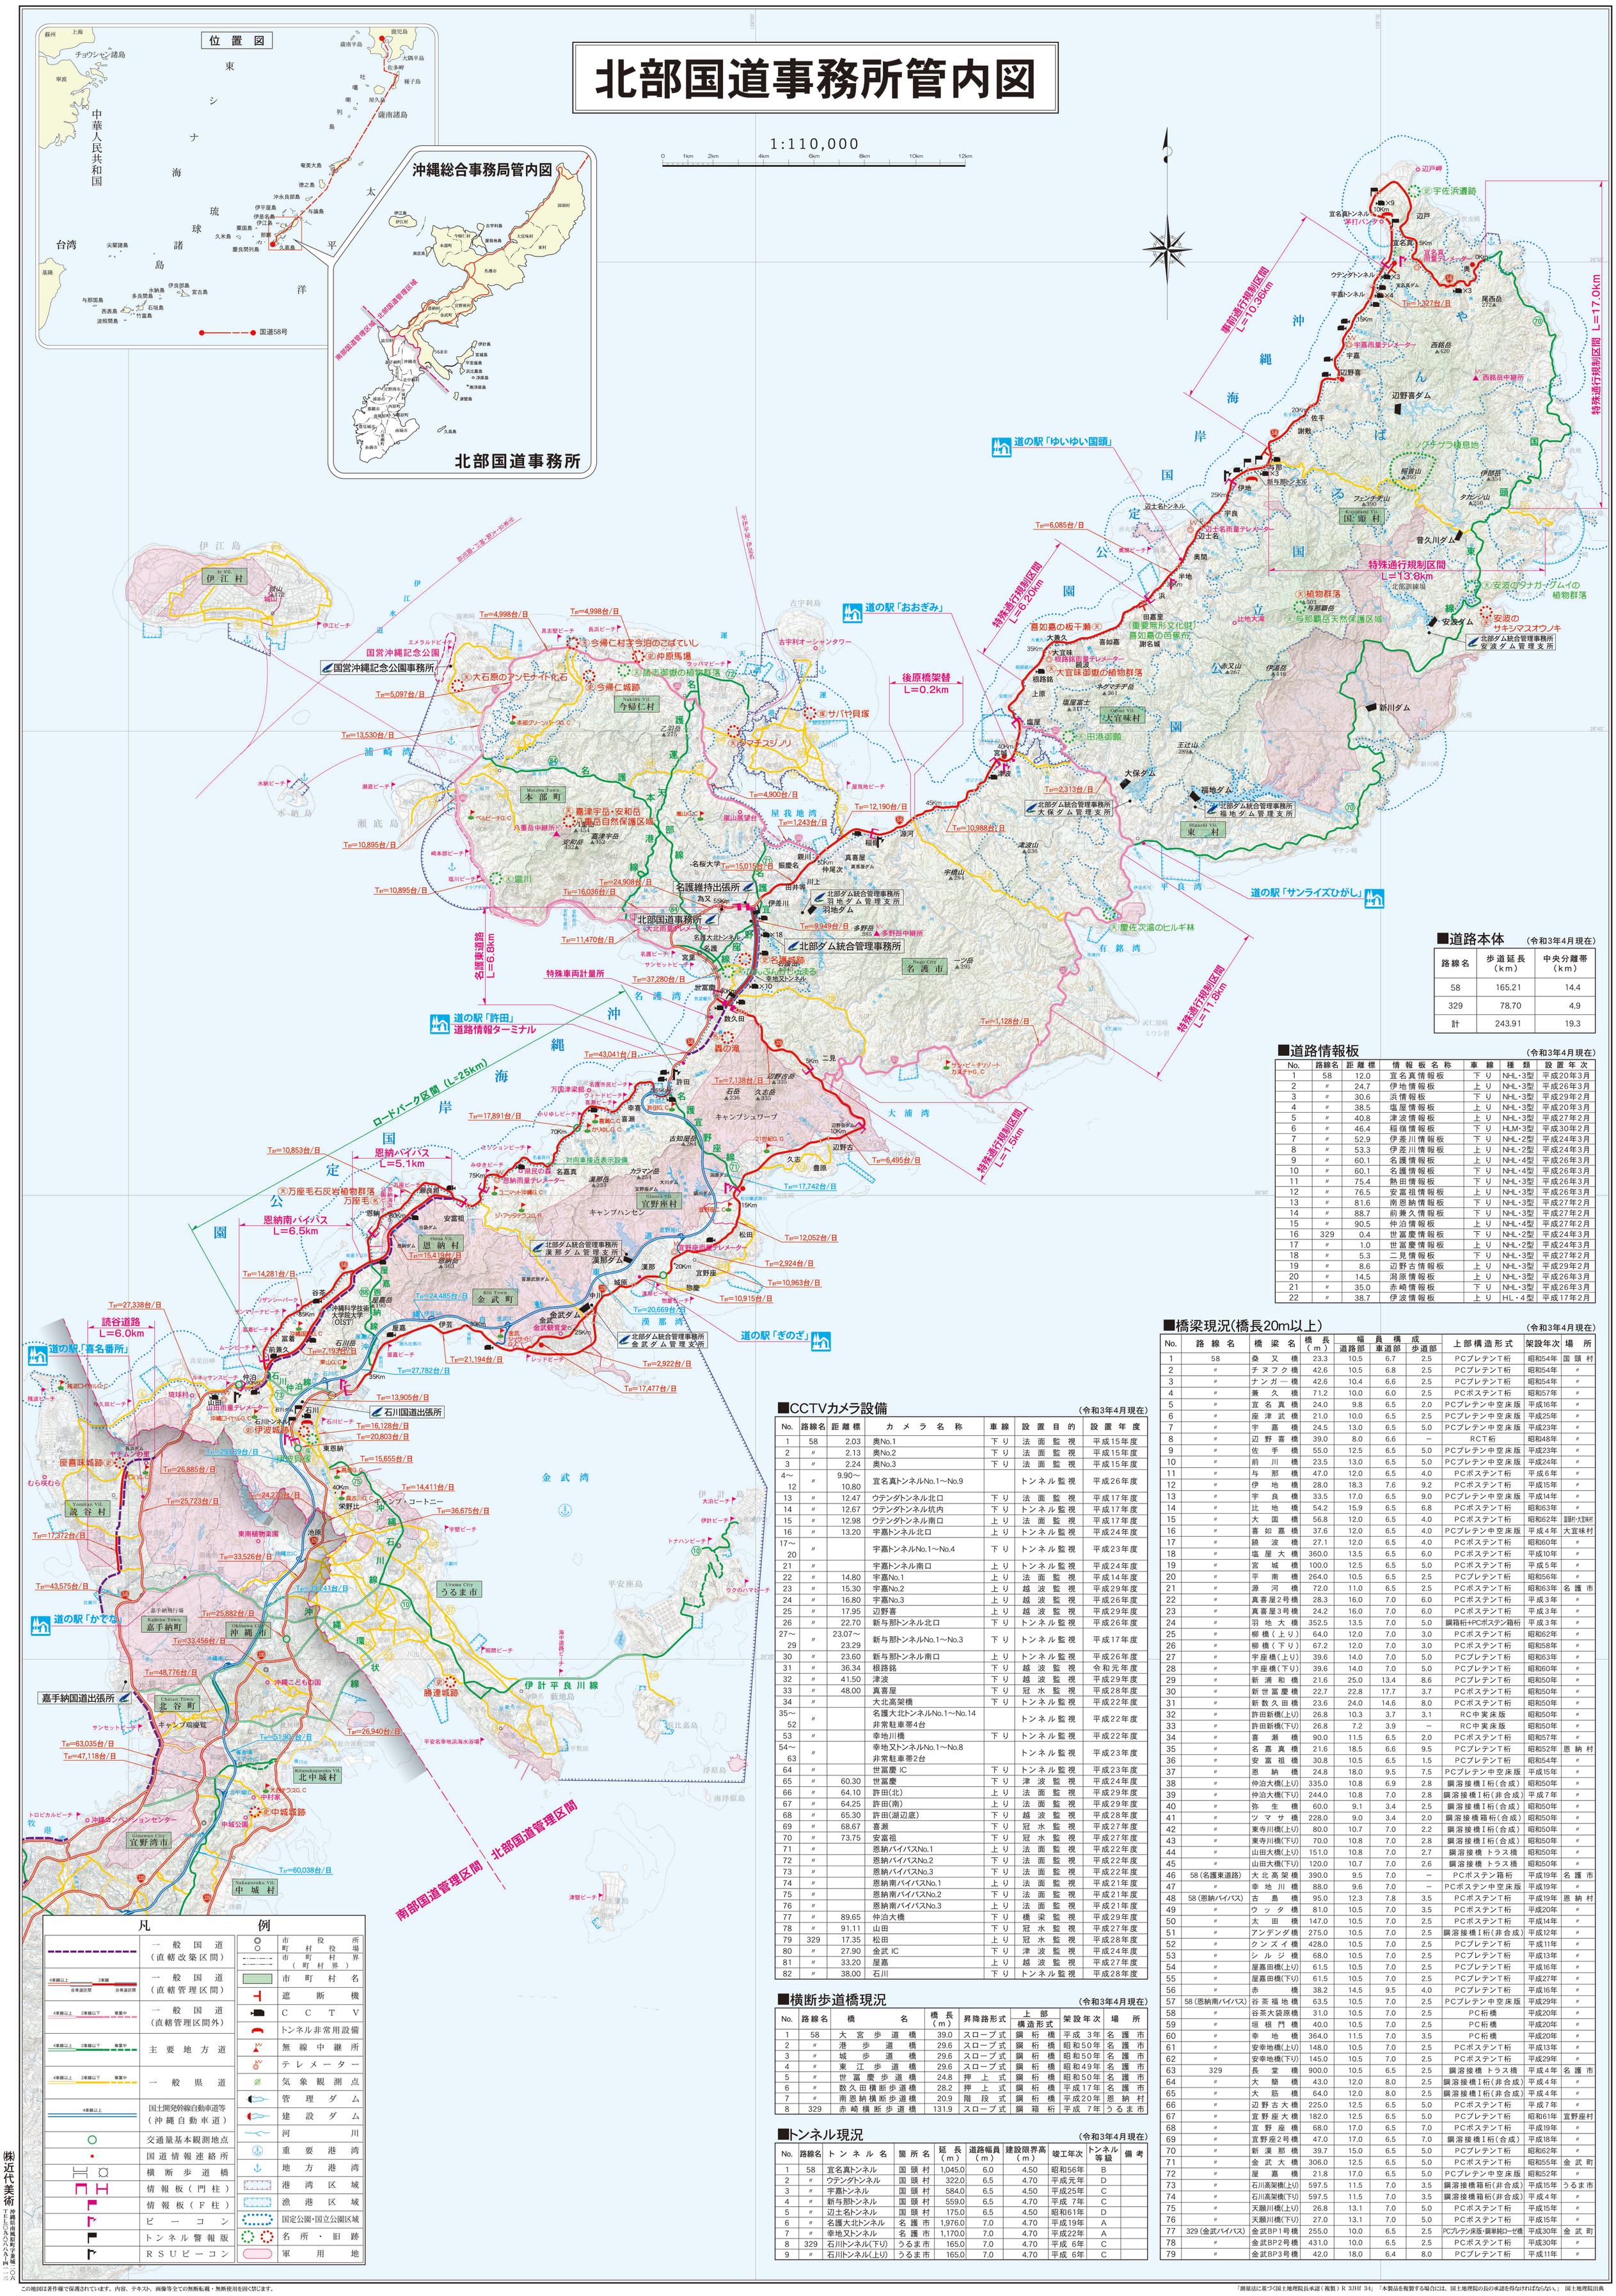

■道路本体

（令和3年4月現在）

路線名	歩道延長（km）	中央分離帯（km）
58	165.21	14.4
329	78.70	4.9
計	243.91	19.3

■道路情報板

（令和3年4月現在）

No.	路線名	距離標	情報板名称	車線	種類	設置年次
1	58	12.0	宜名真情報板	下り	NHL・3型	平成20年3月
2	〃	24.7	伊地情報板	上り	NHL・3型	平成26年3月
3	〃	30.6	浜情報板	下り	NHL・3型	平成29年2月
4	〃	38.5	塩屋情報板	上り	NHL・3型	平成20年3月
5	〃	40.8	津波情報板	上り	NHL・3型	平成27年2月
6	〃	46.4	稲嶺情報板	下り	HLM・3型	平成30年2月
7	〃	52.9	伊差川情報板	下り	NHL・2型	平成24年3月
8	〃	53.3	伊差川情報板	上り	NHL・2型	平成24年3月
9	〃	60.1	名護情報板	上り	NHL・4型	平成26年3月
10	〃	60.1	名護情報板	下り	NHL・4型	平成26年3月
11	〃	75.4	熟田情報板	下り	NHL・3型	平成26年3月
12	〃	76.5	安富祖情報板	上り	NHL・3型	平成26年3月
13	〃	81.6	南恩納情報板	下り	NHL・3型	平成27年2月
14	〃	88.7	前兼久情報板	下り	NHL・3型	平成27年2月
15	〃	90.5	仲泊情報板	上り	NHL・4型	平成27年2月
16	329	0.4	世冨慶情報板	下り	NHL・2型	平成24年3月
17	〃	1.0	世冨慶情報板	上り	NHL・2型	平成24年3月
18	〃	5.3	二見情報板	下り	NHL・3型	平成27年2月
19	〃	8.6	辺野古情報板	上り	NHL・3型	平成29年2月
20	〃	14.5	潟原情報板	上り	NHL・3型	平成26年3月
21	〃	35.0	赤崎情報板	下り	NHL・3型	平成26年3月
22	〃	38.7	伊波情報板	上り	HL・4型	平成17年2月

■CCTVカメラ設備

（令和3年4月現在）

No.	路線名	距離標	カメラ名称	車線	設置目的	設置年度
1	58	2.03	奥No.1	下り	法面監視	平成15年度
2	〃	2.13	奥No.2	下り	法面監視	平成15年度
3	〃	2.24	奥No.3	下り	法面監視	平成15年度
4～12	〃	9.90～10.80	宜名真トンネルNo.1～No.9		トンネル監視	平成26年度
13	〃	12.47	ウテンダトンネル北口	下り	法面監視	平成17年度
14	〃	12.67	ウテンダトンネル坑内	下り	トンネル監視	平成17年度
15	〃	12.98	ウテンダトンネル南口	上り	法面監視	平成17年度
16	〃	13.20	宇嘉トンネル北口	上り	トンネル監視	平成24年度
17～20	〃		宇嘉トンネルNo.1～No.4	下り	トンネル監視	平成23年度
21	〃		宇嘉トンネル南口	上り	トンネル監視	平成24年度
22	〃	14.80	宇嘉No.1	上り	法面監視	平成14年度
23	〃	15.30	宇嘉No.2	上り	越波監視	平成29年度
24	〃	16.80	宇嘉No.3	上り	越波監視	平成26年度
25	〃	17.95	辺野喜	上り	越波監視	平成29年度
26	〃	22.70	新与那トンネル北口	下り	トンネル監視	平成26年度
27～29	〃	23.07～23.29	新与那トンネルNo.1～No.3	下り	トンネル監視	平成17年度
30	〃	23.60	新与那トンネル南口	上り	トンネル監視	平成26年度
31	〃	36.34	根路銘	下り	越波監視	令和元年度
32	〃	41.50	津波	下り	越波監視	平成29年度
33	〃	48.00	真喜屋	下り	冠水監視	平成28年度
34	〃		大北高架橋	下り	トンネル監視	平成22年度
35～52	〃		名護大北トンネルNo.1～No.14 非常駐車帯4台		トンネル監視	平成22年度
53	〃		幸地川橋	下り	トンネル監視	平成22年度
54～63	〃		幸地又トンネルNo.1～No.8 非常駐車帯2台		トンネル監視	平成23年度
64	〃		世冨慶IC	下り	トンネル監視	平成23年度
65	〃	60.30	世冨慶	下り	津波監視	平成24年度
66	〃	64.10	許田(北)	上り	法面監視	平成29年度
67	〃	64.25	許田(南)	上り	法面監視	平成29年度
68	〃	65.30	許田(湖辺底)	下り	越波監視	平成28年度
69	〃	68.67	喜瀬	下り	冠水監視	平成27年度
70	〃	73.75	安富祖	下り	冠水監視	平成27年度
71	〃		恩納バイパスNo.1	上り	法面監視	平成22年度
72	〃		恩納バイパスNo.2	下り	法面監視	平成22年度
73	〃		恩納バイパスNo.3	下り	法面監視	平成22年度
74	〃		恩納南バイパスNo.1	上り	法面監視	平成21年度
75	〃		恩納南バイパスNo.2	下り	法面監視	平成21年度
76	〃		恩納南バイパスNo.3	上り	法面監視	平成21年度
77	〃	89.65	仲泊大橋	下り	橋梁監視	平成29年度
78	〃	91.11	山田	下り	冠水監視	平成27年度
79	329	17.35	松田	上り	冠水監視	平成28年度
80	〃	27.90	金武IC	下り	津波監視	平成24年度
81	〃	33.20	屋嘉	上り	越波監視	平成27年度
82	〃	38.00	石川	下り	トンネル監視	平成28年度

■橋梁現況（橋長20m以上）

（令和3年4月現在）

No.	路線名	橋梁名	橋長（m）	幅員構成 道路部	車道部	歩道部	上部構造形式	架設年次	場所
1	58	桑又橋	23.3	10.5	6.7	2.5	PCプレテンT桁	昭和54年	国頭村
2	〃	チヌフク橋	42.6	10.5	6.8	2.5	PCプレテンT桁	昭和54年	〃
3	〃	ナンガー橋	42.6	10.4	6.6	2.5	PCプレテンT桁	昭和54年	〃
4	〃	兼久橋	71.2	10.0	6.0	2.5	PCポステンT桁	昭和57年	〃
5	〃	宜名真橋	24.0	9.8	6.5	2.0	PCプレテン中空床版	平成16年	〃
6	〃	座津武橋	21.0	10.0	6.5	2.5	PCプレテン中空床版	平成25年	〃
7	〃	宇嘉橋	24.5	13.0	6.5	5.0	PCプレテン中空床版	平成23年	〃
8	〃	辺野喜橋	39.0	8.0	6.6	－	RCT桁	昭和48年	〃
9	〃	佐手橋	55.0	12.5	6.5	5.0	PCプレテン中空床版	平成23年	〃
10	〃	前川橋	23.5	13.0	6.5	5.0	PCプレテン中空床版	平成24年	〃
11	〃	与那橋	47.0	12.0	6.5	4.0	PCポステンT桁	平成6年	〃
12	〃	伊地橋	28.0	18.3	7.6	9.2	PCポステンT桁	平成15年	〃
13	〃	宇良橋	33.5	17.0	6.5	9.0	PCプレテン中空床版	平成14年	〃
14	〃	比地橋	54.2	15.9	6.5	6.8	PCポステンT桁	昭和63年	〃
15	〃	大国橋	56.8	12.0	6.5	4.0	PCポステンT桁	昭和62年	国頭村・大宜味村
16	〃	喜如嘉橋	37.6	12.0	6.5	4.0	PCプレテン中空床版	平成4年	大宜味村
17	〃	饒波橋	27.1	12.0	6.5	4.0	PCポステンT桁	昭和60年	〃
18	〃	塩屋大橋	360.0	13.5	6.5	6.0	PCポステンT桁	平成10年	〃
19	〃	宮城橋	100.0	12.5	6.5	5.0	PCポステンT桁	平成5年	〃
20	〃	平南橋	264.0	10.5	6.5	2.5	PCプレテンT桁	昭和56年	〃
21	〃	源河橋	72.0	11.0	6.5	2.5	PCポステンT桁	昭和63年	名護市
22	〃	真喜屋2号橋	28.3	16.0	7.0	6.0	PCポステンT桁	平成3年	〃
23	〃	真喜屋3号橋	24.2	16.0	7.0	6.0	PCポステンT桁	平成3年	〃
24	〃	羽地大橋	352.5	13.5	7.0	5.0	鋼箱桁+PCポステン箱桁	平成3年	〃
25	〃	柳橋（上り）	64.0	12.0	7.0	3.0	PCポステンT桁	昭和62年	〃
26	〃	柳橋（下り）	67.2	12.0	7.0	3.0	PCポステンT桁	昭和58年	〃
27	〃	宇座橋(上り)	39.6	14.0	7.0	5.0	PCプレテンT桁	昭和63年	〃
28	〃	宇座橋(下り)	39.6	14.0	7.0	5.0	PCプレテンT桁	昭和60年	〃
29	〃	新浦和橋	21.6	25.0	13.4	8.6	PCプレテンT桁	昭和50年	〃
30	〃	新世冨慶橋	22.7	22.8	17.7	3.7	PCポステンT桁	昭和50年	〃
31	〃	新数久田橋	23.6	24.0	14.6	8.0	PCポステンT桁	昭和50年	〃
32	〃	許田新橋(上り)	26.8	10.3	3.7	3.1	RC中実床版	昭和50年	〃
33	〃	許田新橋(下り)	26.8	7.2	3.9	－	RC中実床版	昭和50年	〃
34	〃	喜瀬橋	90.0	11.5	6.5	2.0	PCポステンT桁	昭和57年	〃
35	〃	名嘉真橋	21.6	18.5	6.6	9.5	PCプレテンT桁	昭和52年	恩納村
36	〃	安富祖橋	30.8	10.5	6.5	1.5	PCプレテンT桁	昭和54年	〃
37	〃	恩納橋	24.8	18.0	9.5	7.5	PCプレテン中空床版	平成15年	〃
38	〃	仲泊大橋(上り)	335.0	10.8	6.9	2.8	鋼溶接橋I桁(合成)	昭和50年	〃
39	〃	仲泊大橋(下り)	244.0	10.8	7.0	2.8	鋼溶接橋I桁(非合成)	平成7年	〃
40	〃	弥生橋	60.0	9.1	3.4	2.5	鋼溶接橋I桁(合成)	昭和50年	〃
41	〃	ツマサ橋	228.0	9.0	3.4	2.0	鋼溶接橋箱桁(合成)	昭和50年	〃
42	〃	東寺川橋(上り)	80.0	10.7	7.0	2.2	鋼溶接橋I桁(合成)	昭和50年	〃
43	〃	東寺川橋(下り)	70.0	10.8	7.0	2.8	鋼溶接橋I桁(合成)	昭和50年	〃
44	〃	山田大橋(上り)	151.0	10.8	7.0	2.7	鋼溶接橋 トラス橋	昭和50年	〃
45	〃	山田大橋(下り)	120.0	10.7	7.0	2.6	鋼溶接橋 トラス橋	昭和50年	〃
46	58（名護東道路）	大北高架橋	390.0	9.5	7.0	－	PCポステン箱桁	平成19年	名護市
47	〃	幸地川橋	88.0	9.6	7.0	－	PCポステン中空床版	平成19年	〃
48	58（恩納バイパス）	古島橋	95.0	12.3	7.8	3.5	PCポステンT桁	平成19年	恩納村
49	〃	ウッタ橋	81.0	10.5	7.0	3.5	PCポステンT桁	平成20年	〃
50	〃	太田橋	147.0	10.5	7.0	2.5	PCポステンT桁	平成14年	〃
51	〃	アンデンダ橋	275.0	10.5	7.0	2.5	鋼溶接橋I桁(非合成)	平成12年	〃
52	〃	クンズイ橋	428.0	10.5	7.0	2.5	PCプレテンT桁	平成11年	〃
53	〃	シルジ橋	68.0	10.5	7.0	2.5	PCプレテンT桁	平成13年	〃
54	〃	屋嘉田橋(上り)	61.5	10.5	7.0	2.5	PCプレテンT桁	平成16年	〃
55	〃	屋嘉田橋(下り)	61.5	10.5	7.0	2.5	PCプレテンT桁	平成27年	〃
56	〃	赤橋	38.2	14.5	9.5	4.0	PCプレテンT桁	平成16年	〃
57	58（恩納南バイパス）	谷茶福地橋	63.5	10.5	7.0	2.5	PCプレテン中空床版	平成29年	〃
58	〃	谷茶大袋原橋	31.0	10.5	7.0	2.5	PC桁橋	平成20年	〃
59	〃	垣根門橋	40.0	10.5	7.0	2.5	PC桁橋	平成20年	〃
60	〃	幸地橋	364.0	11.5	7.0	3.5	PC桁橋	平成20年	〃
61	〃	安幸地橋(上り)	148.0	10.5	7.0	2.5	PCポステンT桁	平成13年	〃
62	〃	安幸地橋(下り)	145.0	10.5	7.0	2.5	PCポステンT桁	平成29年	〃
63	329	長堂橋	900.0	10.5	6.5	2.5	鋼溶接橋 トラス橋	平成4年	名護市
64	〃	大蘭橋	43.0	12.0	8.0	2.5	鋼溶接橋I桁(非合成)	平成4年	〃
65	〃	大筋橋	64.0	12.0	8.0	2.5	鋼溶接橋I桁(非合成)	平成4年	〃
66	〃	辺野古大橋	225.0	12.5	6.5	5.0	PCポステンT桁	平成7年	〃
67	〃	宜野座大橋	182.0	12.5	6.5	5.0	PCプレテンT桁	昭和61年	宜野座村
68	〃	宜野座橋	68.0	17.0	6.5	7.0	PCポステンT桁	平成19年	〃
69	〃	宜野座2号橋	47.0	17.0	6.5	7.0	鋼溶接橋I桁(合成)	平成18年	〃
70	〃	新漢那橋	39.7	15.0	6.5	5.0	PCプレテンT桁	昭和62年	〃
71	〃	金武大橋	306.0	12.5	6.5	5.0	PCポステンT桁	昭和55年	金武町
72	〃	屋嘉橋	21.8	17.0	6.5	5.0	PCプレテン中空床版	昭和52年	〃
73	〃	石川高架橋(上り)	597.5	11.5	7.0	3.5	鋼溶接橋箱桁(非合成)	平成15年	うるま市
74	〃	石川高架橋(下り)	597.5	11.5	7.0	3.5	鋼溶接橋箱桁(非合成)	平成4年	〃
75	〃	天願川橋(上り)	26.8	13.1	7.0	5.0	PCポステンT桁	平成15年	〃
76	〃	天願川橋(下り)	27.0	13.1	7.0	5.0	PCポステンT桁	平成15年	〃
77	329（金武バイパス）	金武BP1号橋	255.0	10.0	6.5	2.5	PCプレテン床版・鋼単純ローゼ橋	平成30年	金武町
78	〃	金武BP2号橋	431.0	10.0	6.5	2.5	PCポステンT桁	平成30年	〃
79	〃	金武BP3号橋	42.0	18.0	6.4	8.0	PCプレテンT桁	平成11年	〃

■横断歩道橋現況

（令和3年4月現在）

No.	路線名	橋名	橋長（m）	昇降路形式	上部構造形式	架設年次	場所
1	58	大宮歩道橋	39.0	スロープ式	鋼桁橋	平成3年	名護市
2	〃	港歩道橋	29.6	スロープ式	鋼桁橋	昭和50年	名護市
3	〃	城歩道橋	29.6	スロープ式	鋼桁橋	昭和50年	名護市
4	〃	東江歩道橋	29.6	スロープ式	鋼桁橋	昭和49年	名護市
5	〃	世冨慶歩道橋	24.8	押上式	鋼桁橋	昭和50年	名護市
6	〃	数久田横断歩道橋	28.2	押上式	鋼桁橋	平成17年	名護市
7	〃	南恩納横断歩道橋	20.9	階段式	鋼桁橋	平成20年	恩納村
8	329	赤崎横断歩道橋	131.9	スロープ式	鋼箱桁	平成7年	うるま市

■トンネル現況

（令和3年4月現在）

No.	路線名	トンネル名	箇所名	延長（m）	道路幅員（m）	建設限界高（m）	竣工年次	トンネル等級	備考
1	58	宜名真トンネル	国頭村	1,045.0	6.0	4.50	昭和56年	B	
2	〃	ウテンダトンネル	国頭村	322.0	6.5	4.70	平成元年	D	
3	〃	宇嘉トンネル	国頭村	584.0	6.5	4.50	平成25年	C	
4	〃	新与那トンネル	国頭村	559.0	6.5	4.70	平成7年	C	
5	〃	辺土名トンネル	国頭村	175.0	6.5	4.50	昭和61年	D	
6	〃	名護大北トンネル	名護市	1,976.0	7.0	4.70	平成19年	A	
7	〃	幸地又トンネル	名護市	1,170.0	7.0	4.70	平成22年	A	
8	329	石川トンネル(下り)	うるま市	165.0	7.0	4.70	平成6年	C	
9	〃	石川トンネル(上り)	うるま市	165.0	7.0	4.70	平成6年	C	

㈱近代美術
沖縄県南風原町字兼城二〇六
TEL〇九八八八九十四一二三

この地図は著作権で保護されています。内容、テキスト、画像等全ての無断転載・無断使用を固く禁じます。
「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 3JHf 34」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」国土地理院出典

北部国道事務所
