北部国道事務所管内図

1:110,000

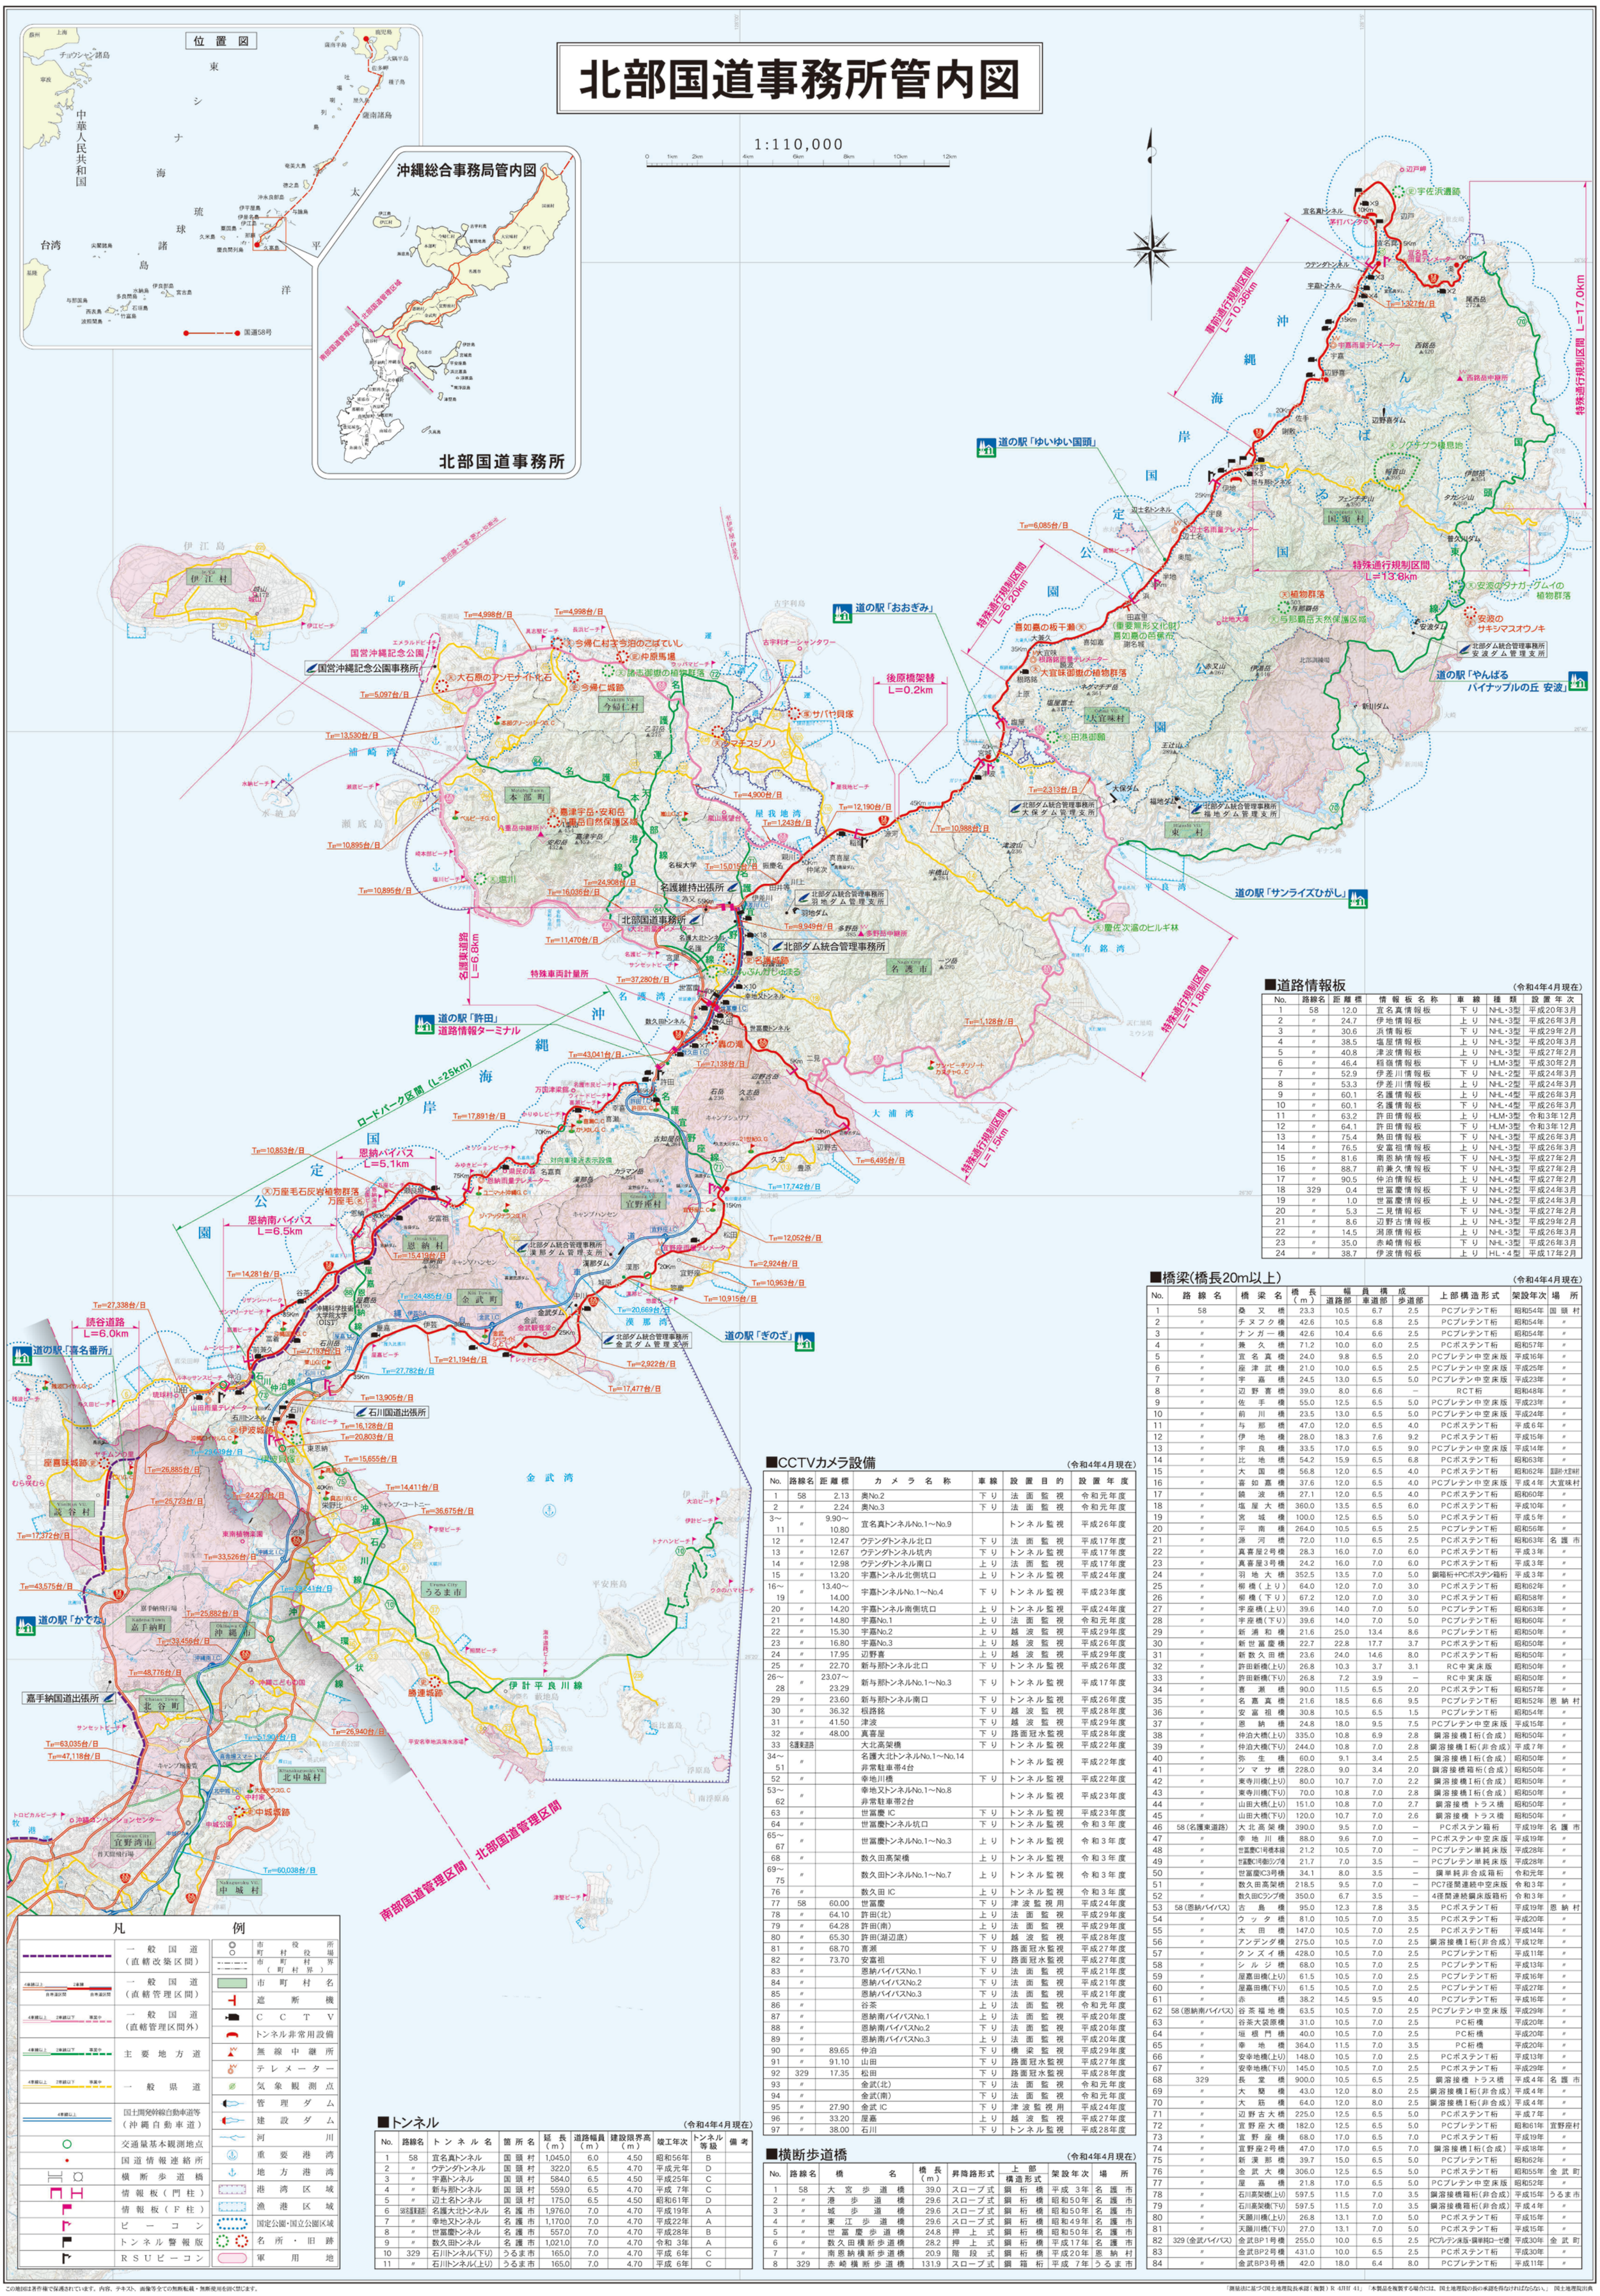

凡例

一般国道（直轄改築区間）	市役所・町村役場
一般国道（直轄管理区間）	市町村界（町村界）
一般国道（直轄管理区間外）	市町村名
主要地方道	遮断機
一般県道	CCTV
国土開発幹線自動車道等（沖縄自動車道）	トンネル非常用設備
交通量基本観測地点	無線中継所
国道情報連絡所	テレメーター
横断歩道橋	気象観測点
情報板（門柱）	管理ダム
情報板（F柱）	建設ダム
ビーコン	河川
トンネル警報版	重要港湾
RSUビーコン	地方港湾
	港湾区域
	漁港区域
	国定公園・国立公園区域
	名所・旧跡
	軍用地

■道路情報板

（令和4年4月現在）

No.	路線名	距離標	情報板名称	車線	種類	設置年次
1	58	12.0	宜名真情報板	下り	NHL・3型	平成20年3月
2	〃	24.7	伊地情報板	上り	NHL・3型	平成26年3月
3	〃	30.6	浜情報板	下り	NHL・3型	平成29年2月
4	〃	38.5	塩屋情報板	上り	NHL・3型	平成20年3月
5	〃	40.8	津波情報板	上り	NHL・3型	平成27年2月
6	〃	46.4	稲嶺情報板	下り	HLM・3型	平成30年2月
7	〃	52.9	伊差川情報板	下り	NHL・2型	平成24年3月
8	〃	53.3	伊差川情報板	上り	NHL・2型	平成24年3月
9	〃	60.1	名護情報板	上り	NHL・4型	平成26年3月
10	〃	60.1	名護情報板	下り	NHL・4型	平成26年3月
11	〃	63.2	許田情報板	上り	HLM・3型	令和3年12月
12	〃	64.1	許田情報板	下り	HLM・3型	令和3年12月
13	〃	75.4	熟田情報板	下り	NHL・3型	平成26年3月
14	〃	76.5	安富祖情報板	上り	NHL・3型	平成26年3月
15	〃	81.6	南恩納情報板	下り	NHL・3型	平成27年2月
16	〃	88.7	前兼久情報板	下り	NHL・3型	平成27年2月
17	〃	90.5	仲泊情報板	上り	NHL・4型	平成27年2月
18	329	0.4	世富慶情報板	下り	NHL・2型	平成24年3月
19	〃	1.0	世富慶情報板	上り	NHL・2型	平成24年3月
20	〃	5.3	二見情報板	下り	NHL・3型	平成27年2月
21	〃	8.6	辺野古情報板	上り	NHL・3型	平成29年2月
22	〃	14.5	潟原情報板	上り	NHL・3型	平成26年3月
23	〃	35.0	赤崎情報板	下り	NHL・3型	平成26年3月
24	〃	38.7	伊波情報板	上り	HL・4型	平成17年2月

■橋梁（橋長20m以上）

（令和4年4月現在）

No.	路線名	橋梁名	橋長（m）	幅員構成 道路部	幅員構成 車道部	幅員構成 歩道部	上部構造形式	架設年次	場所
1	58	桑又橋	23.3	10.5	6.7	2.5	PCプレテンT桁	昭和54年	国頭村
2	〃	チヌフク橋	42.6	10.5	6.8	2.5	PCプレテンT桁	昭和54年	〃
3	〃	ナンガー橋	42.6	10.4	6.6	2.5	PCプレテンT桁	昭和54年	〃
4	〃	兼久橋	71.2	10.0	6.0	2.5	PCポステンT桁	昭和57年	〃
5	〃	宜名真橋	24.0	9.8	6.5	2.0	PCプレテン中空床版	平成16年	〃
6	〃	座津武橋	21.0	10.0	6.5	2.5	PCプレテン中空床版	平成25年	〃
7	〃	宇嘉橋	24.5	13.0	6.5	5.0	PCプレテン中空床版	平成23年	〃
8	〃	辺野喜橋	39.0	8.0	6.6	－	RCT桁	昭和48年	〃
9	〃	佐手橋	55.0	12.5	6.5	5.0	PCプレテン中空床版	平成23年	〃
10	〃	前川橋	23.5	13.0	6.5	5.0	PCプレテン中空床版	平成24年	〃
11	〃	与那橋	47.0	12.0	6.5	4.0	PCポステンT桁	平成6年	〃
12	〃	伊地橋	28.0	18.3	7.6	9.2	PCポステンT桁	平成15年	〃
13	〃	宇良橋	33.5	17.0	6.5	9.0	PCプレテン中空床版	平成14年	〃
14	〃	比地橋	54.2	15.9	6.5	6.8	PCポステンT桁	昭和63年	〃
15	〃	大国橋	56.8	12.0	6.5	4.0	PCポステンT桁	昭和62年	国頭村・大宜味村
16	〃	喜如嘉橋	37.6	12.0	6.5	4.0	PCプレテン中空床版	平成4年	大宜味村
17	〃	饒波橋	27.1	12.0	6.5	4.0	PCポステンT桁	昭和60年	〃
18	〃	塩屋大橋	360.0	13.5	6.5	6.0	PCポステンT桁	平成10年	〃
19	〃	宮城橋	100.0	12.5	6.5	5.0	PCポステンT桁	平成5年	〃
20	〃	平南橋	264.0	10.5	6.5	2.5	PCプレテンT桁	昭和56年	〃
21	〃	源河橋	72.0	11.0	6.5	2.5	PCポステンT桁	昭和63年	名護市
22	〃	真喜屋2号橋	28.3	16.0	7.0	6.0	PCポステンT桁	平成3年	〃
23	〃	真喜屋3号橋	24.2	16.0	7.0	6.0	PCポステンT桁	平成3年	〃
24	〃	羽地大橋	352.5	13.5	7.0	5.0	鋼箱桁+PCポステン箱桁	平成3年	〃
25	〃	柳橋（上り）	64.0	12.0	7.0	3.0	PCポステンT桁	昭和62年	〃
26	〃	柳橋（下り）	67.2	12.0	7.0	3.0	PCポステンT桁	昭和58年	〃
27	〃	宇座橋（上り）	39.6	14.0	7.0	5.0	PCプレテンT桁	昭和63年	〃
28	〃	宇座橋（下り）	39.6	14.0	7.0	5.0	PCプレテンT桁	昭和60年	〃
29	〃	新浦和橋	21.6	25.0	13.4	8.6	PCプレテンT桁	昭和50年	〃
30	〃	新世富慶橋	22.7	22.8	17.7	3.7	PCポステンT桁	昭和50年	〃
31	〃	新数久田橋	23.6	24.0	14.6	8.0	PCポステンT桁	昭和50年	〃
32	〃	許田新橋（上り）	26.8	10.3	3.7	3.1	RC中実床版	昭和50年	〃
33	〃	許田新橋（下り）	26.8	7.2	3.9	－	RC中実床版	昭和50年	〃
34	〃	喜瀬橋	90.0	11.5	6.5	2.0	PCポステンT桁	昭和57年	〃
35	〃	名嘉真橋	21.6	18.5	6.6	9.5	PCプレテンT桁	昭和52年	恩納村
36	〃	安富祖橋	30.8	10.5	6.5	1.5	PCプレテンT桁	昭和54年	〃
37	〃	恩納橋	24.8	18.0	9.5	7.5	PCプレテン中空床版	平成15年	〃
38	〃	仲泊大橋（上り）	335.0	10.8	6.9	2.8	鋼溶接橋Ⅰ桁（合成）	昭和50年	〃
39	〃	仲泊大橋（下り）	244.0	10.8	7.0	2.8	鋼溶接橋Ⅰ桁（非合成）	平成7年	〃
40	〃	弥生橋	60.0	9.1	3.4	2.5	鋼溶接橋Ⅰ桁（合成）	昭和50年	〃
41	〃	ツマサ橋	228.0	9.0	3.4	2.0	鋼溶接橋箱桁（合成）	昭和50年	〃
42	〃	東寺川橋（上り）	80.0	10.7	7.0	2.2	鋼溶接橋Ⅰ桁（合成）	昭和50年	〃
43	〃	東寺川橋（下り）	70.0	10.8	7.0	2.8	鋼溶接橋Ⅰ桁（合成）	昭和50年	〃
44	〃	山田大橋（上り）	151.0	10.8	7.0	2.7	鋼溶接橋 トラス橋	昭和50年	〃
45	〃	山田大橋（下り）	120.0	10.7	7.0	2.6	鋼溶接橋 トラス橋	昭和50年	〃
46	58（名護東道路）	大北高架橋	390.0	9.5	7.0	－	PCポステン箱桁	平成19年	名護市
47	〃	幸地川橋	88.0	9.6	7.0	－	PCポステン中空床版	平成19年	〃
48	〃	世富慶IC1号橋本線	21.2	10.5	7.0	－	PCプレテン単純床版	平成28年	〃
49	〃	世富慶IC1号橋ランプ橋	21.7	7.0	3.5	－	PCプレテン単純床版	平成28年	〃
50	〃	世富慶IC3号橋	34.1	8.0	3.5	－	鋼単純非合成箱桁	令和元年	〃
51	〃	数久田高架橋	218.5	9.5	7.0	－	PC7径間連続中空床版	令和3年	〃
52	〃	数久田ICランプ橋	350.0	6.7	3.5	－	4径間連続鋼床版箱桁	令和3年	〃
53	58（恩納バイパス）	古島橋	95.0	12.3	7.8	3.5	PCポステンT桁	平成19年	恩納村
54	〃	ウッタ橋	81.0	10.5	7.0	3.5	PCポステンT桁	平成20年	〃
55	〃	太田橋	147.0	10.5	7.0	2.5	PCポステンT桁	平成14年	〃
56	〃	アンデンダ橋	275.0	10.5	7.0	2.5	鋼溶接橋Ⅰ桁（非合成）	平成12年	〃
57	〃	クンズイ橋	428.0	10.5	7.0	2.5	PCプレテンT桁	平成11年	〃
58	〃	シルジ橋	68.0	10.5	7.0	2.5	PCプレテンT桁	平成13年	〃
59	〃	屋嘉田橋（上り）	61.5	10.5	7.0	2.5	PCプレテンT桁	平成16年	〃
60	〃	屋嘉田橋（下り）	61.5	10.5	7.0	2.5	PCプレテンT桁	平成27年	〃
61	〃	赤橋	38.2	14.5	9.5	4.0	PCプレテン中空床版	平成16年	〃
62	58（恩納南バイパス）	谷茶福地橋	63.5	10.5	7.0	2.5	PCプレテン中空床版	平成29年	〃
63	〃	谷茶大袋原橋	31.0	10.5	7.0	2.5	PC桁橋	平成20年	〃
64	〃	垣根門橋	40.0	10.5	7.0	2.5	PC桁橋	平成20年	〃
65	〃	幸地橋	364.0	11.5	7.0	3.5	PC桁橋	平成20年	〃
66	〃	安幸地橋（上り）	148.0	10.5	7.0	2.5	PCポステンT桁	平成13年	〃
67	〃	安幸地橋（下り）	145.0	10.5	7.0	2.5	PCポステンT桁	平成29年	〃
68	329	長堂橋	900.0	10.5	6.5	2.5	鋼溶接橋 トラス橋	平成4年	名護市
69	〃	大簡橋	43.0	12.0	8.0	2.5	鋼溶接橋Ⅰ桁（非合成）	平成4年	〃
70	〃	大筋橋	64.0	12.0	8.0	2.5	鋼溶接橋Ⅰ桁（非合成）	平成4年	〃
71	〃	辺野古大橋	225.0	12.5	6.5	5.0	PCポステンT桁	平成7年	〃
72	〃	宜野座大橋	182.0	12.5	6.5	5.0	PCプレテンT桁	昭和61年	宜野座村
73	〃	宜野座橋	68.0	17.0	6.5	7.0	PCポステンT桁	平成19年	〃
74	〃	宜野座2号橋	47.0	17.0	6.5	7.0	鋼溶接橋Ⅰ桁（合成）	平成18年	〃
75	〃	新漢那橋	39.7	15.0	6.5	5.0	PCプレテンT桁	昭和62年	〃
76	〃	金武大橋	306.0	12.5	6.5	5.0	PCポステンT桁	昭和55年	金武町
77	〃	屋嘉橋	21.8	17.0	6.5	5.0	PCプレテン中空床版	昭和52年	〃
78	〃	石川高架橋（上り）	597.5	11.5	7.0	3.5	鋼溶接橋箱桁（非合成）	平成15年	うるま市
79	〃	石川高架橋（下り）	597.5	11.5	7.0	3.5	鋼溶接橋箱桁（非合成）	平成4年	〃
80	〃	天願川橋（上り）	26.8	13.1	7.0	5.0	PCポステンT桁	平成15年	〃
81	〃	天願川橋（下り）	27.0	13.1	7.0	5.0	PCポステンT桁	平成15年	〃
82	329（金武バイパス）	金武BP1号橋	255.0	10.0	6.5	2.5	PCプレテン床版・鋼単純ローゼ橋	平成30年	金武町
83	〃	金武BP2号橋	431.0	10.0	6.5	2.5	PCポステンT桁	平成30年	〃
84	〃	金武BP3号橋	42.0	18.0	6.4	8.0	PCプレテンT桁	平成11年	〃

■CCTVカメラ設備

（令和4年4月現在）

No.	路線名	距離標	カメラ名称	車線	設置目的	設置年度
1	58	2.13	奥No.2	下り	法面監視	令和元年度
2	〃	2.24	奥No.3	下り	法面監視	令和元年度
3～11	〃	9.90～10.80	宜名真トンネルNo.1～No.9		トンネル監視	平成26年度
12	〃	12.47	ウテンダトンネル北口	下り	法面監視	平成17年度
13	〃	12.67	ウテンダトンネル坑内	下り	トンネル監視	平成17年度
14	〃	12.98	ウテンダトンネル南口	上り	法面監視	平成17年度
15	〃	13.20	宇嘉トンネル北側坑口	上り	トンネル監視	平成24年度
16～19	〃	13.40～14.00	宇嘉トンネルNo.1～No.4	下り	トンネル監視	平成23年度
20	〃	14.20	宇嘉トンネル南側坑口	上り	トンネル監視	平成24年度
21	〃	14.80	宇嘉No.1	上り	法面監視	令和元年度
22	〃	15.30	宇嘉No.2	上り	越波監視	平成29年度
23	〃	16.80	宇嘉No.3	上り	越波監視	平成26年度
24	〃	17.95	辺野喜	上り	越波監視	平成29年度
25	〃	22.70	新与那トンネル北口	下り	トンネル監視	平成26年度
26～28	〃	23.07～23.29	新与那トンネルNo.1～No.3	下り	トンネル監視	平成17年度
29	〃	23.60	新与那トンネル南口	下り	トンネル監視	平成26年度
30	〃	36.32	根路銘	下り	越波監視	平成28年度
31	〃	41.50	津波	下り	越波監視	平成29年度
32	〃	48.00	真喜屋	下り	路面冠水監視	平成28年度
33	名護東道路		大北高架橋	下り	トンネル監視	平成22年度
34～51	〃		名護大北トンネルNo.1～No.14 非常駐車帯4台		トンネル監視	平成22年度
52	〃		幸地川橋	下り	トンネル監視	平成22年度
53～62	〃		幸地又トンネルNo.1～No.8 非常駐車帯2台		トンネル監視	平成23年度
63	〃		世富慶IC	下り	トンネル監視	平成23年度
64	〃		世富慶トンネル坑口	下り	トンネル監視	令和3年度
65～67	〃		世富慶トンネルNo.1～No.3	上り	トンネル監視	令和3年度
68	〃		数久田高架橋	上り	トンネル監視	令和3年度
69～75	〃		数久田トンネルNo.1～No.7	上り	トンネル監視	令和3年度
76	〃		数久田IC	上り	トンネル監視	令和3年度
77	58	60.00	世富慶	下り	津波監視用	平成24年度
78	〃	64.10	許田（北）	上り	法面監視	平成29年度
79	〃	64.28	許田（南）	上り	法面監視	平成29年度
80	〃	65.30	許田（湖辺底）	下り	越波監視	平成28年度
81	〃	68.70	喜瀬	下り	路面冠水監視	平成27年度
82	〃	73.70	安富祖	下り	路面冠水監視	平成27年度
83	〃		恩納バイパスNo.1	下り	法面監視	平成21年度
84	〃		恩納バイパスNo.2	下り	法面監視	平成21年度
85	〃		恩納バイパスNo.3	下り	法面監視	平成21年度
86	〃		谷茶	上り	法面監視	令和元年度
87	〃		恩納南バイパスNo.1	上り	法面監視	平成20年度
88	〃		恩納南バイパスNo.2	下り	法面監視	平成20年度
89	〃		恩納南バイパスNo.3	上り	法面監視	平成20年度
90	〃	89.65	仲泊	下り	橋梁監視	平成29年度
91	〃	91.10	山田	下り	路面冠水監視	平成27年度
92	329	17.35	松田	下り	路面冠水監視	平成28年度
93	〃		金武（北）	下り	法面監視	令和元年度
94	〃		金武（南）	下り	法面監視	令和元年度
95	〃	27.90	金武IC	下り	津波監視用	平成24年度
96	〃	33.20	屋嘉	上り	越波監視	平成27年度
97	〃	38.00	石川	下り	トンネル監視	平成28年度

■トンネル

（令和4年4月現在）

No.	路線名	トンネル名	箇所名	延長（m）	道路幅員（m）	建設限界高（m）	竣工年次	トンネル等級	備考
1	58	宜名真トンネル	国頭村	1,045.0	6.0	4.50	昭和56年	B	
2	〃	ウテンダトンネル	国頭村	322.0	6.5	4.70	平成元年	D	
3	〃	宇嘉トンネル	国頭村	584.0	6.5	4.50	平成25年	C	
4	〃	新与那トンネル	国頭村	559.0	6.5	4.70	平成7年	C	
5	〃	辺土名トンネル	国頭村	175.0	6.5	4.50	昭和61年	D	
6	58(名護東道路)	名護大北トンネル	名護市	1,976.0	7.0	4.70	平成19年	A	
7	〃	幸地又トンネル	名護市	1,170.0	7.0	4.70	平成22年	A	
8	〃	世富慶トンネル	名護市	557.0	7.0	4.70	平成28年	B	
9	〃	数久田トンネル	名護市	1,021.0	7.0	4.70	令和3年	A	
10	329	石川トンネル(下り)	うるま市	165.0	7.0	4.70	平成6年	C	
11	〃	石川トンネル(上り)	うるま市	165.0	7.0	4.70	平成6年	C	

■横断歩道橋

（令和4年4月現在）

No.	路線名	橋名	橋長（m）	昇降路形式	上部構造形式	架設年次	場所
1	58	大宮歩道橋	39.0	スロープ式	鋼桁橋	平成3年	名護市
2	〃	港歩道橋	29.6	スロープ式	鋼桁橋	昭和50年	名護市
3	〃	城歩道橋	29.6	スロープ式	鋼桁橋	昭和50年	名護市
4	〃	東江歩道橋	29.6	スロープ式	鋼桁橋	昭和49年	名護市
5	〃	世富慶歩道橋	24.8	押上式	鋼桁橋	昭和50年	名護市
6	〃	数久田横断歩道橋	28.2	押上式	鋼桁橋	平成17年	名護市
7	〃	南恩納横断歩道橋	20.9	階段式	鋼桁橋	平成20年	恩納村
8	329	赤崎横断歩道橋	131.9	スロープ式	鋼箱桁	平成7年	うるま市

令和4年5月印刷

北部国道事務所

この地図は著作権で保護されています。内容、テキスト、画像等全ての無断転載・無断使用を固く禁じます。

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 4JHf 41」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」 国土地理院出典

㈱近代美術 沖縄県南風原町字兼城一〇六 TEL〇九八八八八九一四一三
