中城湾港泡瀬地区環境監視調査

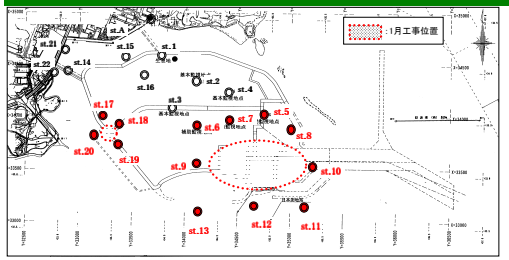

工事現場周辺監視地点調査結果

監視基準：St.5～St.7＝7mg/l
St.8～St.13及びSt.17～St.20＝11mg/l

※ 観測値は、定時観測（10時、15時）の1日2回、上層（水面より50cm）、中層（上下層の中間）、下層（底上20cm）の各値の平均値とした。
※ 天気・風向・風力は定時観測時における現地確認とした。
※ 降水量はアメダス(沖縄市胡屋)のデータを用い、12時間(0時～12時、12時～24時)の合計を示した。
※ 潮は調査時間帯における「上げ潮」、「下げ潮」の状況を示した。また、潮位は中城湾検潮所における定時観測値を使用した。
※ 表中の赤色で着色した値は基準値(St.5～St.7＝7mg/l, St.8～St.13及びSt.17～St.20＝11mg/l)を超えたことを示す。
※ 荒天もしくは干潮等により定時観測が出来ない場合は欠測とし、表中では「－」で示した。

ss(mg/l)観測結果および降水量(mm)
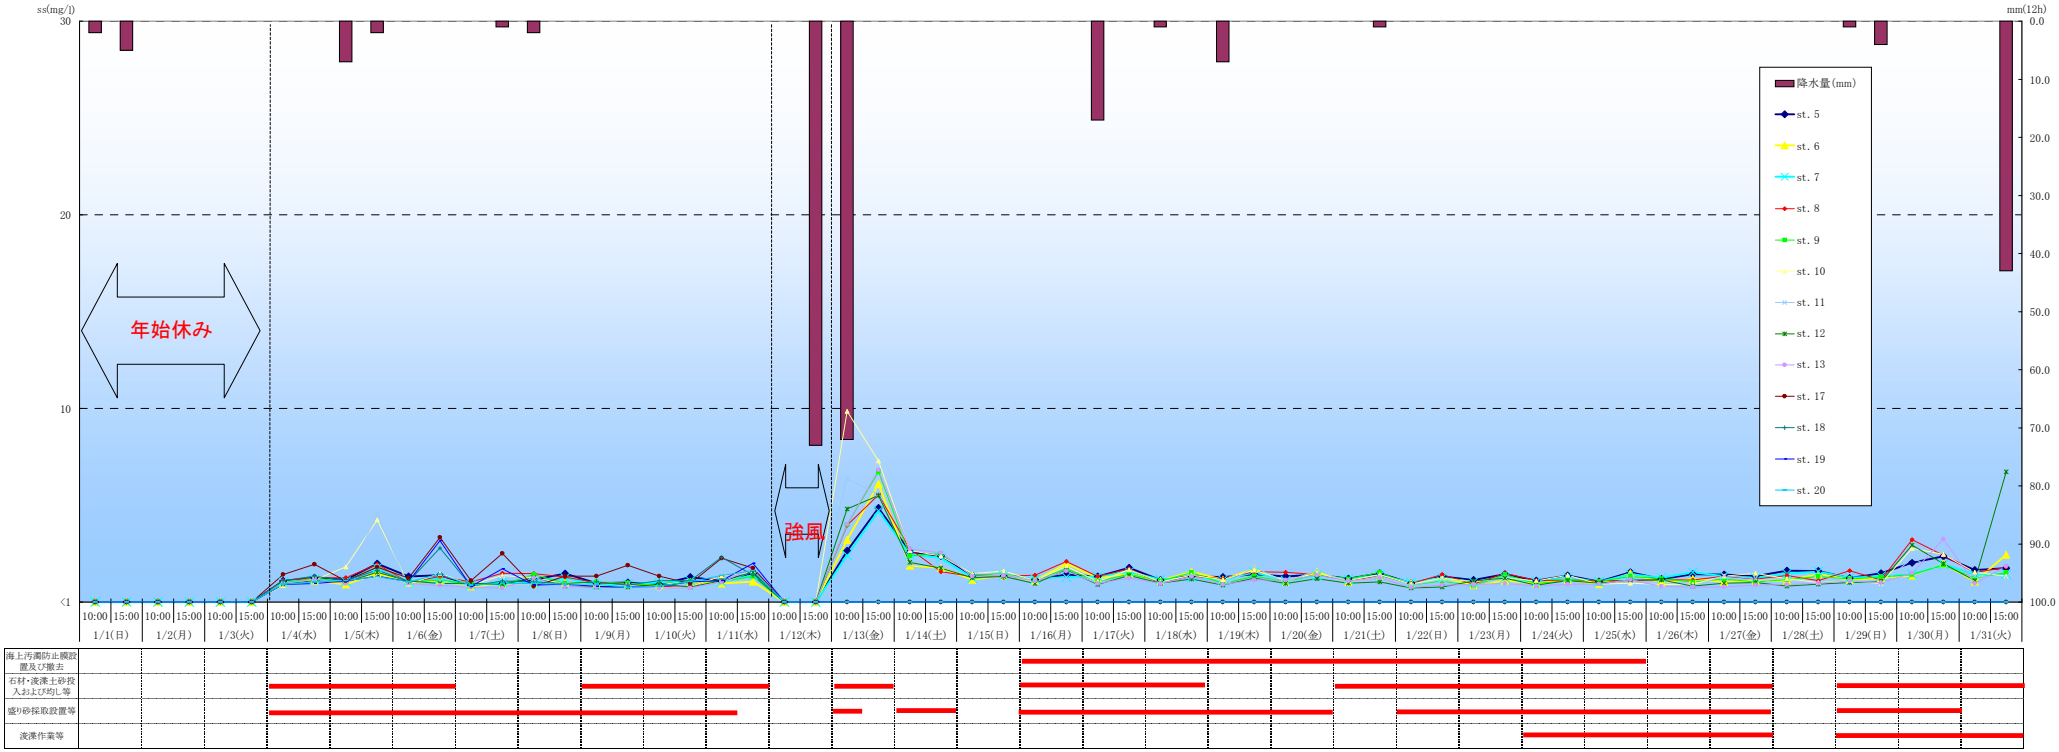
観測日	1/1(日)		1/2(月)		1/3(火)		1/4(水)		1/5(木)		1/6(金)		1/7(土)		1/8(日)		1/9(月)		1/10(火)		1/11(水)		1/12(木)		1/13(金)		1/14(土)		1/15(日)		1/16(月)		1/17(火)		1/18(水)		1/19(木)		1/20(金)		1/21(土)		1/22(日)		1/23(月)		1/24(火)		1/25(水)		1/26(木)		1/27(金)		1/28(土)		1/29(日)		1/30(月)		1/31(火)	
定時観測	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00	10:00	15:00
天気	－	－	－	－	－	－	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴時々曇	晴れ	晴時々曇	晴れ	晴時々曇	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴時々雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨
風向	－	－	－	－	－	－	SE～E	SE～SSE	N～NE	N～NNE	NW～N	ENE～NW	NW～N	N～NNW	NE～N	NE～NE	E～NNE	N～NE	NNE～NE	ENE～NNE	ENE～ESE	ESE～E	SE	SE	SE～SW	WSW～SW	NW～WNW	N～NW	SW～E	NE～N	ESE～SSE	SE～S	NE～ENE	ENE～NE	SE～SSE	S～SSW	S～SSE	SSE～SW	NW～SSW	W～WNW	NW～W	NNW～N	N～NW	NNE～N	N～NE	NE～N	NNE～NE	NNE～ENE	NE～ENE	E～NE	NNE～ENE	NE～ENE	N～NNE	N	NNE～E	NE～ESE	SE～ENE	ENE～SE	SE～SW	SE～ESE	SE～ENE	SE～S
風力	－	－	－	－	－	－	1～2	1～3	3～5	3～5	2～4	3～5	2～4	3～5	2～3	3～4	0.5～2	1～3	2～3	2～3	3～5	4～5	4	5	1～2	1～3	2～4	2～5	0～1	1～3	3～4	2～4	1～2	1～2	1～3	1～3	0～1	2～4	1～2	1～3	1～3	3～4	3	3	2～4	3～4	2～4	2～3	1～2	2～3	2～3	1～3	2～3	2～4	2～4	2～4	2～4	3～5	2～3	3	3～4
降水量(mm)	2.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.0	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	1.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	43.0
潮	－	－	－	－	－	－	満潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	満潮	干潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	下げ潮	干潮	下げ潮	下げ潮	満潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	干潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮	上げ潮	下げ潮
潮位	－	－	－	－	－	－	－	95	－	－	－	119	139	140	125	155	115	166	111	170	113	165	119	151	135	144	137	119	150	106	166	95	170	83	175	81	181	89	184	89	173	97	154	110	137	120	120	139	109	153	102	161	104	158	115	145	132	120	148	87	172	68
st. 5	－	－	－	－	－	－	1.1	1.3	1.2	2.0	1.3	1.4	<1	<1	1.2	1.5	<1	1.0	<1	1.3	1.1	1.5	－	－	2.6	4.9	2.6	2.4	1.4	1.3	1.2	1.4	1.3	1.8	1.1	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	1.2	1.5	<1	1.3	1.1	1.4	1.1	1.4	1.1	1.5	1.2	1.4	1.4	1.3	1.6	1.6	1.2	1.5	2.0	2.4	1.6	1.7
st. 6	－	－	－	－	－	－	<1	1.1	<1	1.5	1.0	1.1	<1	<1	<1	1.0	<1	<1	<1	1.0	<1	1.1	－	－	3.2	6.1	1.9	1.8	1.2	1.4	1.1	2.0	1.2	1.5	1.1	1.6	1.2	1.7	1.0	1.6	1.0	1.3	<1	1.3	<1	1.1	<1	1.2	<1	1.5	1.0	1.2	1.0	1.1	1.1	1.4	1.2	1.2	1.4	2.0	1.1	2.4
st. 7	－	－	－	－	－	－	1.0	1.2	1.1	1.8	1.1	1.2	<1	1.0	1.0	1.3	<1	<1	1.0	1.1	1.0	1.4	－	－	2.4	4.7	2.4	2.3	1.2	1.4	1.2	1.3	1.3	1.6	1.2	1.3	1.1	1.5	1.1	1.4	1.2	1.4	1.0	1.3	1.0	1.3	1.0	1.3	1.0	1.4	1.3	1.5	1.3	1.3	1.5	1.6	1.3	1.3	1.4	2.0	1.4	1.4
st. 8	－	－	－	－	－	－	1.1	1.3	1.3	2.0	1.0	1.3	1.0	1.5	1.5	1.3	1.0	<1	<1	<1	1.3	1.6	－	－	4.0	5.5	2.7	1.6	1.3	1.3	1.4	2.1	1.3	1.7	<1	1.3	1.2	1.6	1.5	1.4	1.1	1.3	<1	1.4	<1	1.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.3	1.2	1.4	1.1	1.6	1.1	3.2	2.4	1.5	1.8
st. 9	－	－	－	－	－	－	<1	1.2	1.0	1.9	1.0	1.1	<1	<1	1.4	<1	1.0	<1	<1	<1	1.1	1.3	強風により欠測		4.0	6.7	2.4	2.5	1.4	1.5	1.1	1.7	1.1	1.4	1.1	1.5	<1	1.3	1.1	1.4	1.2	1.5	<1	1.1	<1	1.4	<1	1.1	1.1	1.3	1.2	1.0	1.2	1.0	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4	1.9	1.2	1.5
st. 10	－	－	年始休み		－	－	<1	1.1	1.8	4.3	<1	1.5	<1	1.4	1.3	<1	<1	<1	<1	<1	1.3	1.6			9.8	7.3	2.7	2.4	1.5	1.6	1.1	1.9	1.1	1.7	1.0	1.4	1.2	1.6	1.1	1.5	1.1	1.4	<1	1.2	1.0	1.3	1.1	1.4	<1	<1	<1	<1	1.3	1.5	1.2	1.0	1.1	<1	2.8	2.5	1.5	1.3
st. 11	－	－	－	－	－	－	<1	1.1	1.1	4.6	<1	1.1	<1	1.3	1.2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1.6	－	－	6.4	5.6	1.9	1.9	1.3	1.4	1.1	1.3	<1	1.1	1.0	1.2	<1	1.8	1.0	1.6	1.0	1.3	<1	1.2	<1	1.3	<1	<1	<1	1.2	<1	<1	1.4	1.2	<1	<1	1.1	<1	2.3	1.5	1.3	1.3
st. 12	－	－	－	－	－	－	<1	1.1	1.0	1.5	1.1	<1	<1	<1	1.3	<1	<1	<1	<1	<1	1.1	1.5	－	－	4.8	5.5	2.1	1.7	1.3	1.3	<1	1.6	<1	1.4	<1	1.2	<1	1.2	<1	1.0	<1	<1	1.1	1.2	<1	1.1	1.1	1.2	<1	1.1	<1	<1	1.0	<1	<1	1.0	1.1	2.9	2.0	1.1	6.7
st. 13	－	－	－	－	－	－	<1	1.2	<1	1.9	<1	<1	<1	<1	1.2	<1	<1	<1	<1	<1	1.0	1.7	－	－	4.0	6.8	2.7	2.5	1.3	1.4	1.1	1.6	<1	1.2	<1	1.3	<1	1.1	1.1	1.4	1.1	1.2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1.2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1.1	1.0	1.5	3.3	<1	1.9
st. 17	－	－	－	－	－	－	1.4	2.0	1.1	1.8	1.2	3.3	1.1	2.5	<1	1.3	1.3	1.9	1.3	<1	2.3	1.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
st. 18	－	－	－	－	－	－	1.1	1.3	1.1	1.6	1.1	2.8	<1	1.1	1.0	<1	1.0	<1	1.1	1.1	2.3	1.4	St.17～20：本年度仮設橋梁工事完了に伴い監視調査を11日で終了																																																								
st. 19	－	－	－	－	－	－	<1	<1	1.1	1.3	1.1	3.2	<1	1.7	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1.0	1.1	2.0																																										
st. 20	－	－	－	－	－	－	<1	1.0	1.1	1.3	1.0	1.4	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1.1	1.4	1.6	－	－
