中城湾港泡瀬地区環境監視調査

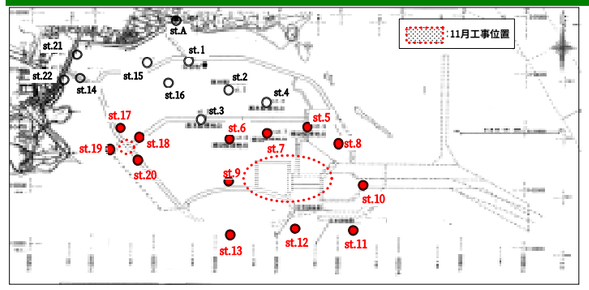

工事現場周辺監視地点調査結果

監視基準：St.5～St.7＝7mg/l
St.8～St.13及びSt.17～St.20＝11mg/l

※ 観測値は、定時観測（10時、15時）の1日2回、上層（水面より50cm）、中層（上下層の中間）、下層（底上20cm）の各値の平均値とした。
※ 天気・風向・風力は定時観測時における現地確認とした。
※ 降水量はアメダス（沖縄市胡屋）のデータを用い、12時間(0時～12時、12時～24時)の合計を示した。
※ 潮は調査時間帯における「上げ潮」、「下げ潮」の状況を示した。また、潮位は中城湾検潮所における定時観測値を使用した。
※ 表中の赤色で着色した値は基準値（St.5～St.7＝7mg/l、St.8～St.13及びSt.17～St.20＝11mg/l）を超えたことを示す。
※ 調査は小船による測定のため、荒天により小船が出船できない場合は「欠測」とする。St.17は仮設橋梁から測定を行っている。

ss（mg/l）観測結果および降水量(mm)

| 観測日 | 11/1(火) | | 11/2(水) | | 11/3(木) | | 11/4(金) | | 11/5(土) | | 11/6(日) | | 11/7(月) | | 11/8(火) | | 11/9(水) | | 11/10(木) | | 11/11(金) | | 11/12(土) | | 11/13(日) | | 11/14(月) | | 11/15(火) | | 11/16(水) | | 11/17(木) | | 11/18(金) | | 11/19(土) | | 11/20(日) | | 11/21(月) | | 11/22(火) | | 11/23(水) | | 11/24(木) | | 11/25(金) | | 11/26(土) | | 11/27(日) | | 11/28(月) | | 11/29(火) | | 11/30(水) | |
|---|---|---
